	F-GC-22 Versión 10 Junio 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA	

# CONTRATO Y AÑO	0251 DE 2020	Acta N°	1 PARCIAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	210.235.104
				2. VALOR ADICION	0
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL LA LAGUNA			3. VALOR TOTAL (1+2)	210.235.104
NIT O CC:	901.431.558-5			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00728 DEL 09/09/2020 00657 DEL 11/08/2020 00255 DEL 19/01/2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	109.794.755
RP (#, rubro y fecha)	000925 DEL 24/11/2020 000241 DEL 19/01/2021			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	100.440.349
OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICION DE ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA BARRIO LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS				
TIPO DE RECURSOS	CONVENIO 0200 MUNICIPIO DE SAMANA	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.		N/A	
3- Pagos al FIC		X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	
5- Informe de actividades o Bitácora.		X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.		X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X	
8- Ensayos de densidad.		N/A	
9- Diseño de Mezclas.		N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.		N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)		N/A	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51		N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)		N/A	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)		X	
15- Acta parcial o final del contrato.		X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Juan Camilo A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Jun. 09/02/27
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura original o Documento equivalente		X
Acta parcial o final del contrato.		X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		X
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ARLEX QUINTERO VASQUEZ	INGENIERO DE ZONA	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
7351018377	CORRIENTE	COLPATRIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



Pagos aportes en línea

www.aportesenlinea.com

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Descripción:	APORTE
Estado de la transacción:	EXITOSA
Código de transacción:	00000000000000000000
Valor:	218.000
Método de pago:	Transferencia
No. Transacción (CIB):	00000000000000000000
Fecha:	15/01/2021
Banco:	CAJA COSTARRICENSE DE CREDITO
Aportes a favor:	218000.000000

Aceptar

Imprimir

¿Quiénes somos?

Servicios que ofrecemos

¿Cómo liquido mis aportes?

¿Por qué elegimos?

Preguntas frecuentes

Contáctenos

Documentos y normas

Copyright © 2021 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
NIT 901431358	5	UNION TEMPORAL LA LAGUNA	A- 200 O MAS COTIZANTES	UNION TEMPORAL LA LAGUNA	Carrera 10 no 4 15	SAMAHA-CALDAS	7811100		No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2021-01	854466503	9415933160	E		2021/02/12	2021/02/05	0	\$2,474,000	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
CODIGO	NU	OV	VALORES	VALORIDAD	INTERES	MORA	SALDO	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6			\$892,200	\$0	\$892,200	\$9,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8			\$300,800	\$0	\$300,800	\$300,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0			\$581,600	\$0	\$581,600	\$581,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SUVA	14-11	890,903,790	5			\$388,900	\$0	\$388,900	\$388,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5			\$220,200	\$0	\$220,200	\$220,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)									
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7			\$696,900	\$0	\$696,900	\$696,900
EPS SUVA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2			\$325,700	\$0	\$325,700	\$3,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7			\$3,800	\$0	\$3,800	\$3,800
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2			\$363,600	\$0	\$363,600	\$363,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2			\$165,300	\$0	\$165,300	\$165,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)									
SENA	PASENA	899,999,034	1			\$110,500	\$0	\$110,500	\$110,500
TOTAL									
						\$2,474,000	\$0	\$2,474,000	\$2,474,000



Pagos aportes en línea

INSTITUTO VENEZOLANO DE SEGUROS SOCIALES

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Aprobación IP	05/02/2021
Estado de la transacción	Completada
Monto pagado	1.000,00
Fecha	05/02/2021
Nombre de la cuenta	00000000000000000000
Número de la cuenta	00000000000000000000
Fecha	05/02/2021
Clave	00000000000000000000
Aportes en línea	00000000000000000000

Aceptar

Imprimir

[¿Quiénes somos?](#)
 [¿Cómo liquidó mis aportes?](#)
 [Preguntas frecuentes](#)
 [Documentos y normas](#)

[Servicios que ofrecemos](#)
 [¿Por qué elegimos?](#)
 [Contáctenos](#)

Copyright © 2021 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados



NOMBRE O RAZON SOCIAL: SENA NIT 899999034
 CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - F C
 A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	901431558
Primer Nombre ó Razón Social	UNION TEMPORAL LA LAGUNA
Primer Apellido (si es Persona natural)	UNION TEMPORAL LA LAGUNA
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	5
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CARRERA 10 4-15
Ciudad de Domicilio	SAMANA
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3217804646
Correo electrónico	sumicorddas@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	35-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	02512020
Número Contrato de Obra	02512020
Nombre Obra	REPOSICION DE ALCANTARILLADO
Fecha Inicio Obra	03/12/2020
Fecha Terminación Obra	31/01/2021
Ciudad de Ejecución de la Obra	SAMANA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	DICIEMBRE
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$210,235,104.00
Costo Total Mano de Obra	\$210,235,104.00
Número de Trabajadores en el Periodo	8
Valor Intereses Moratorios	\$4,290.00
Aporte FIC	\$175,561.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$175,561.00
Total Pagado	\$179,851.00
Valor del Pago	\$179,851.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	68884669
Fecha de Creación	28/01/2021 04:43:50 p.m.
Banco	SCOTIABANK COLPATRIA
Número de Confirmación/CUS	874856872
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fue APROBADA en la Entidad Financiera.

Nuevo Proceso

Salida Segura



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 389999034
 CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
 A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	90143158
Primer Nombre ó Razón Social	UNION TEMPORAL LA LAGUNA
Primer Apellido (si es Persona natural)	UNION TEMPORAL LA LAGUNA
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	5
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CARRERA 10 4-15
Ciudad de Domicilio	SAMANA
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3217804646
Correo electrónico	sumicordsas@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-00000
Número Licencia de Obra	02512020
Número Contrato de Obra	02512020
Nombre Obra	REPOSICION DE ALCANTARILLADO
Fecha Inicio Obra	03/12/2020
Fecha Terminación Obra	31/01/2021
Ciudad de Ejecución de la Obra	SAMANA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2021
Mes Periodo a Pagar	ENERO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$210,235,104.00
Costo Total Mano de Obra	\$210,235,104.00
Número de Trabajadores en el Periodo	3
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$181,705.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$181,705.00
Total Pagado	\$181,705.00
Valor del Pago	\$181,705.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	68884952
Fecha de Creación	28/01/2021 04:55 57 p.m.
Banco	SCOTIABANK COLPATRIA
Número de Confirmación/CUS	874266989
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fue APROBADA en la Entidad Financiera.

Nueva Proceso

Salida Segura



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SEHA NIT 899999034
 CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
 A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	901431556
Primer Nombre ó Razón Social	UNION TEMPORAL LA LAGUNA
Primer Apellido (si es Persona natural)	UNION TEMPORAL LA LAGUNA
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	5
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CARRERA 10 4-15
Ciudad de Domicilio	SAMANA
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3217804646
Correo electrónico	sumicortias@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	30-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	02512020
Número Contrato de Obra	02512020
Nombre Obra	REPOSICION DE ALCANTARILLADO
Fecha Inicio Obra	03/12/2020
Fecha Terminación Obra	31/01/2021
Ciudad de Ejecución de la Obra	SAMANA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2021
Mes Periodo a Pagar	ENERO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$210,235,104.00
Costo Total Mano de Obra	\$210,235,104.00
Número de Trabajadores en el Periodo	6
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$136,279.00
Aporte SEHA	\$0.00
Valor del Pago	\$136,279.00
Total Pagado	\$136,279.00
Valor del Pago	\$136,279.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	59036231
Fecha de Creación	09/02/2021 06:25:49 a.m.
Banco	SCOTIABANK COLPATRIA
Número de Confirmación/CUS	807521580
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

Nuevo Proceso

Salida Segura

Montería, 29 de enero de 2021

Señores.
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


Cordial saludo,

KATERINE PEREZ NISPERUZA identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.067.858.029 actuando como representante legal de la UNIÓN TEMPORAL LA LAGUNA con NIT No. 901.431.558-5 solicito a ustedes efectuar pago del acta parcial No. 1 del contrato No. 0251 del 2020 a la cuenta bancaria de SUMICORD SAS con Nit No. 900.828.869-2 y cuenta corriente No. 7351018377 del banco Scotiabank Colpatria ya que es consorciado principal con un 95% de participación en la unión temporal.


En constancia, se firma en Montería, a los 29 días del mes de enero de 2021



SUMICORD SAS
NIT:900828869-2
Representación legal NAVORA PORFIRIA SOTO SÁNCHEZ
Integrante de la Unión Temporal



KATERINE PEREZ NISPERUZA
CC: 1.067.858.029
Integrante de la Unión Temporal



KATERINE PEREZ NISPERUZA
Cedula de ciudadanía N° 1.067.858.029
REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL LA LAGUNA.

Fecha: 15 de diciembre de 2020

Personal en obra:

Maestro de obra 1
Ayudantes 4

Actividades: Se inició la obra con la instalación de la mala informativa, el desmonte de un tramo en donde instalaron las tuberías.

Victor Herra O
Presidente de obra.

Fecha: 16 de diciembre de 2020

Personal en obra:

Oficiales 1
Ayudantes 4

Actividades: Se continúa con el desmonte y el moldeo de la estructura, con la bajada del techo, las hormas al girar y al bajar, también con la demolición de muros y columnas.

Victor Herra O
Presidente de obra

Fecha: 17 de diciembre de 2020

Personal en obra:

Oficiales 1
Ayudantes 4

Actividades: Se continúa con la demolición de la estructura existente, con el apoyo de las excavadoras y el uso de los muelles.

Victor Herra O
Presidente de obra.

Fecha: 18 de diciembre de 2020

Personal en obra:

Oficiales 1

Ayudantes 4

Actividades: Se continúa con la demolición y abramiento de la estructura existente. — . — . — . — . — . — .

Victor Herrero

Responsable de obra.

Fecha: 21 de diciembre de 2020

Personal en obra:

Oficiales 1

Ayudantes 4

Actividades: Se realizó el trazado de los tubos y se comienza a preparar el formo manual de zanje para el primer tubo, se traza el tubo de 51" de su ancho al trazo de la obra. Se instala el primer tubo

Victor Herrero

Responsable de obra

Fecha: 22 de diciembre de 2020

Personal en obra:

Oficiales 1

Ayudantes 4

Actividades: Se instala otro tubo de 51" paralelos al nominalmente en ejecución con movimiento de su estructura por presión de presión de gases de expansión. Se sellan el contacto de los tubos con presión. — . — . — .

Victor Herrero

Responsable de obra

Fecha: 23 de diciembre de 2020

Personal en obra

Oficiales 1
Ayudantes 6

Actividades: Se instaló el tercer tubo de 51" de diámetro
se atraca con granelo y se sellan los costados de los
tubos.

Fecha: 24 de diciembre de 2020

Personal en obra

Oficiales 1
Ayudantes 4

Actividades: Se reanuda a desmenu los tubos instalados
y a llenar los costados de los tubos ya que una
parte de ellos en la noche fueron todo lo llenos.

Victor Herra
Presidente de obra

Fecha: 28 de diciembre de 2020

Personal en obra

Oficiales 1
Ayudantes 4

Actividades: Se levanta los tres (3) tubos instalados
ya que los llamas desmenuaron el tungsteno y se rellena
de un material resistente.

Victor Herra
Presidente de obra

Fecha: 29 de diciembre 2020

Personal en obra

Oficiales 1
Ayudantes 4

Actividades: Se continúa con la instalación del tubo de 51" se retiran los costales de la tubería. — . — . — . — . — . — . — . — . — .

Victor Herrero
Presidente de obra.

Fecha: 30 de diciembre 2020

Personal en obra:

Oficiales 1
Ayudantes 4

Actividades: Se demuestró su forma existente y se instaló tubo de 51" se atraca con grapple. Se retiran los costales de los tubos. — . — . — . — . — . — . — . — . — .

Victor Herrero
Presidente de obra.

Fecha: 31 de diciembre de 2020

Personal en obra:

Oficiales 1
Ayudantes 4

Actividades: Se retiran costales de los tubos, con línea permanente del lado donde se va a instalar con el nuevo suministro del tubo. — . — . — . — . — . — . — . — . — .

Victor Herrero
Presidente de obra.

Fecha: 4 de enero de 2021

Personal en obra
Oficiales 1
Ayudantes 4

Del siguiente: Se continúa con la ejecución para la instalación de tubería, se encuentran pruebas de grandes dimensiones, la retroexcavadora luego retiradas, se continúa nivelando y rellenando los costados de las tuberías, se instala otro tubo de 51" con un repelente aunque en guardia.

Victor Horno O
Presidente de obra.

Fecha: 5 de enero de 2021

Personal en obra.
Oficiales 1
Ayudantes 4

Actualmente: Se continúa con la ejecución para la instalación de tubería de 51", pero más entretusmas con pruebas muy grandes que la retroexcavadora no puede mover, se comienza con la demolición de dichas pruebas, usando el método de cambio térmico en con sopletes calentamos la cosa y luego la aplomamos agua para enfriar el golpe y así quebrarlo. Se continúa con el llenado de los costados de las tuberías

Victor Horno
Presidente de obra

Fecha: 06 de enero de 2021

Personal en obra:

Oficiales 1
Ayudantes 4

Actividades: Se continuo con la excavacion de las rocas, se instala y se instala un tubo de 51" con su respectivo struque en granel. — — —

Victor Hugo O

Residente de obra

Fecha: 07 de enero de 2021

Personal en obra:

Oficiales 1
Ayudantes 4

Actividades: Se continuo con la excavacion de tubos de 51" se instala y se instala otro tubo de 51" se rellena con limo proveniente de la misma excavacion se continuo la excavacion, se eliminan columnas y rejas existentes. Se rellena excavaciones y limo proveniente de la misma excavacion — — —

Victor Hugo O

Residente de obra.

Fecha: 08 de enero de 2021

Personal en obra:

Oficiales 1
Ayudantes 4

Actividades: Se instala tubo de 51" pulgadas, se rellena con material proveniente de la misma excavacion. — — —

Victor Hugo O

Residente de obra.

Fecha: 09 de enero de 2021

Personal en obra:

Oficiales 2
Ayudantes 8

Actividades: Se continúa con la excavación, montaje de
estructura con grúa y instalación de tubería de 5" pulgadas.
Se retiran bases (castillos) de acero para montar
el efecto de la tubería con muros en ase muelle.

Vista Heró
Proyecto de obra

Fecha: 12 de enero de 2021

Personal en obra:

Oficiales 2
Ayudantes 8

Actividades: Se continúa con la instalación de
tubería, más excavación con unas cámaras existentes
tipo ya, la cual más todo el material se pasará a
demoler a retener estructuras estables, realizar las
formulitas en muelle para las cámaras.

Vista Heró
Proyecto de obra.

Fecha: 13 de mayo de 2021

Personal en obra:

Oficiales 1

Ayudantes 7

Actividades: Se continúa con la revisión y abastecimiento de tuberías existentes. Se abren todos cubiertos y letrados con plásticos. Se comienza a fijar alce para comenzar el inspeccionar.

Vista Hacia O

Residentes de obra

Oficiales 1

Ayudantes 7

Fecha: 14 de mayo de 2021

Actividades: Se instala tubería de 51" al terreno que da a la corner de la calle, se continúa con la fijación de alce y armado para los comensales de inspeccionar. Permanece el comensal existente en la calle.

Vista Hacia O

Residentes de obra

Fecha: 15 de mayo de 2021

Personal en obra:

Oficiales 1

Ayudantes 7

Actividades: Se enciende y funda comensal de 4,10 x 4,10 para permitir abanico la tubería existente de 36" de diámetro o 10". Se continúa con el armado del terreno y abastecimiento de comensales existentes.

Vista Hacia O

Residentes de obra

Fecha: 16 de enero de 2021

Personal en obra

Oficiales 4

Ayudantes 6

Actividades: Se donó el comercio existente en la calle,
se realizó el montaje del marco de la cámara nueva
en sitio de 1/2" a tubo 20 cm. Se firmó por el
dicho comercio en un comprobante de \$3000 P.S. — — —

Victor Herrero

Responsable de obra.

Fecha: 18 de enero de 2021

Personal en obra

Oficiales 1

Ayudantes 6

Actividades: Se formalizó pedido de comercio existente, y de
la cámara 3. Se firmó los pedidos de los comercios 1.
Se sellaron y mudó zonas con excavación repetidas. — — —

Victor Herrero

Responsable de obra.

Fecha: 19 de enero de 2021

Personal en obra

Oficiales 2

Ayudantes 6

Actividades: Se firmó y vino obra para comercio de
nuevo, se formalizó comercio finalizado, comercio 1.
Se realizó excavación para acueductos. — — —

Victor Herrero

Responsable de obra.

Fecha: 20 de enero de 2020

Personal en obra:

Oficiales 2

Ayudantes 6

Actividades: Se continúa con la formalización de la cámara 3, con figuración al alba, y colocación de 3 cajas de inspección. — — — — —

Victor Hino

Presidente de obra

Fecha: 21 de enero de 2021

Personal en obra:

Oficiales 2

Ayudantes 6

Actividades: Se finalizó paredes de la cámara de inspección 3, en concreto de 3000 PSI. Se funden cajas de inspección, se organizan albañilerías. — — — — —

Fecha: 22 de enero de 2021

Personal en obra:

Oficiales 2

Ayudantes 6

Actividades: Se firmó alba para Comarcas de inspección se organizan albañilerías. Se ceden y mudan tirantes. — — — — —

Presidente de obra.

Victor Hino

Fecha: 23 de enero de 2021

Nota: Se suspenden labores por mal tiempo de gran parte de la mañana. — — — — —

Victor Hino

Presidente de obra

Fecha: 25 de enero de 2021

Personal en obra:

Oficiales: 2

Ayudantes 6

Actividades: Se fijaron y como se vio para cámara 4, se realiza corte y demolición al tramo de pavimento para iniciar la excavación para instalar en tubo de 51". Se inicia dicho excavación, se cubren y muele tramo de pavimento. — . — . — . — . — . — . — . — . — .

Victor Hugo O

Responsable de obra

Fecha: 26 de enero de 2021

Personal en obra:

Oficiales 2

Ayudantes 6

Actividades: Se inicia material para ocuparlo cerca de la última cámara. Se funden pisos y concreto de la cámara 3, se funde el piso de la cámara 4. Se excava bacheo de 1,60 x 5m x 1.7 de para instalar cámara tubo de 51". Se inicia demolición de cámara existente. — . — . — . — . — . — . — . — . — .

Victor Hugo O

Responsable de obra









Fecha: 27 de enero de 2021

Nota: Se suspenden actividades por mal tiempo de lluvia. — . — . — . — . — . — . — . — . — .

Victor Hugo O

Responsable de obra

NOMINA, PAGO Nro 1
 FECHA DE PAGO: 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 CONTRATO DE OBRA: No 0251
 CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A E.S.P
 CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LA LAGUNA
 PERIODO DE PAGO: DEL 03 AL 31 DE DICIEMBRE

Nombres	C.C.	Cargo	Valor día	Vr/Extra	Dias trabajados	Extras	Total a pagar	Firma
Andrés Felipe Palacio García	1.002.865.568	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	14		\$ 490.000	
Mario Alexander Rodríguez	1.115.189.970	Oficial de obra	\$ 50.000	\$ 4.600	14		\$ 700.000	
Kristian Estiven Cediel García	1.233.910.908	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	14		\$ 490.000	
Jesús Hernán Bedoya Buitrago	16.112.408	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	14		\$ 490.000	
Alex Andrés Giacometto Vides	72.216.550	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	8		\$ 280.000	
Arbey Muñoz	16.113.826	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	1		\$ 35.000	
Maria Eugenia Castañeda Cifuentes	1.061.656.125	Profesional SISO	\$ 35.000	\$ 4.600	8		\$ 280.000	
Jorge Marín	1.072.745.351	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	1		\$ 35.000	
TOTAL A PAGAR PRESENTE NOMINA							\$ 2.800.000	

NOMINA, PAGO Nro 2

FECHA DE PAGO:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATANTE:

CONTRATISTA:

PERIODO DE PAGO:

31 DE ENERO DE 2021


Nº 0251

EMPOCALDAS S.A E.S.P

UNION TEMPORAL LA LAGUNA

DEL 01 AL 31 DE ENERO

Nombres	C.C.	Cargo	Valor día	Vr/Extra	Dias trabajados	Extras	Total a pagar	Firma
Andres Felipe Palacio Garcia	1.002.865.568	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	30		\$ 1.050.000	Andres Felipe Palacio Garcia
Mario Alexander Rodriguez	1.115.189.970	Oficial de obra	\$ 50.000	\$ 4.600	30		\$ 1.500.000	Mario Alexander Rodriguez
Kristian Estiven Cediel Garcia	1.233.910.908	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	30		\$ 1.050.000	Kristian Estiven Cediel Garcia
Jesus Hernan Bedoya Buitrago	16.112.408	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	1		\$ 35.000	Jesus Hernan Bedoya Buitrago
Carlos Arturo Gonzales Cardona	1.061.657.683	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	1		\$ 35.000	Carlos Arturo Gonzales Cardona
Victor Alfonso Arias Garcia	1.061.657.979	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	23		\$ 805.000	Victor Alfonso Arias Garcia
Islen Grajales Ortiz	1.002.954.830	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	30		\$ 1.050.000	Islen Grajales Ortiz
Martin de Jesus Obando Osorio	16.111.163	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	1		\$ 35.000	Martin de Jesus Obando Osorio
Wilmar Hernan Osorio Buitrago	16.115.332	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	1		\$ 35.000	Wilmar Hernan Osorio Buitrago
Oscar Johany Quintero Molano	1.061.657.738	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	1		\$ 35.000	Oscar Johany Quintero Molano
Jorge William Rios Ramirez	1.002.955.012	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	30		\$ 1.050.000	Jorge William Rios Ramirez
Divier Jose Priolo Arroyo	15.619.708	Oficial de obra	\$ 50.000	\$ 4.600	4		\$ 200.000	Divier Jose Priolo Arroyo
Victor Andres Henao Otalvaro	1.067.928.253	Residente	\$ 50.000	\$ 4.600	1		\$ 50.000	Victor Andres Henao Otalvaro
Juan Gabriel Bedoya Muñoz	1.061.656.936	Profesional SISO	\$ 50.000	\$ 4.600	1		\$ 50.000	Juan Gabriel Bedoya Muñoz
TOTAL A PAGAR PRESENTE NOMINA							\$ 6.980.000	

	F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	1 /	Fecha del informe	20/01/2020	Acta parcial	X	Acta final	
-------------------	-----	----------------------	------------	--------------	---	------------	--

Número del contrato	0251/2020 /
Objeto:	Reposición de alcantarillado primera etapa barrio la laguna en el Municipio de Samaná Caldas
Nombre Contratista:	Unión temporal la laguna
Representante legal:	Katerine Pérez Nisperuza
Fecha del contrato:	23 de noviembre del 2020 /
Plazo de ejecución:	60 días calendario contados desde la suscripción del acta de inicio /
Valor inicial:	\$ 210.235.104 /
Fecha de iniciación:	03 de diciembre del 2020 /
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	31 de enero del 2021 /
Nueva fecha de terminación:	
Adición (en valor):	
Prórroga (en tiempo):	
Supervisor:	Arlex Quintero Vásquez

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	52 %
Avance físico Acumulado	52 %

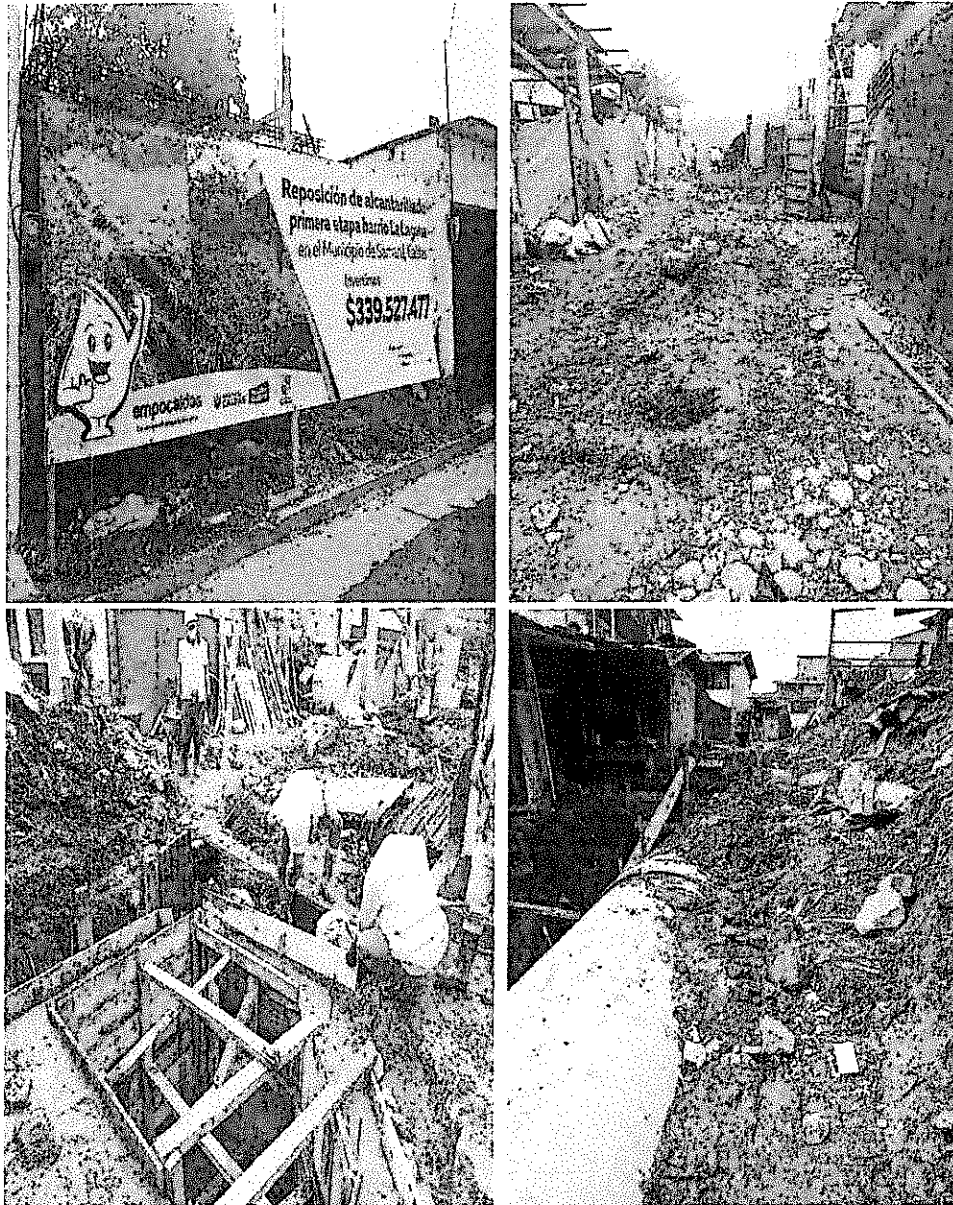
1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)


INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
Samaná	Alcantarillado	0.70

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	60
Tiempo total transcurrido:	49
Avance Porcentual:	82 %

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)



 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.5. Problemáticas con la obra

Hasta el momento no se han presentado problemáticas dentro de la ejecución de la obra

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 210.235.104
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 109.794.755
Porcentaje ejecutado en el periodo:	52 %
Inversión total ejecutada:	\$ 109.794.755
Porcentaje total ejecutado:	52 %

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)


GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Cumplimiento	SEGUROS MUNDIAL	BQ-100035008	03/12/2020	02/08/2021	\$ 63.070.531.20
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	SEGUROS MUNDIAL	BQ-100035008	03/12/2020	02/02/2024	\$ 42.047.020.80
Estabilidad y calidad de la obra	SEGUROS MUNDIAL	BQ-100035008	Ampara 5 años, 0 meses y 0 días		\$ 42.047.020.80
Responsabilidad civil extracontractual	SEGUROS MUNDIAL	BQ-100008939	03/12/2020	03/05/2021	\$ 63.070.531.20

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

4.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Andrés Felipe Palacios	X	X	X	X	X
Mario Alexander Rodríguez	X	X	X	X	X
Kristian Estiven Cediél García	X	X	X	X	X
Jesús Hernán Bedoya Buitrago	X	X	X	X	X
Alex Andrés Giacometto Vides	X	X	X	X	X
María Eugenia Castañeda Cifuentes	X	X	X	X	X
Jorge Marín	X	X	X	X	X
Arbey Muñoz	X	X	X	X	X

5. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	

6. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
04/12/2020	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A
18/01/2021	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A

Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

7. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)
Se anexa acta de cantidades de obra

8. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

8.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				

8.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

Son beneficiados los pobladores del Municipio de Samaná Caldes del barrio la laguna

9. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		x
Acta de veeduría		x
Acta de convenio de precios		x
Plan de manejo ambiental		x
Ensayos de laboratorio		x
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		x
Bitácora de la obra	x	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		x
Paz y Salvo oficina de trabajo.		x
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.		x
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		x
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	x	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1	4
---	---


ARLEX QUINTERO VASQUEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR


FIRMA DEL SUPERVISOR

EMPOCALDAS S.A.E.S.P

CONTRATO No: 0251 DE 2020		ACTA No: 1 PARCIAL		FECHA CORTE: 20 DE ENERO DEL 2021				
OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA BARRIO LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS		FECHA INICIACION: 03 DE DICIEMBRE DEL 2020		FECHA VENCIMIENTO: 31 DE ENERO DEL 2021				
MUNICIPIO: SAMANA CALDAS		VALOR CONTRATO: \$ 210.235.104		VALOR CONTRATO + ADICION:				
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LA LAGUNA		VALOR OBRA: \$ 210.235.104		FECHA: 22 DE ENERO DEL 2021				
REPRESENTANTE LEGAL: KATERINE PEREZ NISPERUZA		SUPERVISION: ARLX QUINTERO VASQUEZ		FECHA: 22 DE ENERO DEL 2021				
ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		ACTA 1 PARCIAL		% EJECUT		
		UN	CAN	CAN	VR TOTAL			
PRELIMINARES								
1	Localización y replanteo (Incluye plano record)	mi	72	5.827	419.544	72	419.544	100%
2	Techado provisional en plastico y guadua	m2	200	10.112	2.022.400	-	-	0%
3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	156	15.211	2.372.916	-	-	0%
4	Señal preventiva y reglamentaria	und	2	173.643	347.286	2	347.286	100%
5	Instalación de valla institucional 2x4	und	1	879.018	879.018	1	879.018	100%
DEMOLICIONES								
6	Corte con disco abrasivo	ml	20	8.527	170.540	20	170.540	100%
7	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañueñas	m³	60	93.123	5.587.380	50	4.656.150	83%
EXCAVACION								
8	En material común de 0 a 2m	m³	333	29.417	9.795.861	400	11.766.800	120%
9	En material común de 2,1 a 4m	m³	288	34.296	9.877.248	-	-	0%
10	Entibado metálico Tipo II	ml	400	44.910	17.964.000	-	-	0%
11	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor	m³	151	36.604	5.527.204	130	4.758.520	86%
ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO								
12	Instalación de tubería PVC corrugada de 10"	ml	72	221.556	15.952.032	50	11.077.800	69%
13	Instalación de tubería PVC corrugada de 51"	ml	72	112.994	8.135.568	70	7.909.580	97%
14	Cámara de caída D=1,2, H=3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla	ml	8,0	949.983	7.599.864	12	11.399.796	150%
15	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HD D=0.60cm para trafico pesado	Un	3	869.171	2.607.513	4	3.476.684	133%
16	Bases y Cañueñas	Un	3	805.453	2.416.359	3	2.416.359	100%
17	Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	Un	48	15.428	740.544	40	617.120	83%
18	Cajas de inspección 0,50x0,50 *H para domiciliarias, Incluye tapa en concreto	und	10	446.901	4.469.010	5	2.234.505	50%
19	Instalación de sifletas de 10"x6"	und	10	48.601	486.010	5	243.005	50%
20	Empalme a cámara	und	6	100.947	605.682	6	605.682	100%
LLENOS								
21	Grava para base y atraque	m³	91	134.865	12.272.715	30	4.045.950	33%
22	Lleno compactado con material de obra	m³	470	24.736	11.625.920	450	11.131.200	96%
23	Sub base para pavimento	m³	20	161.904	3.238.080	14	2.266.656	70%
CONCRETOS								

24	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	und	3	676.782	2.030.346	3	2.030.346	100%	
25	Concreto para recubrimiento de tubería 175 kg/cm2	m3	30	748.501	22.455.030	25	18.712.525	83%	
26	Concreto para pavimento 42MR echo en obra	m3	10	919.099	9.190.990	5,0	4.595.495	50%	
	ACERO								
27	Acero de refuerzo para dovelas y traslapes y refuerzo de cámaras, losas y vigas	Kg	1400	5.911	8.275.400	400	2.364.400	29%	
28	Acompañamiento social durante toda la obra	mes	2	1.669.794	3.339.588	1	1.669.794	50%	
29	Elementos de protección personal para protección contra el COVID-19 (Se pagara según factura mas AUI)	GL	1	7.000.000	7.000.000	-	-	0%	
30	Trabajador siso	mes	2	3.209.571	6.419.142	1	3.209.571	50%	
31	Demolicion de estructura muros en ladrillo de concreto y columnas	m2	77,50	64.870	5.027.425	60	3.892.200	77%	
32	Desmonte y montaje de cubierta	m2	48,50	47.904	2.323.344	40	1.916.160	82%	
33	Desmonte y montaje de techo en zinc	m2	80	35.928	2.874.240	70	2.514.960	88%	
34	Concreto para cabezote de entrega	m3	10	698.601	6.986.010	-	-	0%	
35	Construcción de muros en ladrillo de 0.13* ,20*0,30	m2	77,50	47.406	3.673.965	-	-	0%	
36	Concreto para vigas y columnas 4000 psi	m3	6	921.155	5.526.930	-	-	0%	
	COSTO TOTAL				210.235.104		109.794.755		
	COSTO DIRECTO				155.787.406		81.359.581		
	ADMINISTRACION		24		37.388.977		19.526.300		
	IMPREVISTOS		5		7.789.370		4.067.979		
	UTILIDADES		5		7.789.370		4.067.979		
	SUMA ANTES DE IVA				208.755.124		109.021.839		
	IVA SOBRE UTILIDADES		19		1.479.980		772.916		
	TOTAL				210.235.104		109.794.755		
RESUMEN DEL CONTRATO									
	VALOR DEL CONTRATO						210.235.104		
	VALOR ADICION								
	VALOR ACTA 1 PARCIAL				109.794.755				
	VALOR ACTAS				109.794.755				
	SALDO NO EJECUTADO				100.440.349				
	SUMAS IGUALES				210.235.104		210.235.104		
RESUMEN DEL ANTICIPO									
EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO									


ARLEX QUINTERO QUIROZ
 SUPERVISOR
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P


KATERINE PEREZ NISPERUZA
 CONTRATISTA
