	F-GC-22 Versión 10 Junio 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA	

# CONTRATO Y AÑO	283 DE 2021	Acta N°	2	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	208.728.307
				2. VALOR ADICION	0
CONTRATISTA	CONSORCIO SUPIA 2021			3. VALOR TOTAL (1+2)	208.728.307
NIT O CC:	901543188			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	122.416.546
CDP (#, rubro y fecha)	00295 DE 18 DE ENERO DE 2022, RUBRO 2320101001030815			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	43.840.643
RP (#, rubro y fecha)	000244 DE 19 DE ENERO DE 2022, RUBRO 2320101001030815			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	42.471.118
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SUPIA (GRUPO 6) DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS				
TIPO DE RECURSOS	CONVENIO GOBERNACIÓN DE CALDAS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			
DOCUMENTO VERIFICADOS					✓ # FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					X
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					N/A
3- Pagos al FIC					N/A
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					X
5- Informe de actividades o Bitácora.					X
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					X
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					X
8- Ensayos de densidad.					N/A
9- Diseño de Mezclas.					X
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					X
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)					X
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					N/A
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					N/A
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)					X
15- Acta parcial o final del contrato.					X

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.


Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


NOMBRE DE QUIEN RECIBE


FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura original o Documento equivalente		X
Acta parcial o final del contrato.		X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		X
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
087070080285	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Factura Electrónica De Venta #FE-2 Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Líneas: 1

Fecha de Validación: 23/02/2022 08:49 PM
Fecha de Generación: 23/02/2022 08:49 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Emisor : CONSORCIO SUPIA 2021
Razon Social: CONSORCIO SUPIA 2021
NIT: 901543186-4
Teléfono: + (57) 3113488584
Correo Electrónico: pablo.ingeniero85@gmail.com
Dirección: CL 71 4 71 CA 64 CONJ PORTAL DE LA FLORIDA
Departamento: CALDAS
Municipio: VILLAMARIA

Receptor : EMPOCALDAS SA ESP
Razon Social: EMPOCALDAS
NIT: 890803239-9
Teléfono: +(57) 8 867080
Correo Electrónico: emp@empocaldas.com.co
Dirección: CARRERA 23 No.75-82
Responsabilidad Fiscal: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Régimen Fiscal: Responsable de IVA
País: Colombia
Departamento: CALDAS
Municipio: MANIZALES



Código	Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Retención	Retención	Valor Total
1	283	CONTRATO 283	1.00	Suma global	32,026,184.00	32,026,184.00	0	0.00	32,026,184.00
		MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL MUNICIPIO DE SUPIA (GRUPO 6) DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS							

Detalle de Impuestos		Detalle de Ventas	
Administración (28.94 %):	COP 9,268,377.65	Subtotal :	COP 32,026,184.00
Imprevisto (2.00 %):	COP 640,523.68	Descuento :	COP 0.00
Utilidad (5.00 %):	COP 1,601,309.20	Monto Bruto :	COP 32,026,184.00
Total Aju (35.94 %):	COP 11,510,210.53	Monto IVA :	COP 304,248.75
		Total Venta:	COP 43,840,643.28
		- Descuento :	COP 0.28

Detalles:

Son: CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
 ACTA PARCIAL DE OBRA No 02

CUFE :

49322b1c25cd924e992b31a7bc70ed7272c57a53ca34a669f4931cd2e1acd4e7411ec75c74c9b95c5aeddac513b26b63

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generada por: <https://factoa.co>

Manizales, febrero de 2022

Señores
EMPOCALDAS SA ESP
Ciudad

Referencia: Autorización

Cordial saludo

Mediante la presente autorizo la consignación de los recursos económicos provenientes de la ejecución del contrato No.283 de 2021, cuyo contratista es el Consorcio Supía 2021, a la cuenta de ahorros Davivienda No. 087070080285, la cual se encuentra a mi nombre.

Atentamente



PABLO A. ROMERO G.
R.L. Consorcio Supía 2021

QIA



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA N°	02
PERIODO DE CONTROL	ENERO 24 A FEBRERO 01 DE 2022
FECHA DE PRESENTACIÓN	FEBRERO DE 2022
CONTRATO N°	283 DE 2021
OBJETO	MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SAN EAMIENTO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SUPIA (GRUPO 6) DEL DEPARTAMEN TO DE CALDAS
FECHA DE INICIO	10/12/2021
FECHA DE TERMINACIÓN	22/02/2022
VALOR INICIAL	\$ 208.728.307,00
VALOR TOTAL	\$ 208.728.307,00
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
CONTRATISTA	CONSORCIO SUPIA 2021
SUPERVISOR	JOHAN MANUEL SABOGAL RAMIREZ

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA No.01		ACTA No.02		OBRA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1	Localización y replanteo de intervención	UN	10,00	\$ 126.509,94	\$ 1.265.099,41	10	\$ 1.265.099,00	2	\$ 253.020,00	12	\$ 1.518.119,00
2	Desvío de cauce	M2	2,00	\$ 37.038,54	\$ 74.077,09	4,5	\$ 166.673,00	17	\$ 629.655,00	21,5	\$ 796.329,00
3	Descapote y limpieza	M2	1026,74	\$ 2.604,49	\$ 2.674.136,73	681,6	\$ 1.775.222,00	169,2	\$ 440.680,00	850,8	\$ 2.215.902,00
4	Limpieza de superficie interna y descontaminación de tanque con desinfectante	M2	58,51	\$ 5.591,15	\$ 327.138,14	42,73	\$ 238.910,00	0	\$ 0,00	42,73	\$ 238.910,00
5	Adecuación cara exterior de tanques (incluye alisado de superficie y reparación revoque defectuoso)	M2	40,95	\$ 17.625,12	\$ 721.748,66	65,35	\$ 1.151.802,00	0	\$ 0,00	65,35	\$ 1.151.802,00
6	Demoliciones varias de repello o revoque existente interior - exterior	M2	58,51	\$ 5.784,85	\$ 338.471,43	21,61	\$ 125.011,00	0	\$ 0,00	21,61	\$ 125.011,00
7	Excavación en material común de 0-2 m	M3	208,02	\$ 20.794,48	\$ 4.325.668,45	270,17	\$ 5.618.046,00	33,07	\$ 687.674,00	303,24	\$ 6.305.719,00
8	Excavación en conglomerado común de 0-2 m	M3	269,98	\$ 29.836,43	\$ 8.055.240,12	278,17	\$ 8.299.601,00	114,65	\$ 3.420.747,00	392,82	\$ 11.720.348,00
9	Lleno con material del sitio	M3	298,85	\$ 18.564,14	\$ 5.547.892,03	309,48	\$ 5.745.229,00	145,66	\$ 2.704.052,00	455,14	\$ 8.449.281,00
10	Lleno compactado con material de río	M3	84,00	\$ 19.962,62	\$ 1.676.860,43	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00
11	Suministro transporte e instalación de afirmado compactado	M3	9,48	\$ 126.562,70	\$ 1.199.814,42	0	\$ 0,00	4,8	\$ 607.501,00	4,8	\$ 607.501,00
12	Regada de material sobrante de la excavación	M3	41,00	\$ 16.716,48	\$ 685.375,50	1,55	\$ 25.911,00	0	\$ 0,00	1,55	\$ 25.911,00
13	Concreto ciclópeo	M3	1,20	\$ 623.394,19	\$ 748.073,03	1,3	\$ 810.412,00	1,3	\$ 810.412,00	2,6	\$ 1.620.825,00
14	Concreto 3500 PSI	M3	15,72	\$ 662.584,03	\$ 10.415.820,94	2,9	\$ 1.921.494,00	2,9	\$ 1.921.494,00	5,8	\$ 3.842.987,00
15	Revoque impermeabilizado	M2	99,46	\$ 58.384,53	\$ 5.806.925,72	42,73	\$ 2.494.771,00	0	\$ 0,00	42,73	\$ 2.494.771,00
16	Suministro, transporte e instalación acero de refuerzo F'y=4200 kg/cm2	KG	1413,80	\$ 7.744,96	\$ 10.948.281,25	190,71	\$ 1.477.042,00	132,94	\$ 1.029.616,00	323,65	\$ 2.506.658,00
17	Suministro e instalación de válvula compuerta elástica JH de 2"	UN	10,00	\$ 412.044,55	\$ 4.120.445,48	1	\$ 412.045,00	1	\$ 412.045,00	2	\$ 824.089,00
18	Suministro, transporte e instalación caja válvulas con elevador en PVC NF de 12" y tapa en concreto reforzado	UN	1,00	\$ 297.012,86	\$ 297.012,86	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00
19	Suministro e instalación pasamuro L 30 de 2"	UN	11,00	\$ 30.868,34	\$ 339.551,79	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00
20	Suministro e instalación de tubería PVC presión RDE 13.5 de 1/2"	M	700,00	\$ 8.838,44	\$ 6.186.908,14	100	\$ 883.844,00	0	\$ 0,00	100	\$ 883.844,00

ACTA N°	02
PERIODO DE CONTROL	ENERO 24 A FEBRERO 01 DE 2022
FECHA DE PRESENTACIÓN	FEBRERO DE 2022
CONTRATO N°	283 DE 2021
OBJETO	MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SAN FAMILIAMENTO DEL MUNICIPIO DE SUPIA (GRUPO 6) DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
FECHA DE INICIO	10/12/2021
FECHA DE TERMINACIÓN	22/02/2022
VALOR INICIAL	\$ 208.728.307,00
VALOR TOTAL	\$ 208.728.307,00
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
CONTRATISTA	CONSORCIO SUPIA 2021
SUPERVISOR	JOHAN MANUEL SABOGAL RAMIREZ

CONDICIONES CONTRACTUALES										
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL
21	Suministro e instalación de tubería PVC presión RDE 21 de 3/4"	M	200,00	\$ 10.400,26	\$ 2.080.052,62	200	\$ 2.080,053,00	0	\$ 0,00	\$ 2.080.053,00
22	Suministro e instalación de tubería PVC presión RDE 21 de 1"	M	100,00	\$ 12.700,98	\$ 1.270.098,15	100	\$ 1.270,098,00	0	\$ 0,00	\$ 1.270.098,00
23	Suministro e instalación de tubería PVC presión RDE 21 unión mecánica de 2"	M	1418,00	\$ 20.913,01	\$ 29.654.652,37	1872	\$ 39.149.160,00	558	\$ 11.669.461,00	\$ 50.818.621,00
24	Suministro e instalación de tubería PVC presión RDE 21 unión mecánica de 3"	M	12,00	\$ 36.188,99	\$ 434.267,91	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	\$ 0,00
25	Suministro e instalación de tubería PVC santería 2"	M	12,00	\$ 23.071,84	\$ 276.862,10	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	\$ 0,00
26	Suministro e instalación de tanque de almacenamiento prefabricado de 32 m3	UN	1,00	\$ 7.788.736,06	\$ 7.788.736,06	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	\$ 0,00
27	Suministro e instalación de cubierta para tanque de almacenamiento en geomembrana	- M2	61,83	\$ 52.899,63	\$ 2.741.787,68	39,6	\$ 2.094.825,00	0	\$ 0,00	\$ 2.094.825,00
28	Suministro e instalación de rejilla metálica autoimplantante 60cmx30cm en ángulo perimetral de 2"x2"x1/4" barras de acero corrugado de 1/2" espaciadas entre ejes a 2,5cm, incluye bisagras, elementos de anclaje y pintura anticorrosiva.	UN	2,00	\$ 214.623,68	\$ 429.247,36	1	\$ 214.624,00	0	\$ 0,00	\$ 214.624,00
29	Trasiego de material a punto de instalación con personal de obra	KG	1013,46	\$ 504,35	\$ 511.137,70	1850	\$ 933.046,00	1200	\$ 605.219,00	\$ 1.538.265,00
30	Sobrecarreo en vehículo no automotor de tracción animal	M3/HM	2072,63	\$ 19.011,85	\$ 39.404.442,98	593	\$ 11.274.028,00	299,37	\$ 5.691.578,00	\$ 16.965.606,00
NP1	Demolición de estructuras de concreto	M3	2,00	\$ 76.515,00	\$ 153.030,00	0	\$ 0,00	2	\$ 153.030,00	\$ 153.030,00
NP2	Suministro e instalación de valla informativa proyecto	UN	2,00	\$ 990.000,00	\$ 1.980.000,00	0	\$ 0,00	1	\$ 990.000,00	\$ 990.000,00
COSTO DIRECTO				\$ 152.478.856,53	\$ 1.980.728.307,00		\$ 89.426.946,00		\$ 32.026.184,00	\$ 121.453.129,00
				28,94%	\$ 44.127.381,08		\$ 25.880.158,17		\$ 9.268.377,65	\$ 35.148.535,53
				I	\$ 3.049.577,13		\$ 1.788.538,92		\$ 640.523,68	\$ 2.429.062,58
				U	\$ 7.623.942,83		\$ 4.471.347,30		\$ 1.601.309,20	\$ 6.072.656,45
				IVA	\$ 1.448.549,14		\$ 849.555,99		\$ 304.248,75	\$ 1.153.804,73
				19%			\$ 122.416.546,00		\$ 43.840.643,00	\$ 166.257.189,00
COSTO TOTAL					\$ 208.728.307,00		\$ 122.416.546,00		\$ 43.840.643,00	\$ 166.257.189,00

OBRA ACUMULADA	ACTA No.02	ACTA No.01
VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA


ACTA N°	02
PERIODO DE CONTROL	ENERO 24 A FEBRERO 01 DE 2022
FECHA DE PRESENTACIÓN	FEBRERO DE 2022
CONTRATO N°	283 DE 2021
OBJETO	MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SAN EAMIENTO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SUPIA (GRUPO 6) DEL DEPARTAMEN TO DE CALDAS
FECHA DE INICIO	10/12/2021
FECHA DE TERMINACIÓN	22/02/2022
VALOR INICIAL	\$ 208.728.307,00
VALOR TOTAL	\$ 208.728.307,00
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
CONTRATISTA	CONSORCIO SUPIA 2021
SUPERVISOR	JOHAN MANUEL SABOGAL RAMIREZ

CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA No.01		ACTA No.02		OBRA ACUMULADA		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL

CONTROL FINANCIERO					
RESUMEN DEL CONTRATO					
VALOR DEL CONTRATO					\$ 208.728.307,0
VALOR ADICIONAL					\$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	\$		122.416.546,0		
VALOR PRESENTE ACTA OBRA	\$		43.840.643,0		
SALDO POR EJECUTAR	\$		42.471.118,0		
SUMAS IGUALES	\$		208.728.307,0		

VALOR PRESENTE ACTA	\$	43.840.643,0	VALOR A PAGAR EN LETRAS	CUARENTA Y TRES MILLON ES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100
AMORTIZACION ANTICIPO				
VALOR A PAGAR	\$	43.840.643		


FIRMA CONTRATISTA
CONSORCIO SUPIA 2021
R.L. PABLO ARTURO ROMERO GIRALDO
C.C. 75.107.602 de Manizales
M.P. 17202-160005 CLD


FIRMA SUPERVISIÓN
EMPOCALDAS SA ESP
ING. JOHAN MANUEL SABOGAL RAMIREZ

EMPOCALDAS SA ESP

PREACTA DE OBRA N° 01

CONTRATO N°	283 DE 2021
CONTRATISTA	CONSORCIO SUPIA 2021
SUPERVISOR	JOHAN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
PERIODO DE CONTROL	ENERO 24 A FEBRERO 01 DE 2022
ÍTEM	Excavación en material común de 0-2 m
NÚMERO DE ÍTEM	7

UNIDAD M3

FECHA	UBICACIÓN Frente	DIMENSIONES						SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES
		Largo	Ancho	Alto	Unidad	Peso	Distancia	Tiempo	Unidad	Acumulado
								0,0	0,0	
								0,0	0,0	
	VEREDA LAS VEGAS	314	0,30	0,8		20%		15,1	15,1	INSTALACION TUBERIA
	VEREDA LAS VEGAS	12	0,5	1,2		20%		1,4	16,5	INSTALACION TUBERIA
	VEREDA LA CECILIA	230	0,30	0,8		30%		16,6	33,1	INSTALACION TUBERIA
								0,0	33,1	
								0,0	33,1	
								0,0	33,1	
								0,0	33,1	
								0,0	33,1	
								0,0	33,1	
								0,0	33,1	
								0,0	33,1	
								0,0	33,1	
								0,0	33,1	
								0,0	33,1	TOTAL

CONTRATISTA



SUPERVISOR



EMPOCALDAS SA ESP


PREACTA DE OBRA N° 01

CONTRATO N°	283 DE 2021
CONTRATISTA	CONSORCIO SUPIA 2021
SUPERVISOR	JOHAN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
PERIODO DE CONTROL	ENERO 24 A FEBRERO 01 DE 2022
ÍTEM	Suministro transporte e instalación de afirmado compactado
NÚMERO DE ÍTEM	11

UNIDAD M3

FECHA	UBICACIÓN	DIMENSIONES							SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES
	Frente	Largo	Ancho	Alto	Unidad	Peso	Distancia	Tiempo	Unidad	Acumulado	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
	VEREDAS GENERAL	20	0,30	0,8					4,8	4,8	
									0,0	4,8	
									0,0	4,8	
									0,0	4,8	
									0,0	4,8	
									0,0	4,8	
									0,0	4,8	
									0,0	4,8	
									0,0	4,8	
									0,0	4,8	
									0,0	4,8	
									0,0	4,8	
									0,0	4,8	
									0,0	4,8	
									0,0	4,8	
									0,0	4,8	
									0,0	4,8	TOTAL

CONTRATISTA



SUPERVISOR



CONTRATO N°	283 DE 2021
CONTRATISTA	CONSORCIO SUPIA 2021
SUPERVISOR	JOHAN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
PERIODO DE CONTROL	ENERO 24 A FEBRERO 01 DE 2022
ÍTEM	Concreto ciclópeo
NÚMERO DE ÍTEM	13

UNIDAD M3

FECHA	UBICACIÓN	DIMENSIONES							SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES
	Frente	Largo	Ancho	Alto	Unidad	Peso	Distancia	Tiempo	Unidad	Acumulado	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
	VEREDA LA DIVISA	2,6	2,00	0,25	1				1,3	1,3	BOCATOMA TIPO II
									0,0	1,3	
									0,0	1,3	
									0,0	1,3	
									0,0	1,3	
									0,0	1,3	
									0,0	1,3	
									0,0	1,3	
									0,0	1,3	
									0,0	1,3	
									0,0	1,3	
									0,0	1,3	
									0,0	1,3	
									0,0	1,3	
									0,0	1,3	TOTAL

CONTRATISTA



SUPERVISOR



EMPOCALDAS SA ESP

PREACTA DE OBRA N° 01

CONTRATO N°	283 DE 2021
CONTRATISTA	CONSORCIO SUPIA 2021
SUPERVISOR	JOHAN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
PERIODO DE CONTROL	ENERO 24 A FEBRERO 01 DE 2022
ÍTEM	Concreto 3500 PSI
NÚMERO DE ÍTEM	14

UNIDAD	M3
--------	----

FECHA	UBICACIÓN Frente	DIMENSIONES							SubTOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES
		Largo	Ancho	Alto	Unidad	Peso	Distancia	Tiempo	Unidad	Acumulado	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
	VEREDA LA DIVISA	2,6	1,38	0,4			1		1,4	1,4	CUERPO. BOCATOMA TIPO II
	VEREDA LA DIVISA	2,6	0,25	0,5	2		1		0,7	2,1	CUERPO. BOCATOMA TIPO II
	VEREDA LA DIVISA	0,9	0,15	0,7	4		1		0,4	2,5	MUROS DE ENCAUZAMIENTO. BOCATOMA TIPO II
	VEREDA LA DIVISA	0,9	0,90	0,15			1		0,1	2,6	PISO. CAJA DE TOMA. BOCATOMA TIPO II
	VEREDA LA DIVISA	0,6	0,15	0,7	2		1		0,1	2,7	PAREDES. CAJA DE TOMA BOCATOMA TIPO II
	VEREDA LA DIVISA	0,9	0,15	0,7	2		1		0,2	2,9	PAREDES. CAJA DE TOMA BOCATOMA TIPO II
	VEREDA BAJO CABUYAL	4	4,00	0,15			0		0,0	2,9	TAPA
	VEREDA LA CECILIA	2,86	1,36	0,18			0		0,0	2,9	DESARENADOR. PISO
	VEREDA LA CECILIA	2,5	0,18	1,15	2		0		0,0	2,9	DESARENADOR. PAREDES
	VEREDA LA CECILIA	1,36	0,18	1,1	2		0		0,0	2,9	DESARENADOR. PAREDES
	VEREDA LA CECILIA	1,18	0,20	0,2	3		0		0,0	2,9	DESARENADOR. VIGAS
	VEREDA LA CECILIA	1,18	0,70	0,1	4		0		0,0	2,9	DESARENADOR. TAPAS
	VEREDA LA CECILIA	1,18	0,10	0,3	2		0		0,0	2,9	DESARENADOR. PANTALLAS
	VEREDA BAJO CABUYAL	2,3	1,00	0,15			0		0,0	2,9	DESARENADOR. PISO
	VEREDA BAJO CABUYAL	2,3	0,15	1,1	2		0		0,0	2,9	DESARENADOR. PAREDES
	VEREDA BAJO CABUYAL	0,7	0,15	0,9	2		0		0,0	2,9	DESARENADOR. PAREDES
	VEREDA BAJO CABUYAL	0,9	0,20	0,15	3		0		0,0	2,9	DESARENADOR. VIGAS

	VEREDA BAJO CABUYAL	0,9	0,5	0,1	4		0		0,0	2,9	DESARENADOR. TAPAS
	VEREDA BAJO CABUYAL	0,9	0,10	0,3	2		0		0,0	2,9	DESARENADOR. PANTALLAS
									0,0	2,9	TOTAL

CONTRATISTA  SUPERVISOR 

EMPOCALDAS SA ESP

PRACTA DE OBRA N° 01

CONTRATO N°	283 DE 2021
CONTRATISTA	CONSORCIO SUPIA 2021
SUPERVISOR	JOHAN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
PERIODO DE CONTROL	ENERO 24 A FEBRERO 01 DE 2022
ÍTEM	Suministro, transporte e instalación acero de refuerzo F'y=4200 kg/cm2
NÚMERO DE ÍTEM	16

UNIDAD KG

FECHA	UBICACIÓN Frente	DIMENSIONES							SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES
		Largo	Ancho	Alto	Unidad	Peso	Distancia	Tiempo	Unidad	Acumulado	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
	VEREDA LA DIVISA	2,8			28	0,56	2		87,8	87,8	BOCATOMA TIPO II. 2 SENTIDOS
	VEREDA LA DIVISA	2,3			5	0,99	2		22,9	110,7	BOCATOMA TIPO II. TRANSVERSAL REJILLA
	VEREDA LA DIVISA	0,7			16	0,99	2		22,3	132,9	BOCATOMA TIPO II. LONGITUDINAL REJILLA
	VEREDA LA DIVISA	1,9			24	0,99	2	0	0,0	132,9	BOCATOMA TIPO II. LONGITUDINAL ALETAS
	VEREDA LA DIVISA	0,7			56	0,99	2	0	0,0	132,9	BOCATOMA TIPO II. TRANSVERSAL ALETAS
	VEREDA LA DIVISA	2,5			6	0,99	2	0	0,0	132,9	BOCATOMA TIPO II. CAJA DE TOMA
	VEREDA LA DIVISA	2,1			12	0,99	2	0	0,0	132,9	BOCATOMA TIPO II. CAJA DE TOMA
	VEREDA BAJO CABUYAL	3,83			21	0,99	0		0,0	132,9	TAPA
	VEREDA LA CECILIA	3,02			88	0,99	0		0,0	132,9	DESARENADOR
	VEREDA BAJO CABUYAL	2,52			68	0,99	0		0,0	132,9	DESARENADOR
									0,0	132,9	
									0,0	132,9	
									0,0	132,9	
									0,0	132,9	TOTAL

CONTRATISTA



SUPERVISOR



EMPOCALDAS SA ESP


PREACTA DE OBRA N° 01

CONTRATO N°	283 DE 2021
CONTRATISTA	CONSORCIO SUPIA 2021
SUPERVISOR	JOHAN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
PERIODO DE CONTROL	ENERO 24 A FEBRERO 01 DE 2022
ÍTEM	Suministro e instalación de cubierta para tanque de almacenamiento en geomembrana
NÚMERO DE ÍTEM	27

UNIDAD	M2
--------	----

FECHA	UBICACIÓN Frente	DIMENSIONES							SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES
		Largo	Ancho	Alto	Unidad	Peso	Distancia	Tiempo	Unidad	Acumulado	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
									0,0	0,0	
									0,0	0,0	
									0,0	0,0	
									0,0	0,0	
									0,0	0,0	
									0,0	0,0	
									0,0	0,0	
									0,0	0,0	
									0,0	0,0	
									0,0	0,0	
									0,0	0,0	
									0,0	0,0	
									0,0	0,0	
									0,0	0,0	
									0,0	0,0	
									0,0	0,0	
									0,0	0,0	TOTAL

CONTRATISTA 

SUPERVISOR 

EMPOCALDAS SA ESP

PREACTA DE OBRA N° 01

CONTRATO N°	283 DE 2021
CONTRATISTA	CONSORCIO SUPIA 2021
SUPERVISOR	JOHAN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
PERIODO DE CONTROL	ENERO 24 A FEBRERO 01 DE 2022
ÍTEM	Demolicion de estructuras de concreto
NÚMERO DE ÍTEM	NP1

UNIDAD M3

FECHA	UBICACIÓN Frente	DIMENSIONES						SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
		Largo	Ancho	Alto	Unidad	Peso	Distancia	Tiempo	Unidad		Acumulado
	VEREDA LAS VEGAS				2				2,0	2,0	
									0,0	2,0	
									0,0	2,0	
									0,0	2,0	
									0,0	2,0	
									0,0	2,0	
									0,0	2,0	
									0,0	2,0	
									0,0	2,0	
									0,0	2,0	
									0,0	2,0	
									0,0	2,0	
									0,0	2,0	
									0,0	2,0	
									0,0	2,0	
									0,0	2,0	
									0,0	2,0	TOTAL

CONTRATISTA



SUPERVISOR




EMPOCALDAS SA ESP

PREACTA DE OBRA N° 01

CONTRATO N°	283 DE 2021
CONTRATISTA	CONSORCIO SUPIA 2021
SUPERVISOR	JOHAN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
PERIODO DE CONTROL	ENERO 24 A FEBRERO 01 DE 2022
ÍTEM	Suministro e instalación de valla informativa proyecto
NÚMERO DE ÍTEM	NP2

UNIDAD	UN
--------	----

FECHA	UBICACIÓN Frente	DIMENSIONES							SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES
		Largo	Ancho	Alto	Unidad	Peso	Distancia	Tiempo	Unidad	Acumulado	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
	SUPIA				1				1,0	1,0	
									0,0	1,0	
									0,0	1,0	
									0,0	1,0	
									0,0	1,0	
									0,0	1,0	
									0,0	1,0	
									0,0	1,0	
									0,0	1,0	
									0,0	1,0	
									0,0	1,0	
									0,0	1,0	
									0,0	1,0	
									0,0	1,0	
									0,0	1,0	
									0,0	1,0	
									0,0	1,0	TOTAL

CONTRATISTA 

SUPERVISOR 



empocaldas
CONSTRUCCIÓN PARA EL BIENESTAR

F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL


Informe Número	02	Fecha del informe	01-02-2022	Acta parcial	02	Acta final	
----------------	----	-------------------	------------	--------------	----	------------	--

CONTRATO DE OBRA N°	0283 de 2021
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD DE ÚNICA OFERTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S. S. E. S. P.
NIT	890.803.239-9
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
C.C.	10.072.158 DE MANIZALES
OBJETO	MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SUPIA (GRUPO 6) DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
CONTRATISTA	CONSORCIO SUPIA 2021
N.I.T.	901.543.188-4
REPRESENTANTE LEGAL	PABLO ARTURO ROMERO GIRALDO
C.C.	75.107.602 DE MANIZALES
MUNICIPIO DE EJECUCIÓN	SUPIA, CALDAS
COSTO DIRECTO	\$ 152.478.857,00
ADMINISTRACIÓN 28%	\$ 44.127.381,00
IMPREVISTO 1%	\$ 3.049.577,00
UTILIDAD 6%	\$ 7.623.943,00
IVA SOBRE UTILIDAD 19%	\$ 1.448.549,00
VALOR TOTAL OBRA	\$ 208.728.307,00 INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES
RECURSOS	CONVENIO GOBERNACIÓN OM
SUPERVISIÓN	INGENIERO DE ZONA JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
CDP	295 DEL 18 DE ENERO DE 2022
RP	000244 LDEL 19 DE ENERO DE 2022

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	21,00%
Avance físico Acumulado	79,65%

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	

1.2. Informe de actividades: (Se anexa resumen de ejecución de la obra).

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
SUPIA	ACUEDUCTO	2.830

Instalado al corte de obra.

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	60
Tiempo total transcurrido:	53
Avance Porcentual:	88,33% ✓

Corte realizado con fecha del 01 de FEBRERO de 2022.

1.4. Registro fotográfico (Se presenta en el resumen de actividades).
Se remite como anexo 1 del presente informe

1.5. Problemáticas con la obra

Teniendo en cuenta que los frentes de obra son en 9 veredas distintas del Municipio de Supia en algunas de ellas se han tenido casos particulares de condiciones diferentes a las inicialmente planteadas en el estudio de necesidad, así mismo, para este periodo, la ejecución de obra se ha desarrollado como se explica a continuación:

- VEREDA LAS VEGAS: se llevó a cabo la instalación de 326 ml adicionales de tubería de 2", necesarios para la optimización de todo el sistema de acueducto rural como necesita la comunidad. Adicionalmente, por petición de la comunidad ante la deficiencia en el suministro, se realizó la conexión con collarín de 20 acometidas domiciliarias que aún se encontraban conectadas a la tubería existente que se cambió. Al respecto, el personal del contratista de obra realizó la instalación de estas 20 conexiones, mientras la junta del acueducto aportó la mano de obra para excavaciones y llenos dado que dentro del contrato no se tiene contemplado realizar las acometidas.
- VEREDA LA DIVISA: luego de la destrucción de la bocatoma, la comunidad procedió a poner el denuncia ante las autoridades por daño a un bien público de beneficio colectivo, y se autorizó al contratista a realizar la reconstrucción de esta obra, luego de la intervención realizada por la administración municipal ante la comunidad y la correspondiente autorización del PDA.
- VEREDA LA CECILIA: debido que algunos propietarios de predios relacionados con el trasiego de materiales y mano de obra se estaban oponiendo a autorizar

dichas actividades necesarias para la ejecución de las obras, fue necesaria la urgente colaboración e intervención de la administración municipal, no solo por el vencimiento del plazo del contrato No.283 de 2021, sino también porque el trasiego de materiales y mano de obra se iba a ver impedido por el cierre de la vía de acceso a la vereda producto del inicio de obras de placa huella. Luego de su intervención, la administración municipal comunicó al PDA y a Empocaldas que se tenía autorización de toda la comunidad para el trasiego de materiales hasta el sitio de las obras. Así las cosas, se llevó a cabo la construcción del desarenador y adicionalmente la reposición de 230 ml de tubería de 2”.


- **VEREDA BAJO CABUYAL:** de acuerdo al estudio de necesidad se indicó que se debía realizar la instalación de tubería para optimizar la aducción en 600 metros lineales en ½”, sin embargo, cuando se ejecutó la visita se determinó por parte del presidente de la Junta del Acueducto que la tubería desde la aducción al tanque estaba en muy buenas condiciones, por lo tanto lo ideal para las necesidades del sistema del acueducto era la construcción de un desarenador cercano al tanque de almacenamiento y adicionalmente reforzar la tapa de dicho tanque ya que se encontraba con fisuras debido al paso obligado de motocicletas; al respecto, se llevó a cabo la construcción del desarenador requerido por la comunidad y el reforzamiento de la tapa del tanque.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 208.728.307,00
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 43.840.643,00 ✓
Porcentaje ejecutado en el periodo:	21,00%
Inversión total ejecutada:	\$ 166.257.188,00
Porcentaje total ejecutado:	79.65 %

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Salarios, prestaciones sociales legales	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-45-101049980	24-11-2021	24-04-2022	\$62.618.492,10
Estabilidad y Calidad de la Obra	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-45-101049980	24-11-2021	24-01-2027	\$41.745.661,40
Cumplimiento del Contrato	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-45-101049980	24-11-2021	5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	\$41.745.661,40
Responsabilidad Civil	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-40-101038046	24-11-2021	24-04-2022	\$62.618.492,10

 em pocaldas <small>CONSTRUCCIÓN PARA EL BIENESTAR</small> F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

(Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

ACTIVIDAD DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Maestro de Obra (1)	X	X	X	X	X
Oficial (1)	X	X	X	X	X
Ayudante (7)	X	X	X	X	X

El contratista a la fecha se encuentra al día con el pago de la seguridad social y con el pago de salarios y prestaciones de los trabajadores que se encuentran vinculados al proyecto. Se anexan las planillas con la lista de chequeo de pago acta 02 presentada para el presente informe de supervisión.

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)

SE ANEXAN EN EL PAQUETE DE COBRO DEL ACTA 02 PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2021.


5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación).

El contratista cuenta con SGSST, el cual fue entregado al área encargada por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, se han realizado las inducciones y capacitaciones correspondientes, de acuerdo al SGSST.

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
ENERO DE 2022	A	N/U	A	A	N/A	A	N/A	N/A

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Se Anexa Memorias de Cálculo en Pre actas)

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

 empocaldas <small>CONTRIBUYENDO EN EL DESARROLLO</small> F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personas con limitaciones físicas	0	0	0
	Personas No contempladas dentro de condiciones especiales	0	0	0
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personas con limitaciones físicas	0	0	0
	Personas No contempladas dentro de condiciones especiales	0	0	0
TOTALES		0	0	0
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA.

La población Beneficiada por cada Municipio se distribuye así:

MUNICIPIO	FRENTES	OBJETO CONTRACTUAL	POBLACIÓN BENEFICIADA
SUPIA	9	MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SUPIA (GRUPO 6) DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	DIRECTAMENTE: 720 USUARIOS.

TOTAL: DIRECTAMENTE 720 FAMILIAS APROXIMADAMENTE.


8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios		X
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio	X	
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra	X	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		X
Paz y Salvo oficina de trabajo.		X
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	

NOTA: El pago del FIC se realizará con el acta final y liquidación del contrato, por tanto, en la presente acta no se adjunta.

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1	4
---	---

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ
 NOMBRE DEL SUPERVISOR


 FIRMA DEL SUPERVISOR

ANEXO 1

VEREDA LAS VEGAS



Proceso de excavación e instalación de tubería de presión de 2".

VEREDA LA CECILIA



Excavaciones para construcción de desarenador

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Main body of faint, illegible text, appearing to be several paragraphs of a document.

Left column of dense, illegible text, possibly a list or detailed notes.

Right column of dense, illegible text, possibly a list or detailed notes.



VEREDA LA DIVISA



Sitio de difícil acceso



Formaleta, aceros y reconstrucción de bocatoma en concreto reforzado.




empocaldas
Compañía de Servicios Públicos

F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

**EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL




Denuncio de la comunidad vereda La Divisa.

VEREDA BAJO CABUYAL



Excavaciones para construcción de desarenador.

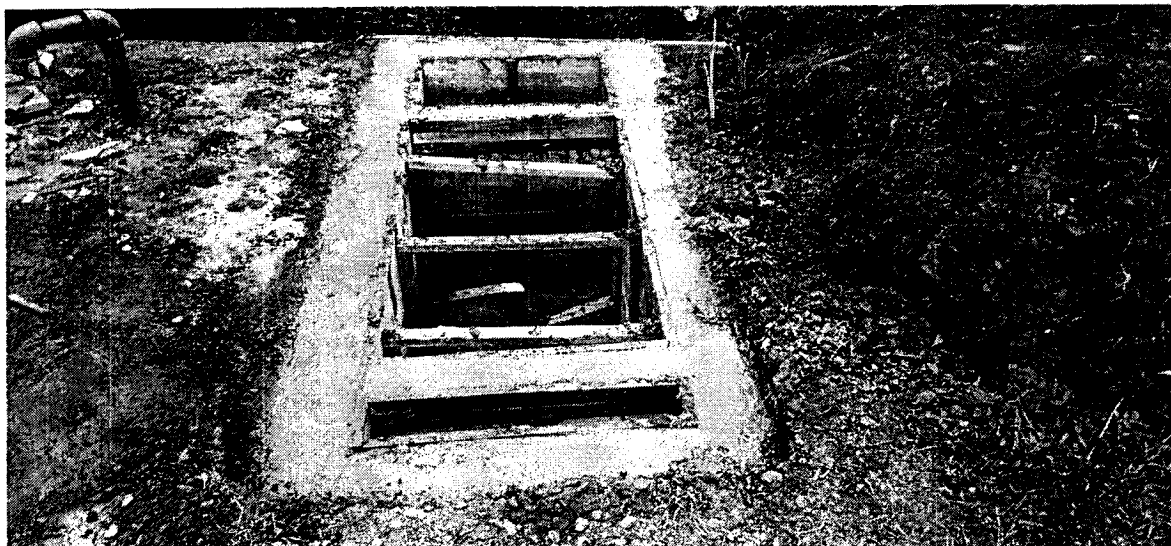

Proceso constructivo desarenador




empocaldas
CONSTRUCCIÓN PARA EL BIENESTAR

F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

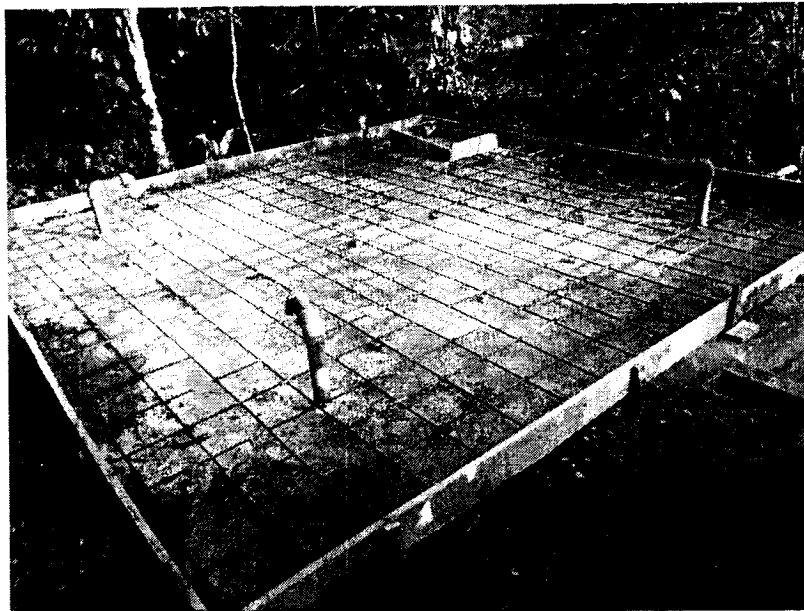

Reforzamiento tapa de tanque.

Manizales, febrero de 2022

Señores
EMPOCALDAS SA ESP
Ciudad

Referencia: Certificación cumplimiento artículo 50 de la ley 789/02

Cordial saludo

Mediante la presente certifico bajo la gravedad de juramento el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales y afiliaciones a salud, pensiones, cesantías y riesgos profesionales (artículo 50 de la ley 789 de 2002) correspondiente a los últimos seis meses.

Atentamente



PABLO A. ROMERO G.
R.L. Consorcio Supía 2021



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENAE	
Identificación	dv	Razon Social	Planilla	Planilla	PRINCIPAL	MAZANA 4 CASA 14 BARRIO LAS VEGAS	DOSQUEBRADAS-MISARALDA	3150229	SI	ICBF	SI		
CC 1094917986		CARLOS MARIO ALVAREZ MUÑOZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES										

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Planilla	Dias Mora	Valor
2021-12	2022-01	1297339775	9429944115	E	2022/01/21	2022/01/23	BANCO DAVIVIENDA	4	\$4.312,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte			
1	CC 112781805	AGUIRRE VALENCIA DARIO	230301	17	\$514,832	\$8,400	EP5002	17	\$514,832	\$20,600	CCF44	17	\$514,832	\$20,600	14-29	17	\$514,832	\$35,800	17		\$0				\$0				
2	CC 105919423	ALVAREZ MUÑOZ JHONNY ALEXANDER	230301	30	\$1,280,000	\$204,800	EP5002	30	\$1,280,000	\$51,200	CCF44	30	\$1,280,000	\$51,200	14-29	30	\$1,280,000	\$89,100	30		\$0				\$0				
3	PE 946424119121	BASTIDAS RIVERO JONCE LUIS	230301	13	\$393,695	\$43,000	EP5002	13	\$393,695	\$15,800	CCF44	13	\$393,695	\$15,800	14-29	13	\$393,695	\$27,500	13		\$0				\$0				
4	CC 1004789716	CARCONA MONTES YEFER ALVARADO	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5004	30	\$908,526	\$36,400	CCF44	30	\$908,526	\$36,400	14-29	30	\$908,526	\$43,300	30		\$0				\$0				
5	CC 100483155	CASTAÑEDA CABRILLO DAVIS ALBERTO	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5016	30	\$908,526	\$36,400	CCF44	30	\$908,526	\$36,400	14-29	30	\$908,526	\$43,300	30		\$0				\$0				
6	CC 987308	CORREA LINDO CARLOS ENRIQUE	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF44	30	\$908,526	\$36,400	14-29	30	\$908,526	\$43,300	30		\$0				\$0				
7	CC 100786188	CORTES LOHONCO JOSÉ ALVARO	230301	14	\$423,979	\$67,800	EP5046	14	\$423,979	\$17,000	CCF44	14	\$423,979	\$17,000	14-29	14	\$423,979	\$29,600	14		\$0				\$0				
8	CC 100473410	GRALLAS CORRALES FABIANA	230301	11	\$440,000	\$70,400	EP5037	11	\$440,000	\$17,600	CCF44	11	\$440,000	\$17,600	14-29	11	\$440,000	\$30,700	11		\$0				\$0				
9	CC 9443109	LEON ACUIRRE HOOPER ORLANDO	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF44	30	\$908,526	\$36,400	14-29	30	\$908,526	\$43,300	30		\$0				\$0				
10	CC 109332027	LOPEZ RESCANO ANDRES FELIPE	230301	29	\$878,242	\$140,600	EP5002	29	\$878,242	\$38,200	CCF44	29	\$878,242	\$38,200	14-29	29	\$878,242	\$61,200	29		\$0				\$0				
11	CC 108832353	MARIN RIVERA ORINKATHAN ALEXIS	230201	21	\$635,969	\$101,800	EP5002	21	\$635,969	\$25,500	CCF44	21	\$635,969	\$25,500	14-29	21	\$635,969	\$44,300	21		\$0				\$0				
12	CC 109338436	MORALES GONALDO WILLIAM ALBERTO	230301	30	\$1,280,000	\$204,800	EP5002	30	\$1,280,000	\$51,200	CCF44	30	\$1,280,000	\$51,200	14-29	30	\$1,280,000	\$89,100	30		\$0				\$0				
13	CC 100756049	MOSQUERA SANCHEZ CRISTHIAN CAMILO	230201	8	\$242,274	\$36,800	EP5037	8	\$242,274	\$9,700	CCF44	8	\$242,274	\$9,700	14-29	8	\$242,274	\$16,900	8		\$0				\$0				
14	CC 100452037	MOSQUERA SANCHEZ HERIBERTO YULIAN	230201	21	\$635,969	\$101,800	EP5006	21	\$635,969	\$25,500	CCF44	21	\$635,969	\$25,500	14-29	21	\$635,969	\$44,300	21		\$0				\$0				
15	CC 1105780473	PATINO HINCAPIE EDWIN DAVID	230201	30	\$1,280,000	\$204,800	EP5002	30	\$1,280,000	\$51,200	CCF44	30	\$1,280,000	\$51,200	14-29	30	\$1,280,000	\$89,100	30		\$0				\$0				
16	CC 108330005	PATINO HINCAPIE YERSON ABRAHAMO	230301	14	\$423,979	\$67,800	EP5037	14	\$423,979	\$17,000	CCF44	14	\$423,979	\$17,000	14-29	14	\$423,979	\$29,600	14		\$0				\$0				
17	CC 1004801724	PEREZ BELTRAN JUAN PABLO	230301	4	\$121,137	\$19,400	EP5002	4	\$121,137	\$4,900	CCF44	4	\$121,137	\$4,900	14-29	4	\$121,137	\$8,500	4		\$0				\$0				
18	CC 1002854438	SANCHEZ MONTAÑA KELI YANISMAN	231001	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF44	30	\$908,526	\$36,400	14-29	30	\$908,526	\$43,300	30		\$0				\$0				
19	CC 1152440916	SANMARTIN ZULUAGA JUAN CARLOS	23-14	14	\$423,979	\$67,800	EP5010	14	\$423,979	\$17,000	CCF44	14	\$423,979	\$17,000	14-29	14	\$423,979	\$29,600	14		\$0				\$0				
20	CC 1004547653	VALENCIA CORREA FRANK STEVEN	230301	16	\$484,548	\$77,600	EP5037	16	\$484,548	\$19,400	CCF44	16	\$484,548	\$19,400	14-29	16	\$484,548	\$33,800	16		\$0				\$0				
Total					Afiliados (20)	\$14,001,233	\$2,240,900		\$14,001,233	\$360,800			\$13,642,707	\$535,200			\$14,001,233	\$975,700				\$0				\$0			

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	\$2,240,900	\$0	\$0	\$2,240,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$67,900	\$0	\$0	\$67,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	\$998,800	\$0	\$0	\$998,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	\$1,028,800	\$0	\$0	\$1,028,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	\$975,700	\$0	\$0	\$975,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	20	\$975,700	\$0	\$0	\$975,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	\$535,200	\$0	\$0	\$535,200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	20	\$535,200	\$0	\$0	\$535,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				20	\$560,800	\$0	\$0	\$560,800
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$17,000	\$0	\$0	\$17,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	1	\$17,000	\$0	\$0	\$17,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$63,700	\$0	\$0	\$63,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	\$364,800	\$0	\$0	\$364,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$25,500	\$0	\$0	\$25,500
TOTAL				20	\$4,312,600	\$0	\$0	\$4,312,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	CC 1054917986	dv		Razon Social	CARLOS MARIO ALVAREZ MUÑOZ	Clase Aportante	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Sucursal Principal	PRINCIPAL	Direccion	MAZANA 4 CASA 14 BARRIO LAS YEGAS	Ciudad-Departamento	DOSQUEBRADAS-RISARALDA	Telefono	3150329	Exonerado SENA	SI	ICBF
----------------	---------------	----	--	--------------	----------------------------	-----------------	-----------------------------	--------------------	-----------	-----------	-----------------------------------	---------------------	------------------------	----------	---------	----------------	----	------

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	2022-01	2022-02	1337100634	Clave	9431237389	Planilla		Planilla	E	Fecha	2022/02/18	Pago	2022/02/22	Banco	BANCO DAVIVIENDA	Dias Mora	4	Valor	56.350,800
---------	---------	---------	------------	-------	------------	----------	--	----------	---	-------	------------	------	------------	-------	------------------	-----------	---	-------	------------

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombres	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte			
1	112781805	ACUERO VALENCIA	230301	30	\$160,000	EF5002	30	\$40,000	CCF44	30	\$40,000	14-25	30	\$569,600	30	\$50,000	14-25	30	\$569,600	30	\$1,000,000	14-25	30	\$569,600
2	1054919425	ALVAREZ MUNOZ	230301	30	\$204,800	EF5002	30	\$51,200	CCF44	30	\$51,200	14-25	30	\$589,100	30	\$1,280,000	14-25	30	\$589,100	30	\$1,280,000	14-25	30	\$589,100
3	108280096	BEDOYA HERNANDEZ	230201	20	\$106,700	EF5018	20	\$26,700	CCF44	20	\$26,700	14-25	20	\$566,667	20	\$26,700	14-25	20	\$566,667	20	\$566,667	14-25	20	\$566,667
4	1004789716	CARDONA MONTES	230201	30	\$160,000	EF5044	30	\$40,000	CCF44	30	\$40,000	14-25	30	\$569,600	30	\$50,000	14-25	30	\$569,600	30	\$1,000,000	14-25	30	\$569,600
5	1088361535	CASTAÑEDA	230201	30	\$160,000	EF5002	30	\$40,000	CCF44	30	\$40,000	14-25	30	\$569,600	30	\$50,000	14-25	30	\$569,600	30	\$1,000,000	14-25	30	\$569,600
6	9873086	CORREA LADINO	230201	30	\$160,000	EF5002	30	\$40,000	CCF44	30	\$40,000	14-25	30	\$569,600	30	\$50,000	14-25	30	\$569,600	30	\$1,000,000	14-25	30	\$569,600
7	1087992053	CORREA RAMIREZ	231001	4	\$25,600	EF5010	4	\$6,400	CCF44	4	\$6,400	14-25	4	\$11,200	4	\$11,200	14-25	4	\$11,200	4	\$11,200	14-25	4	\$11,200
8	1007986188	CORTES LONDOÑO	230301	4	\$21,400	EF5045	4	\$5,400	CCF44	4	\$5,400	14-25	4	\$9,300	4	\$9,300	14-25	4	\$9,300	4	\$9,300	14-25	4	\$9,300
9	1035861023	DURANGO MORAÑO	231001	28	\$149,400	EF5002	28	\$37,400	CCF44	28	\$37,400	14-25	28	\$565,000	28	\$37,400	14-25	28	\$565,000	28	\$37,400	14-25	28	\$565,000
10	10018563	GARCIA MORALES	230201	7	\$37,400	EF5002	7	\$9,400	CCF44	7	\$9,400	14-25	7	\$16,300	7	\$9,400	14-25	7	\$16,300	7	\$9,400	14-25	7	\$16,300
11	1004735410	GRAJALES	230301	19	\$121,600	EF5037	19	\$30,400	CCF44	19	\$30,400	14-25	19	\$32,900	19	\$30,400	14-25	19	\$32,900	19	\$30,400	14-25	19	\$32,900
12	18518485	GRAJALES	230201	28	\$149,400	ESSC62	28	\$37,400	CCF44	28	\$37,400	14-25	28	\$565,000	28	\$37,400	14-25	28	\$565,000	28	\$37,400	14-25	28	\$565,000
13	1105670876	HERNANDEZ	230301	5	\$26,700	EF5037	5	\$6,667	CCF44	5	\$6,667	14-25	5	\$11,700	5	\$6,667	14-25	5	\$11,700	5	\$6,667	14-25	5	\$11,700
14	1088338730	QUINA HERNANDEZ	230201	20	\$106,700	EF5002	20	\$26,700	CCF44	20	\$26,700	14-25	20	\$565,000	20	\$26,700	14-25	20	\$565,000	20	\$26,700	14-25	20	\$565,000
15	94435109	LEON AGUIRRE	230201	30	\$160,000	EF5002	30	\$40,000	CCF44	30	\$40,000	14-25	30	\$569,600	30	\$50,000	14-25	30	\$569,600	30	\$1,000,000	14-25	30	\$569,600
16	1092320277	LOAIZA DELGADO	230301	22	\$117,400	EF5002	22	\$29,400	CCF44	22	\$29,400	14-25	22	\$51,100	22	\$29,400	14-25	22	\$51,100	22	\$29,400	14-25	22	\$51,100
17	1092320277	LOAIZA DELGADO	230301	8	\$42,700	EF5002	8	\$26,667	CCF44	8	\$26,667	14-25	8	\$50	8	\$26,667	14-25	8	\$50	8	\$26,667	14-25	8	\$50
18	1087991659	MARIN TREJOS JHON	230201	20	\$106,700	EF5002	20	\$26,700	CCF44	20	\$26,700	14-25	20	\$565,000	20	\$26,700	14-25	20	\$565,000	20	\$26,700	14-25	20	\$565,000
19	10199431	MONCADA CARDONA	230301	12	\$64,000	EF5002	12	\$40,000	CCF44	12	\$40,000	14-25	12	\$27,900	12	\$40,000	14-25	12	\$27,900	12	\$40,000	14-25	12	\$27,900
20	1098363626	MORALES GILBERTO	230301	30	\$204,800	EF5002	30	\$51,200	CCF44	30	\$51,200	14-25	30	\$589,100	30	\$1,280,000	14-25	30	\$589,100	30	\$1,280,000	14-25	30	\$589,100
21	1003851822	MOSQUERA PEREA	230301	28	\$149,400	ESSC26	28	\$37,400	CCF44	28	\$37,400	14-25	28	\$565,000	28	\$37,400	14-25	28	\$565,000	28	\$37,400	14-25	28	\$565,000
22	1078178227	PALACIO LLOREDA	230301	2	\$10,700	EF5005	2	\$66,667	CCF44	2	\$2,700	14-25	2	\$4,700	2	\$2,700	14-25	2	\$4,700	2	\$2,700	14-25	2	\$4,700
23	1105780473	PATINO HINCAPIRE	230201	30	\$204,800	EF5002	30	\$51,200	CCF44	30	\$51,200	14-25	30	\$589,100	30	\$1,280,000	14-25	30	\$589,100	30	\$1,280,000	14-25	30	\$589,100
24	1088308055	PATINO HINCAPIRE	230301	30	\$160,000	EF5037	30	\$40,000	CCF44	30	\$40,000	14-25	30	\$569,600	30	\$50,000	14-25	30	\$569,600	30	\$1,000,000	14-25	30	\$569,600
25	1060506255	PERSON AYMANDO	230201	20	\$106,700	EF5002	20	\$26,700	CCF44	20	\$26,700	14-25	20	\$565,000	20	\$26,700	14-25	20	\$565,000	20	\$26,700	14-25	20	\$565,000
26	102056438	SANCHEZ MONTYA	230301	30	\$160,000	EF5002	30	\$40,000	CCF44	30	\$40,000	14-25	30	\$569,600	30	\$50,000	14-25	30	\$569,600	30	\$1,000,000	14-25	30	\$569,600
27	1152440916	SANMARTIN	23-14	7	\$37,400	EF5010	7	\$9,400	CCF44	7	\$9,400	14-25	7	\$16,300	7	\$9,400	14-25	7	\$16,300	7	\$9,400	14-25	7	\$16,300
28	1088310463	TAPASCO MONROY	230301	6	\$32,000	EF5002	6	\$8,000	CCF44	6	\$8,000	14-25	6	\$14,000	6	\$8,000	14-25	6	\$14,000	6	\$8,000	14-25	6	\$14,000

Resumen General de Pago

29	CC	1087547653	VALENCIA CORREA FRANK STIVEN	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF44	30	\$1,000,000	\$40,000	14-25	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	\$0
Total Afiliados(28)						\$20,660,007	\$3,306,300			\$20,660,007	\$827,100			\$19,905,614	\$796,900			\$20,660,007	\$1,420,500		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				28	\$3,306,300	\$0	\$0	\$3,306,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$175,000	\$0	\$0	\$175,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$37,400	\$0	\$0	\$37,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	\$1,635,500	\$0	\$0	\$1,635,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	\$1,458,400	\$0	\$0	\$1,458,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				28	\$1,420,500	\$0	\$0	\$1,420,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	28	\$1,420,500	\$0	\$0	\$1,420,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				28	\$796,900	\$0	\$0	\$796,900
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	28	\$796,900	\$0	\$0	\$796,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				28	\$827,100	\$0	\$0	\$827,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$37,400	\$0	\$0	\$37,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$37,400	\$0	\$0	\$37,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$15,800	\$0	\$0	\$15,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	1	\$5,400	\$0	\$0	\$5,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$117,100	\$0	\$0	\$117,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$26,700	\$0	\$0	\$26,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	\$544,600	\$0	\$0	\$544,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$2,700	\$0	\$0	\$2,700
TOTAL				28	\$6,350,800	\$0	\$0	\$6,350,800
