



F-GC-29
Versión 4
Junio de 2020

EMPOCALDAS S.A.E.S.P
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	029 DE 2022	Acta N°	5	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	15,482,524
				2. VALOR ADICION (+)	7,741,262
CONTRATISTA	IVÁN MATEO MUÑOZ MARTÍNEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	23,223,786
NIT O CC:	1,053,856,851			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	15,704,281
CDP (#, rubro y fecha)	00172/2320202009/11-01-2022 00172/2120203001/11-01-2022 000548/2120203001/29-04-2022 000548/2320202009/29-04-2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	4,061,850
RP (#, rubro y fecha)	000135/2320202009/11-01-2022 000135/2120203001/11-01-2022 000668/2120203001/29-04-2022 000668/2320202009/29-04-2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	3,457,655

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS AJUSTES Y DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTOS SEMESTRALES Y ANUALES DE LOS PSMV Y DEL POIR.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
1- Acta original			X
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).			X
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).			NA
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X
5- Pagos SENA y ICBF.			NA
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			NA
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			NA
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			X

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	
Copia del acta	X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	NA
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Pe	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación	NA
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación

31/05/2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIEGO ALEJANDRO PATIÑO RINCON	COORDINADOR DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO HÍDRICO	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
059-000510-28	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

31-05-22
M. J. R. AM

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 05

CONTRATO	No. 029 DE 2022
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS AJUSTES Y DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTOS SEMESTRALES Y ANUALES DE LOS PSMV Y DEL POIR.
CONTRATISTA	IVAN MATEO MUÑOZ MARTINEZ
C.C. No.	1.053.856.851
VALOR DEL ACTA	\$4.061.850

De los cuales \$3.370.631 equivalen a los honorarios del contrato, y \$691.219 equivalen a gastos oficiales de viajes realizados a municipios de Caldas donde Empocaldas presta el servicio de alcantarillado, con el fin de verificar el estado de los descoles.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$15.482.524
ADICION 1	\$7.741.262
ACTA PARCIAL No. 01	\$4.012.477
ACTA PARCIAL No. 02	\$4.061.832
ACTA PARCIAL No. 03	\$4.012.477
ACTA PARCIAL No. 04	\$3.617.495
ACTA PARCIAL No. 05	\$4.061.850
SALDO POR PAGAR	\$3.457.655

En Manizales (Caldas) a los treinta y un (31) días del mes de mayo de 2022, se reunieron el Ingeniero DIEGO ALEJANDRO PATIÑO RINCON Coordinador Acueducto y Saneamiento Hídrico de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y el contratista IVÁN MATEO MUÑOZ MARTÍNEZ, con el fin de tramitar el pago de los días laborados del mes de mayo correspondiente al Contrato No. 029 de enero 11 de 2022.




VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO. 05 CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE (\$4.061.850).

El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (EPS SURAMERICANA S.A.), pensión (COLPENSIONES) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de abril de 2022.

El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió con las obligaciones y actividades que desarrollan en el objeto acordado.

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella.



DIEGO ALEJANDRO PATIÑO RINCON
Coordinador Acueducto y Saneamiento
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



IVAN MATEO MUÑOZ MARTINEZ
Contratista


Manizales, mayo 31 de 2022

**EL COORDINADOR DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A
E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 029 DE 2022**

CERTIFICA QUE:

El contratista IVÁN MATEO MUÑOZ MARTÍNEZ, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 1.053.856.851 de Manizales Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que me reporta en el Acta parcial No. 05 del contrato No. 029 de 2022 de los días laborados del mes de mayo de 2022

Para constancia se firma a los treinta y un (31) días del mes de mayo de 2022.



DIEGO ALEJANDRO PATIÑO RINCON
Coordinador Acueducto y Saneamiento
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



GESTION FINANCIERA
DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A
NO OBLIGADOS A FACTURAR

N°		1242	
DMA		1242	

F-GF-02
 Versión: 05
 2022-02-11

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
 NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11501	MANIZALES PLANEACION
-----------	-----------	------------------	-------	----------------------

REGIMEN COMUN, AUTORETENEDOR
 OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764025241121 DESDE DMA1045 HASTA DMA50,000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 31/05/2022		
NOMBRES Y APELLIDOS:	IVAN MATEO MUÑOZ MARTINEZ		
CEDULA O NIT:	1053856851		
DIRECCION:	CARRERA 8 N 45C-01	TELEFONO	3106018887


DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS AJUSTES Y DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTOS SEMESTRALES Y ANUALES DE LOS PSMV Y DEL POIR.

ACTO No. 05 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 029 DE 2022.

Nombre	IVAN MATEO MUÑOZ MARTINEZ	SUBTOTAL:	\$ 4,061,850
Cedula	1053856851	TOTAL RETENCIONES	
	FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR	TOTAL A PAGAR:	\$ 4,061,850

En mi calidad de Administrador de la Seccional, CERTIFICO, que durante la atención del evento que generó el gasto urgente e imprescindible, no fue posible encontrar un proveedor responsable de IVA y por ende se procedió a realizar la compra con un proveedor no responsable de IVA.


FIRMA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9


REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO 000135



FECHA DE EXPEDICION 2022/01/11
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000172 - 000172
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°029 ENE 01 DE 2022 PRESTACION DE SE
RVICIOS PROFESIONALES DE APOYO ELABORACION INFORMES PSMV Y POIR
BENEFICIARIO MUÑOZ MARTINEZ IVAN MATEO
C.C NRO 1053856851

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
2120203001 2320202009	Gastos oficiales, imprevistos y otros Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,000,000 13,482,524
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		15,482,524


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9


REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO 000668



FECHA DE EXPEDICION 2022/04/29
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000548 - 000548
COMPROMISO QUE AMPARA ADICION N°1 Y RPORROGA N°1 CONTRATO N°029 DE 2022 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA ELABORACION Y PRESENTACION AJUSTES
BENEFICIARIO MUÑOZ MARTINEZ IVAN MATEO
C.C NRO 1053856851

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
2120203001	Gastos oficiales, imprevistos y otros	1.000,000
2320202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	6.741,262
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		7,741,262


PAULA VELASQUEZ CASTAÑO
Jefe Sección Presupuesto (E)

PLAZO DE EJECUCION 60 DIAS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED
JAN 10 1964

FROM: [Illegible]
TO: [Illegible]

BY: [Illegible]
DATE: [Illegible]

Manizales, mayo 31 de 2022

INGENIERO

DIEGO ALEJANDRO PATIÑO RINCON

Coordinador Acueducto y Saneamiento

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


REFERENCIA: Actividades realizadas con cargo al Contrato No. 029 de 2022.


OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS AJUSTES Y DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTOS SEMESTRALES Y ANUALES DE LOS PSMV Y DEL POIR.

Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas comprendidas a los días laborados del mes de mayo de 2022, las cuales relaciono a continuación:

ACTIVIDADES REALIZADAS: Dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Se realizó visita de campo a los descoles ubicados en el Municipio de La Dorada, Caldas.

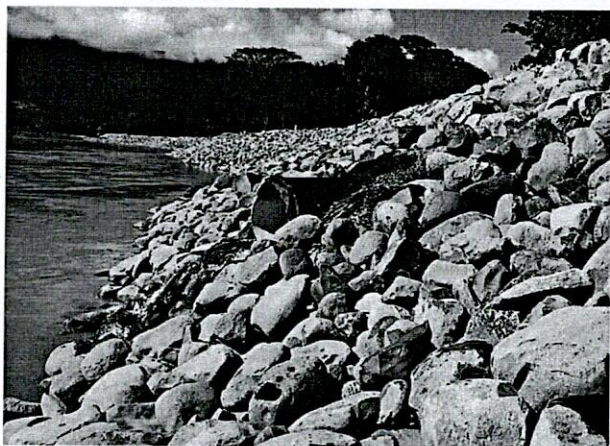

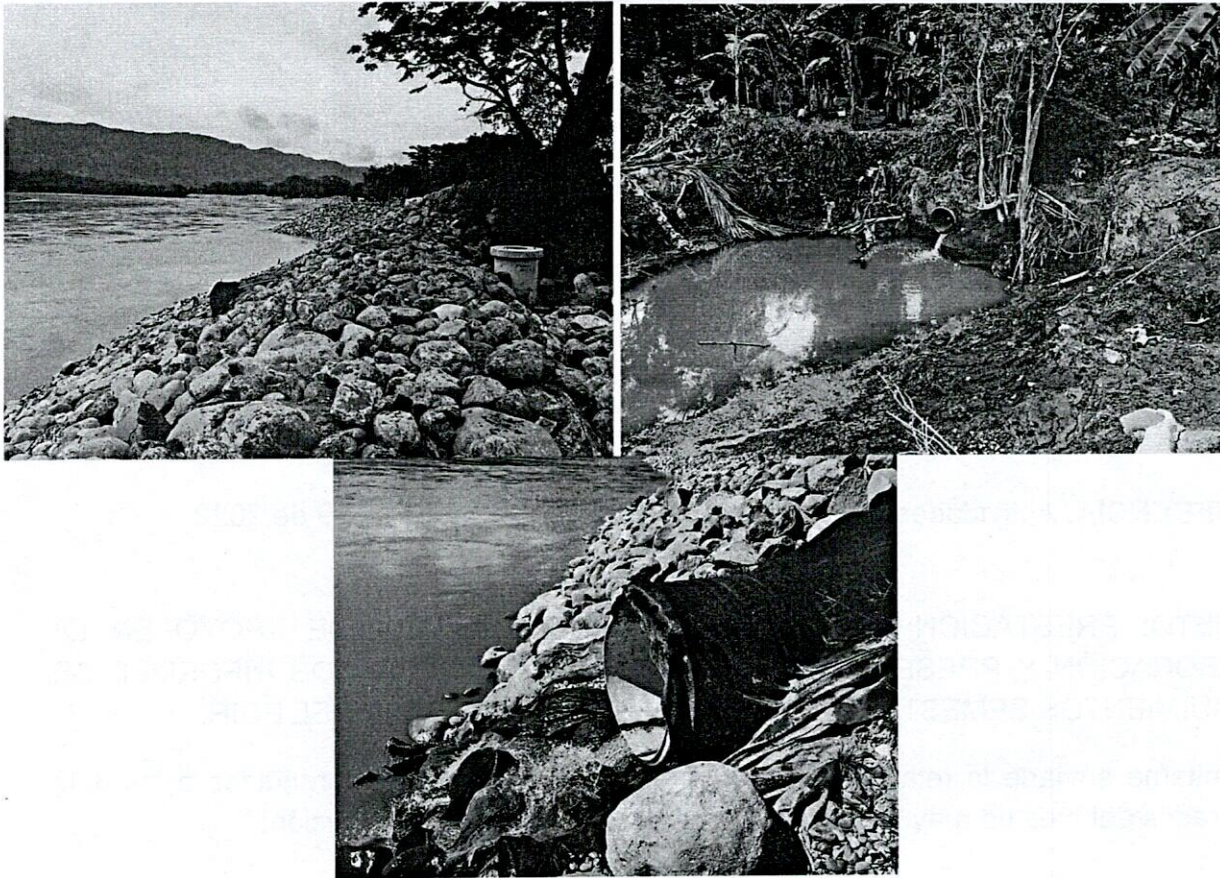

- Se realizó visita de campo a los descoles ubicados en el Municipio de San José, Caldas.
- Se realizó visita de campo a los descoles ubicados en el Municipio de Supía, Caldas.



- Se realizó informe de seguimiento al porcentaje de avance del Plan de Obras e Inversiones al 31 de marzo de 2022.

En el siguiente cuadro se presenta el porcentaje de inversión ejecutada del POIR por año.

AÑO	Inversión Programada (\$ Enero 2021)	Inversión Ejecutada a pesos (\$ Enero 2021)	Porcentaje de Ejecución del Proyecto (%)
2022	\$ 18.830.936.542,38	\$ 1.819.773.030,34	9,66%
2023	\$ 14.298.301.835,40	\$ 402.172.479,36	2,81%
2024	\$ 15.509.673.139,83	\$ 27.916.782,83	0,18%
2025	\$ 6.355.921.025,37	\$ 53.412.550,15	0,84%
2026	\$ 8.717.706.057,76	\$ -	0,00%
2027	\$ 7.083.716.419,85	\$ -	0,00%
2028	\$ 4.749.775.752,13	\$ -	0,00%
2029	\$ 4.090.592.877,04	\$ -	0,00%
2030	\$ 1.884.900.140,00	\$ 3.070.561,92	0,16%
2031	\$ 508.513.831,00	\$ -	0,00%
2032	\$ 1.206.687.941,00	\$ -	0,00%
TOTAL	\$ 83.236.725.561,77	\$ 2.306.345.404,60	2,77%

En el siguiente cuadro se presenta el porcentaje de inversión ejecutada por seccional.

SECCIONAL	SERVICIO	Inversión Programada (\$ Enero 2021)	Inversión Ejecutada (\$ Enero 2021)	% de ejecución
AGUADAS	ACUEDUCTO	\$ 2.102.888.532,64	\$ 94.455.826,21	4,49%
AGUADAS	ALCANTARILLADO	\$ 2.056.139.771,56	\$ 60.662.242,69	2,95%
ANSERMA	ACUEDUCTO	\$ 718.948.413,00	\$ 60.879.112,23	8,47%
ANSERMA	ALCANTARILLADO	\$ 2.258.922.758,00	\$ 136.637.814,24	6,05%
ARAUCA	ACUEDUCTO	\$ 132.385.865,00	\$ -	0,00%
ARAUCA	ALCANTARILLADO	\$ 525.514.675,00	\$ 130.754.405,33	24,88%
ARMA	ACUEDUCTO	\$ 169.991.241,00	\$ -	0,00%
ARMA	ALCANTARILLADO	\$ 838.568.842,00	\$ 67.701.126,42	8,07%
BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	\$ 2.655.421.347,00	\$ -	0,00%
CHINCHINA	ACUEDUCTO	\$ 5.573.821.542,55	\$ 344.731.590,52	6,18%
CHINCHINA	ALCANTARILLADO	\$ 2.514.935.819,41	\$ 226.181.344,99	8,99%
FILADELFIA	ACUEDUCTO	\$ 1.058.059.571,00	\$ 5.374.062,52	0,51%

FILADELFIA	ALCANTARILLADO	\$ 2.645.770.348,00	\$ -	0,00%
GUARINOCITO	ACUEDUCTO	\$ 1.123.216.382,91	\$ -	0,00%
KILOMETRO 41	ACUEDUCTO	\$ 504.643.641,00	\$ 22.761.840,87	4,51%
KILOMETRO 41	ALCANTARILLADO	\$ 839.328.986,00	\$ 22.761.840,87	2,71%
LA DORADA	ACUEDUCTO	\$ 4.136.025.013,00	\$ 57.260.087,55	1,38%
LA DORADA	ALCANTARILLADO	\$ 13.833.598.287,41	\$ 97.093.439,79	0,70%
MANZANARES	ACUEDUCTO	\$ 993.961.221,20	\$ 32.220.776,29	3,24%
MANZANARES	ALCANTARILLADO	\$ 1.747.524.739,35	\$ -	0,00%
MARQUETALIA	ACUEDUCTO	\$ 604.353.356,00	\$ 53.412.550,15	8,84%
MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	\$ 2.030.464.736,86	\$ 82.388.368,30	4,06%
MARULANDA	ACUEDUCTO	\$ 35.299.274,00	\$ -	0,00%
MARULANDA	ALCANTARILLADO	\$ 1.563.003.313,00	\$ 64.284.366,51	4,11%
NEIRA	ACUEDUCTO	\$ 3.643.862.180,71	\$ 43.102.873,47	1,18%
NEIRA	ALCANTARILLADO	\$ 1.767.377.584,40	\$ 72.618.744,26	4,11%
PALESTINA	ACUEDUCTO	\$ 646.071.860,00	\$ -	0,00%
PALESTINA	ALCANTARILLADO	\$ 400.000.000,00	\$ 3.070.561,92	0,77%
RIOSUCIO	ACUEDUCTO	\$ 153.054.037,00	\$ 4.785.353,78	3,13%
RIOSUCIO	ALCANTARILLADO	\$ 3.509.837.697,00	\$ 31.393.330,05	0,89%
RISARALDA	ALCANTARILLADO	\$ 870.396.609,00	\$ -	0,00%
SALAMINA	ACUEDUCTO	\$ 1.551.728.157,00	\$ 97.215.043,16	6,26%
SALAMINA	ALCANTARILLADO	\$ 2.007.611.333,25	\$ 89.941.753,62	4,48%
SAMANA	ACUEDUCTO	\$ 2.422.742.515,75	\$ 39.527.801,98	1,63%
SAMANA	ALCANTARILLADO	\$ 2.189.453.900,63	\$ 3.070.561,92	0,14%
SAN JOSE	ACUEDUCTO	\$ 34.895.427,02	\$ 2.751.542,89	7,89%
SAN JOSE	ALCANTARILLADO	\$ 269.812.581,00	\$ -	0,00%
SUPIA	ACUEDUCTO	\$ 747.628.754,00	\$ 165.778.464,28	22,17%
SUPIA	ALCANTARILLADO	\$ 4.386.887.859,00	\$ 160.953.294,50	3,67%
VICTORIA	ACUEDUCTO	\$ 1.094.969.123,12	\$ 14.564.715,23	1,33%
VICTORIA	ALCANTARILLADO	\$ 1.462.552.870,00	\$ 14.564.715,23	1,00%
VITERBO	ACUEDUCTO	\$ 2.330.037.364,00	\$ -	0,00%
VITERBO	ALCANTARILLADO	\$ 3.085.018.032,00	\$ 3.445.852,81	0,11%
TOTAL		\$ 83.236.725.561,77	\$ 2.306.345.404,60	2,77%



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



f Empocaldas **@** empocaldas_oficial
✉ empocaldas@empocaldas.com.co
🌐 www.empocaldas.com.co

ID PROY	SECCIÓN AL	SERVICIO	NOMBRE PROYECTO	Inversión Programada (\$ Enero 2021)	Inversión Ejecutada (\$ Enero 2021)	Porcentaje de Ejecución del Proyecto (%)	Fecha Programada de Finalización del Proyecto	RIESGO	SEMAFORO
1	AGUADAS	ACUEDUCTO	Mejoramiento del acueducto de Aguadas Etapa 1 Tanque	1.002.005.307,00	23.131.429,05	2,31%	2024	ALTO	
2	AGUADAS	ALCANTARILLA DO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Aguadas	71.682.241,00	0,00	0,00%	2022	ALTO	
3	AGUADAS	ACUEDUCTO	Mejoramiento del acueducto de Aguadas Etapa 2	157.853.940,00	0,00	0,00%	2027	ALTO	
4	AGUADAS	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Aguadas	24.584.142,00	0,00	0,00%	2022	ALTO	
5	AGUADAS	ALCANTARILLA DO	Reposición y mejoramiento del alcantarillado de Aguadas	631.105.805,00	0,00	0,00%	2026	ALTO	
6	AGUADAS	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Aguadas Etapa 1	455.957.862,00	0,00	0,00%	2028	ALTO	
7	AGUADAS	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Aguadas Etapa 1	110.777.911,64	10.662.154,47	9,62%	2022	ALTO	
8	AGUADAS	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Aguadas Etapa 2	162.000.000,00	0,00	0,00%	2023	ALTO	
9	AGUADAS	ACUEDUCTO	Mejoramiento Tanque Aguadas	74.467.569,00	0,00	0,00%	2023	ALTO	
10	AGUADAS	ACUEDUCTO	Suministro de materiales e implementación para la construcción de cubierta para almacenar tuberías y accesorios en predios de la planta de tratamiento	18.304.425,00	0,00	0,00%	2023	ALTO	
11	AGUADAS	ALCANTARILLA DO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Aguadas	138.846.378,56	60.662.242,69	43,69%	2022	ALTO	
12	AGUADAS	ACUEDUCTO	Reposición acueducto Aguadas Etapa 1	123.227.826,00	60.662.242,69	49,23%	2023	MEDIO	2
13	AGUADAS	ACUEDUCTO	Reposición acueducto Aguadas Etapa 2	429.667.412,00	0,00	0,00%	2024	ALTO	
14	AGUADAS	ALCANTARILLA DO	Reposición alcantarillado Aguadas Etapa 1	758.547.485,00	0,00	0,00%	2024	ALTO	
15	ANSERMA	ACUEDUCTO	Obras de Reposición acueducto Anserma Etapa 4	116.411.641,00	60.879.112,23	52,30%	2022	MEDIO	2
16	ANSERMA	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Anserma 1	1.651.096.034,00	0,00	0,00%	2024	ALTO	
17	ANSERMA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Anserma Etapa 1	199.746.868,00	0,00	0,00%	2022	ALTO	
18	ANSERMA	ALCANTARILLA DO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Anserma Etapa 1	153.273.264,00	136.637.814,24	89,15%	2022	BAJO	3
19	ANSERMA	ACUEDUCTO	Reposición acueducto Anserma Etapa 1	67.408.060,00	0,00	0,00%	2022	ALTO	
20	ANSERMA	ACUEDUCTO	Mejoramiento del sistema eléctrico de la planta	20.000.000,00	0,00	0,00%	2023	ALTO	



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



PRIMERO LA GENTE

f Empocaldas **@empocaldas_oficial**
✉ empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co

21	ANSERMA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Anserma Etapa 2	127.929.250,00	0,00	0,00%	2024	ALTO
22	ANSERMA	ALCANTARILLA DO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Anserma Etapa 2	177.211.685,00	0,00	0,00%	2024	ALTO
23	ANSERMA	ACUEDUCTO	Reposición acueducto Anserma Etapa 2	187.452.594,00	0,00	0,00%	2024	ALTO
24	ANSERMA	ALCANTARILLA DO	Reposición alcantarillado Anserma Etapa 1	277.341.775,00	0,00	0,00%	2024	ALTO
25	ARAUCA	ALCANTARILLA DO	Obras de Reparación alcantarillado Arauca Etapa 1	171.916.088,00	130.754.405,33	76,06%	2022	MEDIO 2
26	ARAUCA	ALCANTARILLA DO	Obras de Reparación alcantarillado Arauca Etapa 2	266.971.085,00	0,00	0,00%	2027	ALTO
27	ARAUCA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización aducción Arauca	132.385.865,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
28	ARAUCA	ALCANTARILLA DO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Arauca	86.627.502,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
29	ARMA	ACUEDUCTO	Reposición de acueducto en la conducción Aguadas Arma	115.228.703,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
30	ARMA	ACUEDUCTO	Mejoramiento del acueducto de Arma	9.161.596,00	0,00	0,00%	2024	ALTO
31	ARMA	ALCANTARILLA DO	Mejoramiento del alcantarillado de Arma	24.081.297,00	0,00	0,00%	2029	ALTO
32	ARMA	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Arma Etapa 1	366.673.594,00	3.070.561,92	0,84%	2022	ALTO
33	ARMA	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Arma Etapa 2	366.673.594,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
34	ARMA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Arma	45.600.942,00	0,00	0,00%	2023	ALTO
35	ARMA	ALCANTARILLA DO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Arma	81.140.357,00	64.630.564,50	79,65%	2023	MEDIO 2
36	BELALCAZAR	ALCANTARILLA DO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Belalcazar Etapa 1	93.563.764,00	0,00	0,00%	2023	ALTO
37	BELALCAZAR	ALCANTARILLA DO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Belalcazar Etapa 2	273.545.343,00	0,00	0,00%	2024	ALTO
38	BELALCAZAR	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Belalcazar Etapa 1	254.256.916,00	0,00	0,00%	2023	ALTO
39	BELALCAZAR	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Belalcazar Etapa 2	508.513.831,00	0,00	0,00%	2025	ALTO
40	BELALCAZAR	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Belalcazar Etapa 3	508.513.831,00	0,00	0,00%	2027	ALTO
41	BELALCAZAR	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Belalcazar Etapa 4	508.513.831,00	0,00	0,00%	2029	ALTO
42	BELALCAZAR	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Belalcazar Etapa 5	508.513.831,00	0,00	0,00%	2031	ALTO
43	CHINCHINA	ACUEDUCTO	Obras de Expansión acueducto Chinchiná Etapa 2	1.291.686.396,00	63.879.154,18	4,95%	2022	ALTO
44	CHINCHINA	ACUEDUCTO	Obras de Reparación acueducto Chinchiná Etapa 2	130.005.950,00	68.887.673,24	52,99%	2022	MEDIO 2
45	CHINCHINA	ACUEDUCTO	Obras de Reparación acueducto Chinchiná Etapa 3	143.409.951,27	0,00	0,00%	2022	ALTO



Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS
PRIMERO
LA GENTE

f Empocaldas **@** empocaldas_oficial
✉ empocaldas@empocaldas.com.co
🌐 www.empocaldas.com.co

46	CHINCHIN A	ACUEDUCTO	Obras de Reparación acueducto Chinchiná Etapa 4	143.409.951,27	0,00	0,00%	2023	ALTO
47	CHINCHIN A	ALCANTARILLA DO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Chinchiná Etapa 1	500.472.042,28	226.181.344,99	45,19%	2022	ALTO
48	CHINCHIN A	ALCANTARILLA DO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Chinchiná Etapa 2	167.828.118,00	0,00	0,00%	2023	ALTO
49	CHINCHIN A	ALCANTARILLA DO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Chinchiná Etapa 3	264.624.117,00	0,00	0,00%	2024	ALTO
50	CHINCHIN A	ACUEDUCTO	Mejoramiento acueducto Chinchiná	215.487.987,00	211.964.763,10	98,37%	2022	BAJO
51	CHINCHIN A	ALCANTARILLA DO	Reposición alcantarillado Chinchiná	282.011.542,13	0,00	0,00%	2022	ALTO
52	CHINCHIN A	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Chinchiná Etapa 1	300.000.000,00	0,00	0,00%	2025	ALTO
53	CHINCHIN A	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Chinchiná Etapa 2	500.000.000,00	0,00	0,00%	2030	ALTO
54	CHINCHIN A	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Chinchiná Etapa 3	500.000.000,00	0,00	0,00%	2032	ALTO
55	CHINCHIN A	ACUEDUCTO	Construcción Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP Campoalegre	2.150.221.884,00	0,00	0,00%	2027	ALTO
56	CHINCHIN A	ACUEDUCTO	Construcción Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP Los Cuervos	1.499.599.423,00	0,00	0,00%	2024	ALTO
57	FILADELFI A	ACUEDUCTO	Mejoramiento del acueducto de Filadelfia Etapa 1 Tanque	823.500.887,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
58	FILADELFI A	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Filadelfia	35.299.274,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
59	FILADELFI A	ACUEDUCTO	Mejoramiento de la aducción en el municipio de Filadelfia	188.570.653,00	5.374.062,52	2,85%	2022	ALTO
60	FILADELFI A	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Filadelfia	10.688.757,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
61	FILADELFI A	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Filadelfia Etapa 1	613.587.934,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
62	FILADELFI A	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Filadelfia Etapa 2	613.587.934,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
63	FILADELFI A	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Filadelfia Etapa 3	808.190.179,00	0,00	0,00%	2027	ALTO
64	FILADELFI A	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Filadelfia Etapa 4	610.404.301,00	0,00	0,00%	2028	ALTO
65	GUARINO CITO	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Guarinocito Etapa 1	473.208.227,00	0,00	0,00%	2023	ALTO
66	GUARINO CITO	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Guarinocito Etapa 1	650.008.155,91	0,00	0,00%	2024	ALTO
67	KILOMETR O 41	ACUEDUCTO	Obras de Optimización de Acueducto Kilometro 41 Fase I 1	63.385.570,00	22.761.840,87	35,91%	2022	ALTO
68	KILOMETR O 41	ACUEDUCTO	Obras de Optimización de Acueducto Kilometro 41 Fase I 2	441.258.071,00	0,00	0,00%	2024	ALTO



Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales - Caldas
PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar

Gobierno de CALDAS

PRIMERO LA GENTE

f Empocaldas **@empocaldas_oficial**
✉ empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co

69	KILOMETR O41	ALCANTARILLA DO	Obras de Reposición alcantarillado Kilometro 41 Etapa 1	86.045.971,00	22.761.840,87	26,45%	2022	ALTO
70	KILOMETR O41	ALCANTARILLA DO	Obras de Reposición alcantarillado Kilometro 41 Etapa 2	581.191.073,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
71	KILOMETR O41	ALCANTARILLA DO	Obras de Reposición alcantarillado Kilometro 41 Etapa 3	86.045.971,00	0,00	0,00%	2026	ALTO
72	KILOMETR O41	ALCANTARILLA DO	Obras de Reposición alcantarillado Kilometro 41 Etapa 4	86.045.971,00	0,00	0,00%	2027	ALTO
73	LA DORADA	ACUEDUCTO	Obras de Rehabilitación acueducto La Dorada 2	166.262.884,00	0,00	0,00%	2023	ALTO
74	LA DORADA	ALCANTARILLA DO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 4	93.335.392,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
75	LA DORADA	ALCANTARILLA DO	Optimización redes alcantarillado barrio las ferias	4.378.352.204,00	0,00	0,00%	2026	ALTO
76	LA DORADA	ALCANTARILLA DO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 5	100.391.500,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
77	LA DORADA	ALCANTARILLA DO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 6	72.025.045,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
78	LA DORADA	ALCANTARILLA DO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 7	100.132.058,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
79	LA DORADA	ALCANTARILLA DO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 8	93.335.392,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
80	LA DORADA	ALCANTARILLA DO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 9	90.178.574,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
81	LA DORADA	ALCANTARILLA DO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 10	154.572.766,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
82	LA DORADA	ALCANTARILLA DO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 11	172.091.942,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
83	LA DORADA	ALCANTARILLA DO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 12	172.091.942,00	0,00	0,00%	2023	ALTO
84	LA DORADA	ALCANTARILLA DO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 13	172.091.942,00	0,00	0,00%	2024	ALTO
85	LA DORADA	ALCANTARILLA DO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 14	172.091.942,00	0,00	0,00%	2025	ALTO
86	LA DORADA	ALCANTARILLA DO	Obras de Rehabilitación alcantarillado La Dorada 1	232.087.840,00	0,00	0,00%	2026	ALTO
87	LA DORADA	ALCANTARILLA DO	Obras de Rehabilitación alcantarillado La Dorada 2	232.087.840,00	0,00	0,00%	2027	ALTO
88	LA DORADA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto La Dorada Etapa 1	281.078.965,00	57.260.087,55	20,37%	2022	ALTO
89	LA DORADA	ACUEDUCTO	Mejoramiento tanque de almacenamiento sector la Melissa	600.000.000,00	0,00	0,00%	2023	ALTO
90	LA DORADA	ALCANTARILLA DO	Mejoramiento y optimización alcantarillado La Dorada Etapa 1	511.790.628,00	97.093.439,79	18,97%	2022	ALTO
91	LA DORADA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto La Dorada Etapa 2	938.461.280,00	0,00	0,00%	2023	ALTO



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS
PRIMERO
LA GENTE

f Empocaldas **@** empocaldas_oficial
✉ empocaldas.com.co
globe www.empocaldas.com.co

92	LA DORADA	ALCANTARILLA DO	Mejoramiento y optimización alcantarillado La Dorada Etapa 2	1.253.667.331,00	0,00	0,00%	2023	ALTO
93	LA DORADA	ALCANTARILLA DO	Mejoramiento y optimización alcantarillado La Dorada Etapa 3	251.821.765,41	0,00	0,00%	2024	ALTO
94	LA DORADA	ACUEDUCTO	Construcción Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP EI Llano	2.150.221.884,00	0,00	0,00%	2024	ALTO
95	LA DORADA	ALCANTARILLA DO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 15	506.687.941,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
96	LA DORADA	ALCANTARILLA DO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 16	506.687.941,00	0,00	0,00%	2025	ALTO
97	LA DORADA	ALCANTARILLA DO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 17	506.687.941,00	0,00	0,00%	2028	ALTO
98	LA DORADA	ALCANTARILLA DO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 18	506.687.941,00	0,00	0,00%	2032	ALTO
99	LA DORADA	ALCANTARILLA DO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 19	1.184.900.140,00	0,00	0,00%	2023	ALTO
100	LA DORADA	ALCANTARILLA DO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 20	1.184.900.140,00	0,00	0,00%	2026	ALTO
101	LA DORADA	ALCANTARILLA DO	Obras de Reposición alcantarillado La Dorada 21	1.184.900.140,00	0,00	0,00%	2030	ALTO
102	MANZANA RES	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Manzanares	16.322.262,00	12.375.637,25	75,82%	2022	MEDIO
103	MANZANA RES	ACUEDUCTO	Estabilización y protección de tuberías del acueducto de Manzanares	27.775.826,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
104	MANZANA RES	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Manzanares	49.592.582,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
105	MANZANA RES	ACUEDUCTO	Mejoramiento del cerramiento del Tanque de Manzanares	56.901.438,00	0,00	0,00%	2023	ALTO
106	MANZANA RES	ACUEDUCTO	Mejoramiento de las aducciones en el municipio de Manzanares	253.066.767,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
107	MANZANA RES	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Manzanares	1.857.808,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
108	MANZANA RES	ACUEDUCTO	Construcción de canal para recoger el sobrante de la PTAP de Manzanares	131.397.257,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
109	MANZANA RES	ALCANTARILLA DO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Manzanares	363.280.316,00	0,00	0,00%	2023	ALTO
110	MANZANA RES	ALCANTARILLA DO	Reposición y optimización de redes de alcantarillado en Manzanares	205.795.414,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
111	MANZANA RES	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Manzanares Etapa 1	371.039.818,00	0,00	0,00%	2027	ALTO
112	MANZANA RES	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Manzanares Etapa 2	371.039.818,00	0,00	0,00%	2029	ALTO
113	MANZANA RES	ACUEDUCTO	Mejoramiento aducciones Manzanares Etapa 2	69.837.521,00	17.083.596,15	24,48%	2022	ALTO
114	MANZANA RES	ALCANTARILLA DO	Mejoramiento descole planta Manzanares	151.276.485,40	0,00	0,00%	2022	ALTO



empocaldas
Contribuyendo juntos tu bienestar



PRIMERO LA GENTE

f Empocaldas **@empocaldas_oficial**
✉ empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co

115	MANZANA RES	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización planta Manzanares	298.000.000,00	2.751.542,89	0,92%	2023	ALTO
116	MANZANA RES	ACUEDUCTO	Mejoramiento aducciones Manzanares Etapa 3	63.822.133,20	0,00	0,00%	2023	ALTO
117	MANZANA RES	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Manzanares	25.387.627,00	0,00	0,00%	2023	ALTO
118	MANZANA RES	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Manzanares	285.092.887,95	0,00	0,00%	2023	ALTO
119	MARQUETALIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Marquetalia	26.562.533,00	0,00	0,00%	2025	ALTO
120	MARQUETALIA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Marquetalia	49.592.582,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
121	MARQUETALIA	ACUEDUCTO	Reposición de redes en la aducción San Juan de Marquetalia	277.797.376,00	53.412.550,15	19,23%	2025	ALTO
122	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 1	347.781.068,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
123	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 2	179.268.592,00	0,00	0,00%	2023	ALTO
124	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 3	288.024.871,00	0,00	0,00%	2024	ALTO
125	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 4	143.414.874,00	0,00	0,00%	2025	ALTO
126	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 5	179.268.592,00	0,00	0,00%	2026	ALTO
127	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 6	239.024.789,00	0,00	0,00%	2027	ALTO
128	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 7	203.171.071,00	0,00	0,00%	2028	ALTO
129	MARQUETALIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Marquetalia	250.400.865,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
130	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Marquetalia	450.510.879,86	82.388.368,30	18,29%	2023	ALTO
131	MARULANDA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Marulanda	35.299.274,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
132	MARULANDA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marulanda Etapa 1	362.750.342,00	64.284.366,51	17,72%	2022	ALTO
133	MARULANDA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marulanda Etapa 2	362.750.342,00	0,00	0,00%	2023	ALTO
134	MARULANDA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marulanda Etapa 3	285.932.261,00	0,00	0,00%	2025	ALTO
135	MARULANDA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marulanda Etapa 4	288.107.342,00	0,00	0,00%	2027	ALTO
136	MARULANDA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marulanda Etapa 5	263.463.026,00	0,00	0,00%	2029	ALTO
137	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 1	136.781.836,00	6.385.718,92	4,67%	2022	ALTO
138	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 2	136.781.836,00	0,00	0,00%	2022	ALTO

9 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales - Caldas
PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9



empocaldas
Construyendo Juntos tu bienestar



PRIMERO LA GENTE

f Empocaldas **@** empocaldas_oficial

✉ empocaldas@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

139	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 3	136.781.836,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
140	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 4	136.781.836,00	0,00	0,00%	2023	ALTO
141	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 5	136.781.836,00	0,00	0,00%	2024	ALTO
142	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 6	136.781.836,00	0,00	0,00%	2025	ALTO
143	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 7	136.781.836,00	0,00	0,00%	2026	ALTO
144	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 8	136.781.836,00	0,00	0,00%	2027	ALTO
145	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 9	136.781.836,00	0,00	0,00%	2028	ALTO
146	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 10	136.781.836,00	0,00	0,00%	2029	ALTO
147	NEIRA	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Neira	17.102.012,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
148	NEIRA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Neira	58.688.324,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
149	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Neira	2.506.184,00	0,00	0,00%	2023	ALTO
150	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Neira - Tanque	690.264.822,00	0,00	0,00%	2029	ALTO
151	NEIRA	ALCANTARILLA DO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 1	35.261.341,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
152	NEIRA	ALCANTARILLA DO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 2	70.047.943,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
153	NEIRA	ALCANTARILLA DO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 3	246.668.383,00	0,00	0,00%	2024	ALTO
154	NEIRA	ALCANTARILLA DO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 4	246.668.383,00	0,00	0,00%	2026	ALTO
155	NEIRA	ALCANTARILLA DO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 5	246.668.383,00	0,00	0,00%	2028	ALTO
156	NEIRA	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Neira Etapa 1	320.078.542,00	0,00	0,00%	2027	ALTO
157	NEIRA	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Neira Etapa 2	320.078.542,00	0,00	0,00%	2029	ALTO
158	NEIRA	ALCANTARILLA DO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Neira Etapa 1	122.339.025,40	72.618.744,26	59,36%	2022	MEDIO
159	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición acueducto Neira Etapa 1	107.277.583,71	36.717.154,55	34,23%	2022	ALTO
160	NEIRA	ALCANTARILLA DO	Reposición alcantarillado Neira Etapa	159.567.042,00	0,00	0,00%	2024	ALTO
161	NEIRA	ACUEDUCTO	Construcción Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP Neira	1.400.204.895,00	0,00	0,00%	2025	ALTO
162	PALESTIN A	ACUEDUCTO	Obras de Reposición acueducto Palestina Etapa 2	4.936.459,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
163	PALESTIN A	ACUEDUCTO	Obras de Expansión acueducto Palestina	234.801.636,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
164	PALESTIN A	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Palestina	256.333.765,00	0,00	0,00%	2022	ALTO



Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales - Caldas
PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



PRIMERO LA GENTE

Empocaldas @empocaldas_oficial
empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co

165	PALESTIN A	ACUEDUCTO	Mejoramiento tanque elevado Palestina	150.000.000,00	0,00	0,00%	2023	ALTO
166	PALESTIN A	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Palestina Etapa 1	200.000.000,00	3.070.561,92	1,54%	2030	ALTO
167	PALESTIN A	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Palestina Etapa 2	200.000.000,00	0,00	0,00%	2032	ALTO
168	RIOSUCIO	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Riosucio Etapa 1	1.361.408.503,00	0,00	0,00%	2025	ALTO
169	RIOSUCIO	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Riosucio Etapa 2	1.505.800.751,00	0,00	0,00%	2023	ALTO
170	RIOSUCIO	ALCANTARILLA DO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Riosucio Etapa 1	83.712.271,00	31.393.330,05	37,50%	2022	ALTO
171	RIOSUCIO	ALCANTARILLA DO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Riosucio Etapa 2	178.556.270,00	0,00	0,00%	2023	ALTO
172	RIOSUCIO	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Riosucio	73.048.945,00	4.785.353,78	6,55%	2024	ALTO
173	RIOSUCIO	ALCANTARILLA DO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Riosucio Etapa 3	380.359.902,00	0,00	0,00%	2024	ALTO
174	RIOSUCIO	ACUEDUCTO	Reposición acueducto Riosucio	80.005.092,00	0,00	0,00%	2024	ALTO
175	RISARALD A	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Risaralda	547.801.834,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
176	RISARALD A	ALCANTARILLA DO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Risaralda Etapa 1	104.062.039,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
177	RISARALD A	ALCANTARILLA DO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Risaralda Etapa 2	218.532.736,00	0,00	0,00%	2023	ALTO
178	SALAMINA	ACUEDUCTO	Rehabilitación de la aducción El Uvito de Salamina	218.082.740,00	97.215.043,16	44,58%	2022	ALTO
179	SALAMINA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Salamina	49.592.582,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
180	SALAMINA	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 1	383.408.649,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
181	SALAMINA	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 2	383.408.649,13	0,00	0,00%	2022	ALTO
182	SALAMINA	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 3	383.408.649,13	0,00	0,00%	2024	ALTO
183	SALAMINA	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 4	383.408.649,13	0,00	0,00%	2026	ALTO
184	SALAMINA	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 5	383.408.649,13	0,00	0,00%	2028	ALTO
185	SALAMINA	ACUEDUCTO	Reposición acueducto Salamina	52.148.789,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
186	SALAMINA	ALCANTARILLA DO	Reposición alcantarillado Salamina	90.568.087,73	89.941.753,62	99,31%	2022	BAJO
187	SALAMINA	ACUEDUCTO	Mejoramiento planta Salamina	93.912.483,00	0,00	0,00%	2023	ALTO
188	SALAMINA	ACUEDUCTO	Construcción Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP Salamina	1.137.991.563,00	0,00	0,00%	2023	ALTO
189	SAMANA	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Samana	108.497.611,32	0,00	0,00%	2029	ALTO



Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales - Caldas
PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9





empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



PRIMERO LA GENTE

f Empocaldas **@** empocaldas_oficial
✉ empocaldas@empocaldas.com.co
🌐 www.empocaldas.com.co

190	SAMANA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Samana	49.592.582,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
191	SAMANA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Samana	42.680.667,24	0,00	0,00%	2023	ALTO
192	SAMANA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Samana - Tanque	441.625.275,63	0,00	0,00%	2026	ALTO
193	SAMANA	ALCANTARILLA DO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Samana Etapa 2	115.330.624,37	0,00	0,00%	2025	ALTO
194	SAMANA	ALCANTARILLA DO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Samana Etapa 3	178.618.572,85	0,00	0,00%	2027	ALTO
195	SAMANA	ALCANTARILLA DO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Samana Etapa 4	178.618.571,72	0,00	0,00%	2029	ALTO
196	SAMANA	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Samana Etapa 1	303.154.974,00	3.070.561,92	1,01%	2022	ALTO
197	SAMANA	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Samana Etapa 2	303.154.974,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
198	SAMANA	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Samana Etapa 3	303.154.974,37	0,00	0,00%	2022	ALTO
199	SAMANA	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Samana Etapa 4	303.154.974,37	0,00	0,00%	2023	ALTO
200	SAMANA	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Samana Etapa 5	303.154.974,37	0,00	0,00%	2024	ALTO
201	SAMANA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Samana Etapa 1	232.685.372,76	19.763.900,99	8,49%	2022	ALTO
202	SAMANA	ACUEDUCTO	Mejoramiento eléctrico planta Samana	20.000.000,00	0,00	0,00%	2023	ALTO
203	SAMANA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Samana Etapa 2	127.456.111,80	19.763.900,99	15,51%	2023	ALTO
204	SAMANA	ALCANTARILLA DO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Samana Etapa 2	201.111.260,57	0,00	0,00%	2023	ALTO
205	SAMANA	ACUEDUCTO	Constitución Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP Samana	1.400.204.895,00	0,00	0,00%	2024	ALTO
206	SAN JOSE	ACUEDUCTO	Mejoramiento planta San Jose	34.895.427,02	2.751.542,89	7,89%	2023	ALTO
207	SAN JOSE	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de San Jose	269.812.561,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
208	SUPIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Supia	37.410.651,00	0,00	0,00%	2025	ALTO
209	SUPIA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Supia	71.682.241,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
210	SUPIA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Supia Etapa 3	105.146.403,00	0,00	0,00%	2025	ALTO
211	SUPIA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Supia Etapa 4	135.201.153,00	0,00	0,00%	2027	ALTO
212	SUPIA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Supia Etapa 5	135.201.153,00	0,00	0,00%	2029	ALTO
213	SUPIA	ALCANTARILLA DO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Supia Etapa 2	246.684.116,00	160.953.294,50	65,25%	2022	MEDIO
214	SUPIA	ALCANTARILLA DO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Supia Etapa 3	80.165.680,00	0,00	0,00%	2024	ALTO



Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales - Caldas
PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9



empocaldas
construyendo juntos tu bienestar



PRIMERO LA GENTE

f Empocaldas **@empocaldas_oficial**
✉ empo@empocaldas.com.co
🌐 www.empocaldas.com.co

215	SUPIA	ALCANTARILLA DO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Supia Etapa 4	320.545.733,00	0,00	0,00%	2026	ALTO
216	SUPIA	ALCANTARILLA DO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Supia Etapa 5	302.882.830,00	0,00	0,00%	2029	ALTO
217	SUPIA	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 1	408.730.202,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
218	SUPIA	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 2	411.468.808,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
219	SUPIA	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 3	411.468.808,00	0,00	0,00%	2023	ALTO
220	SUPIA	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 4	411.468.808,00	0,00	0,00%	2023	ALTO
221	SUPIA	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 5	411.468.808,00	0,00	0,00%	2024	ALTO
222	SUPIA	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 6	260.439.847,00	0,00	0,00%	2025	ALTO
223	SUPIA	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 7	260.439.847,00	0,00	0,00%	2026	ALTO
224	SUPIA	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 8	260.439.847,00	0,00	0,00%	2027	ALTO
225	SUPIA	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 9	260.439.847,00	0,00	0,00%	2028	ALTO
226	SUPIA	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 10	260.439.847,00	0,00	0,00%	2029	ALTO
227	SUPIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Supia Etapa 1	212.338.153,00	165.778.464,28	78,07%	2023	MEDIO
228	SUPIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Supia Etapa 2	50.649.000,00	0,00	0,00%	2024	ALTO
229	SUPIA	ALCANTARILLA DO	Reposición alcantarillado Supia	79.804.831,00	0,00	0,00%	2024	ALTO
230	VICTORIA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducción Doña Juana de Victoria Etapa 1	197.816.476,00	0,00	0,00%	2023	ALTO
231	VICTORIA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducción Doña Juana de Victoria Etapa 2	267.850.661,00	0,00	0,00%	2027	ALTO
232	VICTORIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Victoria	29.928.521,00	0,00	0,00%	2023	ALTO
233	VICTORIA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Victoria	49.592.582,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
234	VICTORIA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Victoria Etapa 1 Tanque	299.977.076,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
235	VICTORIA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Victoria Etapa 2	77.886.539,00	14.564.715,23	18,70%	2022	ALTO
236	VICTORIA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Victoria Etapa 3	113.921.627,00	0,00	0,00%	2023	ALTO
237	VICTORIA	ALCANTARILLA DO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Victoria Etapa 2	35.588.255,00	0,00	0,00%	2024	ALTO
238	VICTORIA	ALCANTARILLA DO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Victoria Etapa 3	197.445.270,00	0,00	0,00%	2025	ALTO



Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales - Caldas
PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9





empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar

Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

f Empocaldas **@empocaldas_oficial**
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co

239	VICTORIA	ALCANTARILLA DO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Victoria Etapa 4	319.880.489,00	0,00	0,00%	2027	ALTO
240	VICTORIA	ALCANTARILLA DO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Victoria Etapa 5	197.445.270,00	0,00	0,00%	2029	ALTO
241	VICTORIA	ALCANTARILLA DO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Victoria	315.415.371,00	14.564.715,23	4,62%	2022	ALTO
242	VICTORIA	ALCANTARILLA DO	Mejoramiento y optimización PTAR Victoria	396.778.215,00	0,00	0,00%	2023	ALTO
243	VICTORIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización aducción Victoria	31.183.524,00	0,00	0,00%	2023	ALTO
244	VICTORIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Victoria	26.812.117,12	0,00	0,00%	2023	ALTO
245	VITERBO	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Viterbo	53.443.787,00	0,00	0,00%	2023	ALTO
246	VITERBO	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Viterbo	71.682.241,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
247	VITERBO	ACUEDUCTO	Construcción acueducto nueva fuente de abastecimiento Viterbo	1.589.447.222,00	0,00	0,00%	2028	ALTO
248	VITERBO	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Viterbo Etapa 1	160.455.207,00	0,00	0,00%	2024	ALTO
249	VITERBO	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Viterbo Etapa 2	284.276.456,00	0,00	0,00%	2025	ALTO
250	VITERBO	ALCANTARILLA DO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 1	202.355.647,00	3.445.852,81	1,70%	2023	ALTO
251	VITERBO	ALCANTARILLA DO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 2	236.475.782,00	0,00	0,00%	2024	ALTO
252	VITERBO	ALCANTARILLA DO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 3	236.475.782,00	0,00	0,00%	2025	ALTO
253	VITERBO	ALCANTARILLA DO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 4	236.475.782,00	0,00	0,00%	2026	ALTO
254	VITERBO	ALCANTARILLA DO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 5	236.475.782,00	0,00	0,00%	2029	ALTO
255	VITERBO	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 1	356.808.640,00	0,00	0,00%	2022	ALTO
256	VITERBO	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 2	356.808.640,00	0,00	0,00%	2024	ALTO
257	VITERBO	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 3	356.808.640,00	0,00	0,00%	2027	ALTO
258	VITERBO	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 4	356.808.640,00	0,00	0,00%	2028	ALTO
259	VITERBO	ALCANTARILLA DO	Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 5	356.808.640,00	0,00	0,00%	2029	ALTO
260	VITERBO	ACUEDUCTO	Mejoramiento acueducto Viterbo	145.789.451,00	0,00	0,00%	2024	ALTO
261	VITERBO	ALCANTARILLA DO	Mejoramiento alcantarillado Viterbo	152.716.057,00	0,00	0,00%	2024	ALTO
262	VITERBO	ACUEDUCTO	Obras protección en Bocatoma de Viterbo	24.943.000,00	0,00	0,00%	2024	ALTO



Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales - Caldas
PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

PRIMERO
LA GENTE

f Empocaldas @empocaldas_oficial
✉ empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co

TOTAL	83.236.725.561,77	2.306.345.404,60	2,77%
-------	-------------------	------------------	-------

Nota: Todas las actuaciones expuestas anteriormente se encuentran ajustadas a las actividades encomendadas

Cordialmente,


IVÁN MATEO MUÑOZ MARTÍNEZ
 C.C: 1.053.856.851 de Manizales Caldas
 Contratista



Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales - Caldas



PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

