	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-22 Versión 11 2022-08-03
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA		

# CONTRATO Y AÑO	ACTO NUMERO 004 CON FECHA 16 DE ENERO DEL 2023	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	11.236.225
				2. VALOR ADICION	0
CONTRATISTA	JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO			3. VALOR TOTAL (1+2)	11.236.225
NIT O CC:	1.057.304.693			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	# 0002 DEL 18 DE ENERO DE 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	11.236.225
RP (#, rubro y fecha)	# 169 DEL 18 DE ENERO DE 2023			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	0
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN CHAMBERY SECTOR PLAN DE LOS OCAMPOS EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA CALDAS				
TIPO DE RECURSOS	RECURSOS PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.		N/A
3- Pagos al FIC	X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Informe de actividades o Bitácora.	X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
8- Ensayos de densidad.		N/A
9- Diseño de Mezclas.		N/A
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.		N/A
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	X	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51		N/A
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)		N/A
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	X	
15- Acta parcial o final del contrato.	X	
16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


Andrés Felipe Giraldo B.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Andrés G.  
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Factura original o Documento equivalente	X
Acta parcial o final del contrato.	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación


20/02/23

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO DE ZONA	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
N° 086000714856	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

20/02/23  
8/1/20



	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-22 Versión 11 2022-08-03
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA		

# CONTRATO Y AÑO	ACTO NUMERO 004 CON FECHA 16 DE ENERO DEL 2023	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	11.236.225
				2. VALOR ADICION	0
CONTRATISTA	JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO			3. VALOR TOTAL (1+2)	11.236.225
NIT O CC:	1.057.304.693			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	# 0002 DEL 18 DE ENERO DE 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	11.236.225
RP (#, rubro y fecha)	# 169 DEL 18 DE ENERO DE 2023			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	0
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN CHAMBERY SECTOR PLAN DE LOS OCAMPOS EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA CALDAS				
TIPO DE RECURSOS	RECURSOS PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	N/A	
3- Pagos al FIC	X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Informe de actividades o Bitácora.	X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
8- Ensayos de densidad.	N/A	
9- Diseño de Mezclas	N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	X	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	N/A	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	X	
15- Acta parcial o final del contrato.	X	
16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


Andrés Felipe Giraldo R.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Andrés G.  
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		# FOLIOS
Factura original o Documento equivalente	X	
Acta parcial o final del contrato.	X	
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X	
Copia del registro presupuestal	X	

Fecha de presentación

20/02/23

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO DE ZONA	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
N° 086000714856	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES  
LEGALES


ARTÍCULO 50 LEY 789 DE  
2002 (PERSONAS  
JURÍDICAS)

JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO, identificado con cédula de ciudadanía 1.057.304.693 de Filadelfia, en nombre propio, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

LINDA ROCIO HUERTAS MARTINEZ identificada con cédula de ciudadanía 52.881.426 y tarjeta profesional N° 267031- T, de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contadora de JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO identificado con C.C 1.057.304.693, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

En constancia, se firma en Manizales, a los 02 días del mes de febrero de 2023/

  
\_\_\_\_\_  
**JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO**  
C.C: 1.057.304.693

  
\_\_\_\_\_  
**LINDA ROCIO HUERTAS MARTINEZ**  
CONTADORA PUBLICA  
TP 267031-T



República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

267031-T

**LINDA ROCIO HUERTAS MARTINEZ**  
C.C. 52881429  
RES. INSCRIPCION 2071 DEL 23/12/2019  
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON




*[Signature]*  
**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**  
DIRECTOR GENERAL

286969 298860

Identificación Pábrica S.A. 180942/0119

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 C E 1 2 1 7 8 7 E 7 E 9 0 0 B

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LINDA ROCIO HUERTAS MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52881426 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 267031-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Octubre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado







**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Telefono	Exonerado SENAE e ICBF
CC 1057304693		RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO	carrera 24 # 30-28 apto 102	MANIZALES-CALDAS	8590841	SI

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Limite	Pago	Banco	Pago		Valor
										Dias Mora	Valor	
2023-01		1896483588		9446437575	E	2023/02/21		2023/02/02	BANCO DAVIVIENDA		0	\$3,175,000

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	\$1,628,200	\$0	\$0	\$1,628,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$24,800	\$0	\$0	\$24,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$272,100	\$0	\$0	\$272,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	\$1,141,400	\$0	\$0	\$1,141,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$189,900	\$0	\$0	\$189,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	\$719,800	\$0	\$0	\$719,800
ARL SUPA	14-11	890,903,790	5	18	\$719,800	\$0	\$0	\$719,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	\$413,500	\$0	\$0	\$413,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	18	\$413,500	\$0	\$0	\$413,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				18	\$413,500	\$0	\$0	\$413,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSG62	900,935,126	7	4	\$69,800	\$0	\$0	\$69,800
EPS SUPA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$15,500	\$0	\$0	\$15,500
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	\$297,300	\$0	\$0	\$297,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$30,900	\$0	\$0	\$30,900
<b>TOTAL</b>				<b>18</b>	<b>\$3,175,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$3,175,000</b>







NIT  
8999990341

Medio de Pago  
BANCO  
DAVIVIENDA

No. Transacción  
84261358

No. Autorización/CUS  
1897728328  
Fecha y Hora  
02/02/2023

**Número de Identificación**

1057304693

**Primer Apellido (si es Persona natural)**

RIOS PALACIO

**Dígito de Verificación (Si es persona**

Cédula de Ciudadanía

**Departamento**

CALDAS

**Dirección de Domicilio**

Calle 11A 8b-03

**Localización**

Nacional

**Correo electrónico**

riossebastian1990@gmail.com

**Regional**

Caldas

**Número Licencia de Obra**

**Nombre Obra**

REPARACION CONDUCCION CHAMBERY

**Fecha Terminación Obra**

24/01/2023

**Tipo FIC**

Costo Total de Obra (Sin Aportes)

**Mes Periodo a Pagar**

1

**Costo Total Mano de Obra**

3.00

**Valor Intereses Moratorios**

0.00

**Aporte SENA**

0.00

**Primer Nombre ó Razón Social**

JOHAN SEBASTIAN

**Tipo de documento**

03

**Naturaleza Jurídica**

03

**Ciudad Capital**

MANIZALES (CALDAS)

**Ciudad de Domicilio**

Manizales

**Teléfono de Contacto**

+57,312 7209638

**Código SIIF**

3-2-07-1-02-1-04-43

**Regional Centros SIIF**

36-02-00-017-000000

**Número Contrato de Obra**

004 DEL 16 ENERO 2023

**Fecha Inicio Obra**

16/01/2023

**Ciudad de Ejecución de la Obra**

FILADELFIA

**Año Periodo a Pagar**

2023

**Costo Total de Obra a Todo Costo**

11236225.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**

0

**Aporte FIC**

28091.00

**Valor del Pago**

28091.00

# COMPROBANTE

NIT: 8999990341 Medio de Pago: BANCO DAVIVIENDA No. Transacción: 84261358 No. Autorización/CUS: 1897728328 Fecha y Hora: 02/02/2023

Razón Social: SENA  
Usuario Pagador: 1057304693  
Descripción del Pago: Pago Ordinario - FIC  
Dirección IP: 186.146.81.29

Su transacción fue **APROBADA** por la Total Pagado **\$ 28,091.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 28,091.00	COP\$ 28,091.00





**JOHAN SEBASTIÁN RIOS PALACIO**

**Johan Sebastian Ríos Palacio**

NIT: 1057304693-8

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

CLL 11 A 8B 03, Villamaría, Caldas, Colombia

Tel. 3127209638

Email. riossebastian1990@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764041369144 válida desde 2022-12-15 hasta 2023-06-15 rango desde FE12 hasta FE25.

**Cliente:** EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.  
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUDIENDO  
EMPLEAR LA EXPRESION ABREVIADA EMPOCALDAS  
S.A E.S.P.  
**NIT:** 890803239  
**Dirección:** CR 23 75 82, Manzales, Caldas, Colombia  
**Teléfono:** 8867080  
**Email:** facturacionelectronica@empocaldas.com.co

**Tipo de negociación:** Contado  
**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria  
**Fecha de Pago:** 06/03/2023  
**Total de Lineas:** 3

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** FE19  
**MONEDA:** COP Colombia, Pesos  
**HORA EMISIÓN:** 11:07:55/  
**FECHA FIRMADO:** 06/02/2023 11:07:56/

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	02	2023	06	03	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1	REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN CHAMBERY SECTOR PLAN DE LOS OCAMPOS EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA CALDAS COSTO DIRECTO	C39	1,00	\$8.326.213,00		0,00	\$8.326.213,00
2	2	ADMINISTRACION 29%	C39	1,00	\$2.414.602,00		0,00	\$2.414.602,00
3	07	UTILIDAD 5%	C39	1,00	\$416.311,00	19,00	0,00	\$416.311,00


<b>Notas:</b>	<b>Subtotal:</b>	\$11.157.126,00
	<b>Cargos:</b>	\$0.00
	<b>Descuento:</b>	\$0.00
<b>SON:</b> (once millones doscientos treinta y seis mil doscientos veinticinco pesos ) <b>CUFE:</b> 9ba8e285525faf80fe91d8f090a5f31dcb40a824efceed3135ce3dd5fa69a236b7794900bc7ef910a18fc5b1f9179a4	<b>IVA:</b>	\$79.099,00
	<b>Total:</b>	\$11.236.225,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
<b>IMPUESTOS</b>			
01 IVA	\$416.311,00	19,00%	\$79.099,00

**Firma Digital:** G2LzsJmDhWfEh5q9pIT+5cpGJA4VFV57JjbyOoLL+oOQBIP6s1hBYJlUqxlGz gKoDEnLC+rtuhR+grY4C+MrqonncqUTuPtte8e0VGGzDzayude  
tOHRJUlo36oeex 4cftTXIMMfwdgJDMIEHKLZLFyCxbV2RnQ2WfIX5IA7LV15BnuMmhzCk97wbDVTc xCDreS5BUw1jDQj60oFTzr6x0W5WfNp73w  
2Swncn3CSeLvp61jVARa7zoYrGJU0 MKse1R2W1Nzo/VB8L8emBq90Ba+/yD7MkEuLQOge3J9j8l4fexmJX4kM3Nq9uNY KpnxZh+8ku15ixcZpg1  
3Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**





**INFORME DE OBRA N° 1 Y FINAL**

**CONTRATANTE**

**EMPOCALDAS S.A E.S.P**



**CONTRATISTA**

**JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO**

**SUPERVISOR**

**JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**

**MANIZALES, CALDAS**

**FEBRERO DE 2023**



**1 OBRA:**

El presente documento da cuenta de las actividades que desarrolló el Contratista de Obra **JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO** en el periodo comprendido entre el 16 de enero de 2023 - 24 de Enero de 2023, en el marco de la ejecución del contrato de obra cuyo objeto es **“REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN CHAMBERY SECTOR PLAN DE LOS OCAMPOS EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA CALDAS”**

**1.1 FICHA TECNICA**

CONTRATO:	ACTO NUMERO 004 CON FECHA 16 DE ENERO DEL 2023
MODALIDAD DE CONTRATACION	SOLICITUD DE UNICA OFERTA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMPOCALDAS S.A E.S.P R.L ANDRES FELIPE TABA ARROYABE
OBJETO :	REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN CHAMBERY SECTOR PLAN DE LOS OCAMPOS EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA CALDAS
CONTRATISTA:	JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
VALOR DEL CONTRATO:	ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTO VEINTI CINCO PESOS MCTE (\$11.236.225,00) INCLUIDO IVA Y AIU
VALOR PRESENTE ACTA:	ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTO VEINTI CINCO PESOS MCTE (\$11.236.225,00) INCLUIDO IVA Y AIU
FECHA DE INICIACION:	ENERO 16 DE 2023
FECHA FINALIZACION:	ENERO 24 DE 2023

**1.2 DESCRIPCION DEL OBJETO**

REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN CHAMBERY SECTOR PLAN DE LOS OCAMPOS EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA CALDAS

**1.3 LOCALIZACION DE LA OBRA**

Municipio de Filadelfia caldas conducción chambery.




**2. ACTIVIDADES REALIZADAS CON INFORME FOTOGRAFICO INCLUIDO:** En este tiempo de ejecución del contrato lo primero que se hizo fue el reconocimiento del sitio que se intervendrá en el presente contrato de obra.

A continuación, un resumen del estado en el que se encontraba el sitio y las obras que se realizaron con un registro fotográfico detallado.




### 1. INSTALACION DE TUBERIA POR TERMOFUSION

Lo primero fue hacer el trazado por donde iba a pasar la tubería para después unirlos por medio de termofusión para posteriormente comenzar con la excavación..

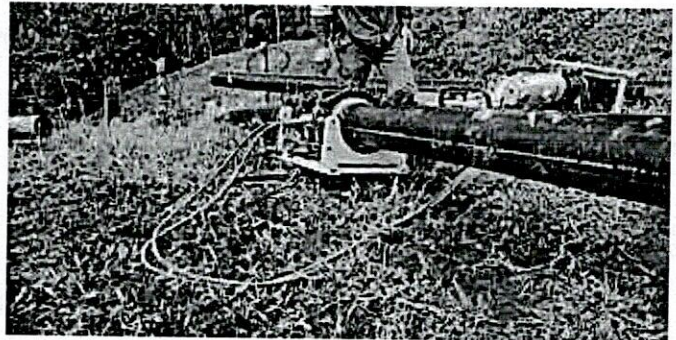
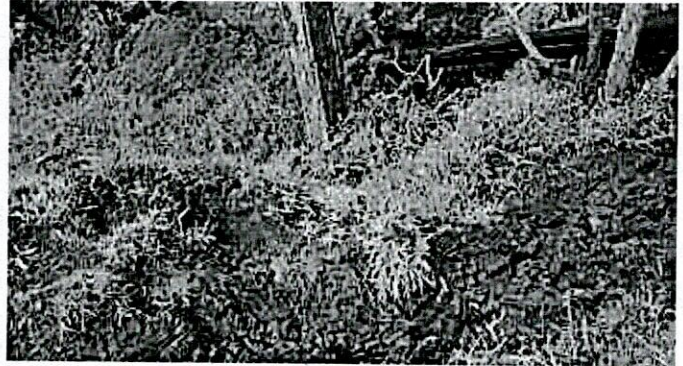
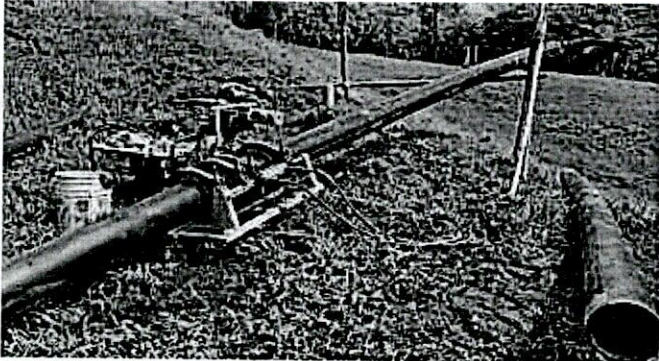


### 2. EXCAVACION

Se comienza con la excavación de la brecha para la reposición de la red de acueducto.







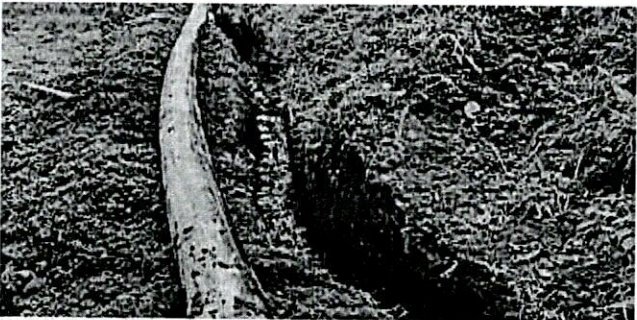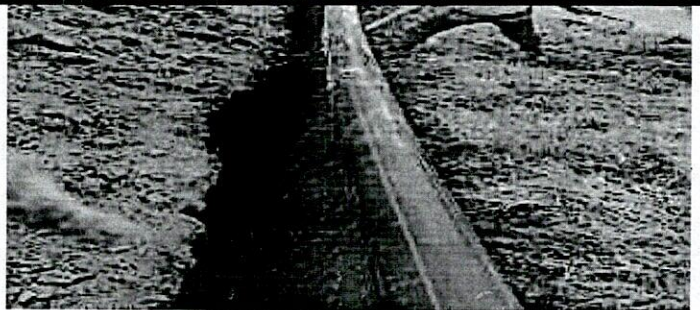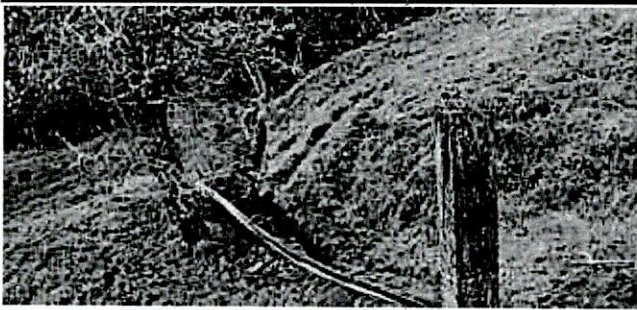


### 3. TRANSPORTE TUBERIA DE MARQUETALIA AL SITIO DE LA OBRA

Se llevo la tubería desde el municipio de marquetalia hasta el sitio de la obra en camioneta.

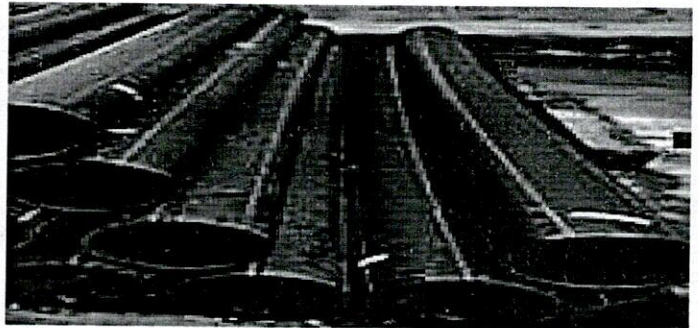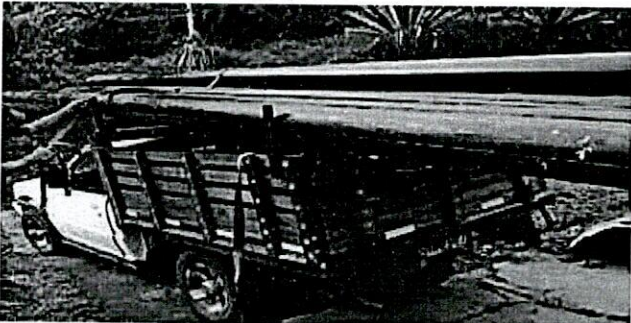


### 4. LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA EXCAVACION

Al terminar con la instalacion de la tubería dentro de la brecha se procedio a llenar con el material procedente de la excavación para dejar el sitio como estaba al empezar el trabajo.

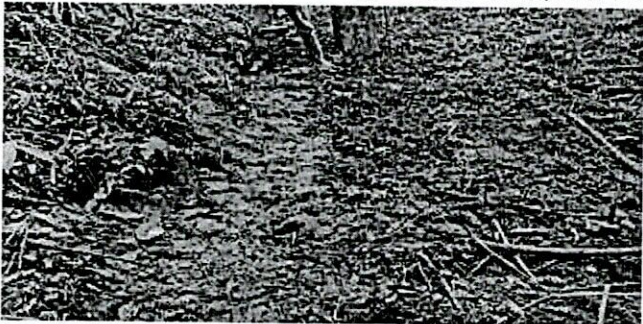






### 5. EMPALMES


Se empalmo la tubería en ambos lados a la tubería existente para proceder a reestablecer el servicio del agua.

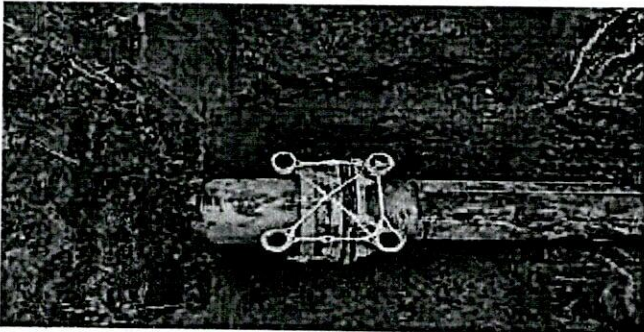



**6. RECUPERACION DE ACCESORIOS Y TUBERIA**

Se recupero un tramo de tubería y algunos accesorios que se encontraban en el sitio para ser reutilizados en futuras emergencias.

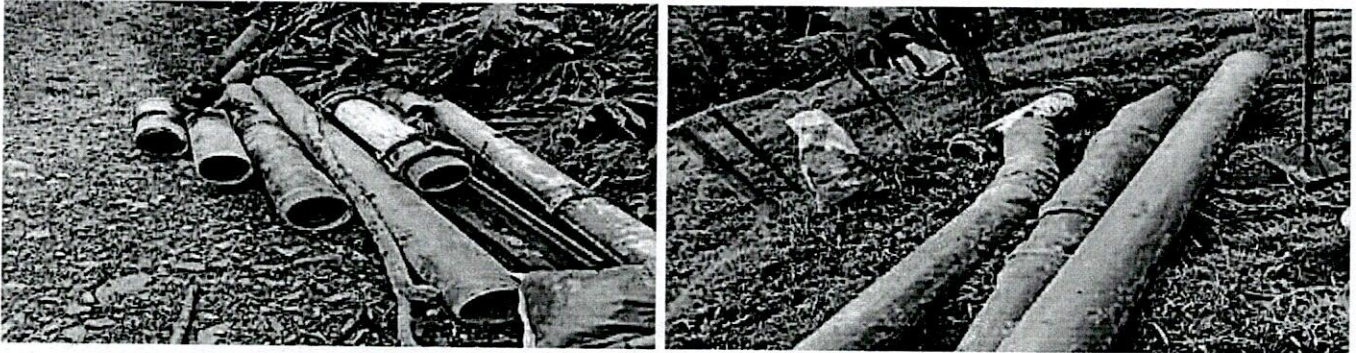

En el anterior registro fotográfico se evidencia cada una de las actividades que se realizaron para la primera acta y final en el contrato de obra cuyo objeto es el "REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN CHAMBERY SECTOR PLAN DE LOS OCAMPOS EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA CALDAS" Estas actividades fueron seguidas de cerca por el supervisor Juan Pablo Zuluaga Correa el cual aprobó cada una de estas.

  
JOHAN SEBASTIÁN RIOS PALACIO  
1.057.304.693 DE FILADELFIA  
CONTRATISTA





JUAN SEBASTIÁN RÍOS PALACIOS

### NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS Periodo del 01 de enero al 30 de enero de 2023

NOMBRE	CEDULA	CARGO	SALARIO	DIAS TRABAJADOS	SALARIO DEVENGADO	AUXILIO O DE PORTE	PRIMA 2 SEMESTRE	DESCUENTO A		TOTAL A PAGAR	FIRMA
								SALUD	PENSIÓN		
CARLOS ANDRÉS DIAZ HERNANDEZ	1017210868	AYUDANTE DE OBRERO	1.160.000	19	734.667	89.050	68.643	4,0%	29.400	902.638	CARLOS DIAZ
WILSON DUBAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	98697444	AYUDANTE DE OBRERO	1.160.000	15	580.000	70.303	52.044	4,0%	23.200	708.251	Wilson Rodriguez
MARIO LEON VILLA	75048202	AYUDANTE DE OBRERO	1.160.000	9	348.000	42.182	30.758	4,0%	13.900	423.989	Mario Leon Villa
<b>SUMAS TOTALES</b>					<b>1.662.667</b>	<b>201.535</b>	<b>151.444</b>		<b>66.500</b>	<b>2.034.878</b>	





**PLANILLA DE PAGO DE LIQUIDACIÓN**  
**FECHA: 01 AL 30 DE ENERO DE 2023**


PLANILLA DE LIQUIDACIONES RECIBIMOS VALORES A QUE SE REFIERE ESTA PLANILLA Y DECLARAMOS ESTAR A PAZ Y SALVO CON EL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE LIQUIDACIONES DE TRABAJO DIARIO, HORAS EXTRAS, DESCANSO DOMINICAL Y FESTIVOS DUARANTE EL DESARROLLO DE NUESTRO TRABAJO EN LA OBRA

HOMBRE	CEDULA	CARGO	BALARIO	SUB. TRANS.	TOTAL DEVENGADO	TOTAL DEVENG.VAC.	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	CESANTIAS	INTERESES CEBANTIAS	VACACIONES	PRIMA	TOTAL LIQUIDACION	FIRMA
CARLOS ANDRES DIAZ HERNANDEZ	1017210868	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.160.000	\$ 140.808	\$ 1.300.808	\$ 1.160.000	12/01/2023	30/01/2023	19	\$ 68.643	\$ 435	\$ 30.611	\$ 68.643	\$ 168.332	CARLOS DIAZ
WILSON DUBAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	98697444	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.160.000	\$ 140.808	\$ 1.300.808	\$ 1.160.000	12/01/2023	26/01/2023	15	\$ 64.192	\$ 271	\$ 24.107	\$ 64.192	\$ 132.821	Wilson Rodriguez
MARIO LEON VILLA	75048202	AYUDANTE DE OBRA	\$ 1.160.000	\$ 140.808	\$ 1.300.808	\$ 1.160.000	18/01/2023	26/01/2023	9	\$ 32.515	\$ 88	\$ 14.500	\$ 32.515	\$ 79.628	Mario Leon Villa
<b>TOTAL A PAGAR \$ 380.781</b>															

YoBo Residente de Obra

YoBo - JUAN CRISTIAN RIOS



 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	

Informe Número	1 Y FINAL	Fecha del inform	02/02/2023	Acta parcial		Acta final	X
----------------	-----------	------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	004 CON FECHA 16 DE ENERO DEL 2023
Objeto:	REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN CHAMBERY SECTOR PLAN DE LOS OCAMPOS EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA CALDAS
Nombre Contratista:	JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
Fecha del contrato:	16/01/2023
Plazo de ejecución:	15 DIAS
Valor inicial:	\$ 11.236.225
Fecha de iniciación:	16/01/2023
Fecha de terminación:	24/01/2023
Adición (en valor):	-
Prórroga (en tiempo):	-
Supervisor:	JUAN PABLO ZULUAGA CORREA

## 1. AVANCE DEL CONTRATO

### 1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100 %
Avance físico Acumulado	100 %

### 1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

INSTALACIÓN DE TUBERIA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
FILADELFIA	ACUEDUCTO	0.054

### 1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	15 DIAS
Tiempo total transcurrido:	7 DIAS
Avance Porcentual:	100 %



1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)







F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL








F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

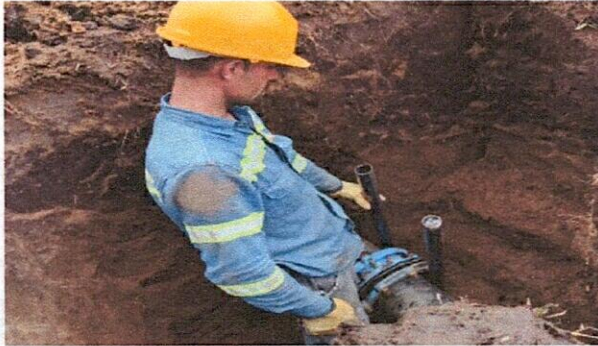





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

#### 1.5. Problemáticas con la obra

No hubieron problemáticas con la obra.





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

#### 1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 11.236.225 /
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 11.236.225 /
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100% /
Inversión total ejecutada:	\$ 11.236.225 /
Porcentaje total ejecutado:	100% /


2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

Por el monto del contrato no se hizo necesario la expedición de polizas.

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
CARLOS ANDRES DIAZ	X	X	X	X	
WILSON DUBAN RODRIGUEZ	X	X	X	X	
MARIO LEON VILLA	X	X	X	X	



 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL</b>	

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
02/05/2022	A	A	A	A	A	A	A	A
Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica								

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)


SE ADJUNTA COMO ANEXO AL PRESENTE INFORME.

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

#### 7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0



 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL</b>

<b>TOTALES</b>		<b>Local</b>	<b>Externa</b>	<b>Subtotal</b>
<b>Personal Interventoría</b>				
Mano de Obra Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
<b>TOTALES</b>				

## 7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

Población del municipio de Aguadas Caldas que usan el servicio de agua potable proveniente de la bocatoma y la cual pasa por el tramo de acueducto que se repuso.


## 8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios		X
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra	X	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		X
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1

4

NOMBRE DEL SUPERVISOR

  
**JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**



CONTRATO No	004 CON FECHA 16 DE ENERO DEL 2023	MUNICIPIO	FILADELFA
-------------	------------------------------------	-----------	-----------

ID TRAMO	PROCESO	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONGITUD	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	NUMERO DE SECTOR HIDRAULICO (MUSH)	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
CHAMBERY	Conduccion	CHAMBERY	8"	54	POLETILENO	Instalacion con apertura de zanja		SI	NTC 4585	ICONTEC	668011	EXTRUCOL	800.022.371.4	21/01/2023	8"	PVC	54

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR	JUAN PABLO ZUÑIGA CORDERA	NOMBRE CONTRATISTA	JOHAN SEBASTIAN SUAREZ
FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR		FIRMA CONTRATISTA	

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION - COORDINADOR ACUEDUCTO	
---	--








**EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**  
**EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS**  
**SECCIONAL FILADELFIA CALDAS**



CONTRATO No.: 004 CON FECHA 16 DE ENERO DEL 2023	ACTA No.: 1 Y FINAL	FECHA CORTE: ENERO 24 DE 2023
REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN CHAMBERY SECTOR PLAN DE LOS OCAIMPOS EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA CALDAS	FECHA INICIACIÓN: ENERO 16 DE 2023	FECHA VENCIMIENTO: 31 ENERO DE 2023
MUNICIPIO: FILADELFIA, CALDAS.	FECHA DE SUSPENSIÓN:	FECHA DE REANUDACIÓN:
REPRESENTANTE LEGAL:	VALOR CONTRATO: \$ 11.236.225	VALOR ADICIÓN: \$ 0
CONTRATISTA: JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO	SUPERVISIÓN: JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	FECHA: ENERO 24 DE 2023

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			ACTA 1			EJECUTADO		% OBRA EJECUTADO
		UND	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	
<b>PRELIMINARES</b>										
1	Localización y replanteo	GL	1,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	1,00	150.000,00	1,00	150.000,00	100,00%
<b>EXCAVACION</b>										
1	Excavaciones en zanja - material comun 0 a 2m	m3	34,00	\$ 38.000,00	\$ 1.292.000,00	34,00	1.292.000,00	34,00	1.292.000,00	100,00%
2	Rellenos compactos con material seleccionado de excavacion	m3	30,00	\$ 22.000,00	\$ 660.000,00	30,00	660.000,00	30,00	660.000,00	100,00%
3	Dispersión de sobrantés	m3	4,00	\$ 18.000,00	\$ 72.000,00	4,00	72.000,00	4,00	72.000,00	100,00%
<b>ACUEDUCTO</b>										
6	Empalme tubería de polietileno 8" y PVC	un	2,00	\$ 1.000.000,00	\$ 2.000.000,00	2,00	2.000.000,00	2,00	2.000.000,00	100,00%
7	Sobrecarreos de tubería al hombro	Tubo	9,00	\$ 50.000,00	\$ 450.000,00	9,00	450.000,00	9,00	450.000,00	100,00%
8	Instalación de tubería de 8" polietileno por termo fusión	un	9,00	\$ 350.000,00	\$ 3.150.000,00	9,00	3.150.000,00	9,00	3.150.000,00	100,00%
9	Termo fusión de portaflanche de 8"	un	1,00	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00	1,00	400.000,00	1,00	400.000,00	100,00%
10	Anclajes y tubería galv. De longitud 2m de 2". Debidamente con tornones de lambré galv. Cal. 13	un	1,00	\$ 742.225,00	\$ 742.225,00	1,00	742.225,00	1,00	742.225,00	100,00%
11	Transporte de tubería y accesorios desde marquetalia al sitio de la obra	Viaje	1,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	1,00	1.200.000,00	1,00	1.200.000,00	100,00%
12	Transporte de personal	Día	4,00	\$ 280.000,00	\$ 1.120.000,00	4,00	1.120.000,00	4,00	1.120.000,00	100,00%

<b>COSTO TOTAL</b>	\$ 11.236.225,00	\$ 11.236.225,00	\$ 11.236.225,00
<b>COSTO DIRECTO</b>	\$ 8.326.213,00	\$ 8.326.213,00	\$ 8.326.213,00
ADMINISTRACION	\$ 2.414.602,00	\$ 2.414.602,00	\$ 2.414.602,00
IMPREVISTOS	\$ -	\$ -	\$ -
UTILIDADES	\$ 416.311,00	\$ 416.311,00	\$ 416.311,00
I. V. A.	\$ 79.099,00	\$ 79.099,00	\$ 79.099,00
<b>COSTO TOTAL OBRA (incluye A.L.U. e IVA sobre utilidades)</b>	\$ 11.236.225,00	\$ 11.236.225,00	\$ 11.236.225,00

  
**JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**  
 INGENIERO ZONA CENTRO NORTE  
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

**JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO**  
 CONTRATISTA



**PRELIMINARES**

Fecha	ITEM:	1	Localizacion y replanteo				Total Acumulado	observaciones	
	Ubicación		Longitud	Ancho	Alto	GL	Total GL		Total GL
	CHAMBERY					1.00	1.00	1.00	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE LA RED
	<b>Total</b>						1.00		

**EXCAVACIONES**

Fecha	ITEM:	2	Excavaciones en zanja - material comun 0 a 2m				Total Acumulado	observaciones	
	Ubicación		Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Total M3		Total MI
	CHAMBERY		46.00	0.65	0.83		24.70	24.70	EXCAVACION A LO LARGO DE LA BRECHA
	CHAMBERY		8.00	0.65	1.80		9.36	9.36	
	<b>Total</b>						34.00		

Fecha	ITEM:	3	Rellenos compactos con material seleccionado de excavacion				Total Acumulado	observaciones	
	Ubicación		Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Total M3		Total UN
	CHAMBERY		46.00	0.65	0.70		20.93	20.93	LLENO DE TODA LA BRECHA COMPACTADA
	CHAMBERY		8.00	0.65	1.70		8.84		
	<b>Total</b>						30.00		

Fecha	ITEM:	4	Dispercion de sobrantes				Total Acumulado	observaciones	
	Ubicación		Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Total M3		Total UN
	CHAMBERY		46.00	0.65	0.12		3.59	3.59	DISPERCION SOBRANTE DEL MATERIAL EXCAVADO
	CHAMBERY		8.00	0.65	0.10		0.52	0.52	
	<b>Total</b>						4.00		

**ACUEDUCTO**

Fecha	ITEM:	6	Emapiema tuberia de poolietileno 8" y PVC				Total Acumulado	observaciones	
	Ubicación		Longitud	Ancho	Alto	cantidad	Total M3		Total M3
	CHAMBERY		2.00				2.00	2.00	EMPALME DE LA TUBERIA NUEVA CON LA EXISTENTE
	<b>Total</b>						2.00		

Fecha	ITEM:	7	Sobreacarreo de tuberia al hombro				Total Acumulado	observaciones	
	Ubicación		Tubo	Ancho	Alto	tubo	Total Tubo		Total tubo
	CHAMBERY		9.00				9.00	9.00	SOBREACARREO DE LA TUBERIA HASTA EL SITIO
	<b>Total</b>						9.00		

Fecha	ITEM:	10	Instalacion de tuberia de 8" polietileno por termo fusion				Total Acumulado	observaciones	
	Ubicación		Unidad	Longitud	Peso	Cantidad	Total ML		Total ML
	CHAMBERY		9				9.00	9.00	INSTALACION DE TUBERIA 8" POR TERMOFUSION
	<b>Total</b>						9.00		


Fecha	ITEM:	11	termo fusion de portaflanche de 8"				Total Acumulado	observaciones	
	Ubicación		Unidad	Ancho	Alto	%	Total Un		Total Un
	CHAMBERY		1.00				1.00	1.00	INSTALACION DE PORTAFLANCHE
	<b>Total</b>						1.00		

Fecha	ITEM:	12	Anclajes y tuberia galv. De longitud 2m de 2". Debidamente con tortones de lambre galv. Cal. 13				Total Acumulado	observaciones	
	Ubicación		Unidad				Total Un		Total Un
	CHAMBERY		1.00				1.00	1.00	ANCLAJE DE TUBERIA
	<b>Total</b>						1.00		



Fecha	ITEM:	13	transporte de tubería y accesorios desde marquetalia al sitio de la obra			Total Acumulado	observaciones
	Ubicación	Viaje			Total Viaje	Total Viaje	
	CHAMBERY	1,00			1,00		TRANSPORTE DE TUBERIA DESDE MARQUETALIA
	<b>Total</b>				<b>1,00</b>		

Fecha	ITEM:	13	Transporte de personal			Total Acumulado	observaciones
	Ubicación	Día			Total Un	Total Un	
	CHAMBERY	4,00			4,00		TRANSPORTE DE PERSONAL AL SITIO DE LA OBRA
	<b>Total</b>				<b>4,00</b>		

  
 JUAN PABLO ZULUAGA CORREA  
 Supervisor  
 EMPOCALDAS S.A.E.S.P

  
 JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO  
 Contratista



Buen día envió pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.

Este documento le sirve como certificado de existencia

06-02-2023 06-02-2023 FE FE19 Facture electrónica 1057304693 Johan Sebastian Rios... 890803239 EMPRESA DE OBRAS... Aprobado con notificación Factura Electrónica 511,236,225
