



## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

## LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA

F-GC-29  
Versión:07  
2022-11-04

# CONTRATO Y AÑO	017 de 2023	Acta N°	7 y parcial	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	46.400.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	IVÁN MATEO MUÑOZ MARTÍNEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	46.400.000
NIT O CC:	1.053.856.851			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	34.768.426
CDP (#, rubro y fecha)	51/2320202009/01-01-2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	5.815.800
RP (#, rubro y fecha)	51/2120203001/01-01-2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	5.815.774
	126/2320202009/02-01-2023				
126/2120203001/02-01-2023					

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS; CON ENFASIS EN EL SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS, PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADOS Y PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			<input checked="" type="checkbox"/> # FOLIOS
1- Acta original			X
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).			X
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).			NA
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X
5- Pagos SENA y ICBF.			NA
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			NA
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			NA
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			X
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)			NA
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)			NA
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor			NA
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1)			NA

**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.**

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Copia del acta	<input checked="" type="checkbox"/>
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)	
Copia del registro presupuestal	

Fecha de presentación

31/07/2023

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIEGO ALEJANDRO PATIÑO RINCON	COORDINADOR DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO HÍDRICO	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
059-000510-28	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

## ACTA DE PAGO PARCIAL No. 07

**CONTRATO** No. 017 DE 2023

**OBJETO** PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS; CON ENFASIS EN EL SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS, PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADOS Y PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO.

**CONTRATISTA** IVAN MATEO MUÑOZ MARTINEZ

**C.C. No.** 1.053.856.851

**VALOR DEL ACTA** \$5.815.800

De los cuales \$5.000.000 equivalen a los honorarios del contrato, y \$815.800 equivalen a gastos oficiales de viajes realizados a municipios de Caldas donde Empocaldas presta el servicio de acueducto y alcantarillado.

CONTROL FINANCIERO	
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>\$46.400.000</b>
ACTA PARCIAL No. 07	\$5.815.800
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$5.815.774</b>


En Manizales (Caldas) a los treinta y un (31) días del mes de Julio de 2023, se reunieron el Ingeniero DIEGO ALEJANDRO PATIÑO RINCÓN Coordinador Acueducto y Saneamiento Hídrico de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y el contratista IVÁN MATEO MUÑOZ MARTÍNEZ, con el fin de tramitar el pago de las actividades realizadas durante el mes de julio correspondiente al Contrato No. 017 de enero 02 de 2023.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO. 07 CINCO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE (\$5.815.800).

El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (EPS SURAMERICANA S.A.), pensión (COLPENSIONES) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de junio de 2023.

El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió con las obligaciones y actividades que desarrollan en el objeto acordado.

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella.



**DIEGO ALEJANDRO PATIÑO RINCON**  
Coordinador Acueducto y Saneamiento  
Supervisor  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



**IVAN MATEO MUÑOZ MARTINEZ**  
Contratista





DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
CC 105368681	0	IVAN MUNOZ	1	0	POSITIVA - 14-23	7112	Natural		
MUN-DEP	17-1	DIRECCION	TELEFONO	EMAIL					
		CR 17 N 6A, 106 URUPANES DE BELLA SUIZA	1234567	IMATEONUNOZZ@MAIL.COM					
					EXENTO DE PARAFISCALES				
					N				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO/PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-06	2023-06	26785135	1	2023-07-13	106	TODOS	TODOS	570.000	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	26785135	2023-07-14	Pagada							

Nº	ID	EMPLEADO	MUN-DEP	MUNICIPIO	DIRECCION	TELEFONO	EMAIL	NOVEDADES												DIAS			PENSION			SALUD			CFE			RIESGOS			TARIFA PARAF			SENA			ICBF			ESAP			MIN			TOTAL			Actividad Económica																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70



Manizales, julio 31 de 2023

INGENIERO  
DIEGO ALEJANDRO PATIÑO RINCON  
Coordinador Acueducto y Saneamiento  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

**REFERENCIA:** Actividades realizadas con cargo al Contrato No.017 de 2023.

**OBJETO:** PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS; CON ENFASIS EN EL SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS, PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADOS Y PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO.

Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas durante el mes de julio de 2023, las cuales relaciono a continuación:

**Estado de ejecución del contrato: 87.5%**

**ACTIVIDADES REALIZADA:** Dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- 1- Realización de los informes anuales y semestrales del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.
- Se realizó el Nuevo Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio de Filadelfia, Caldas.

EMP-MAN-PLAN-06 > 2023 > Seccionales > Filadelfia > Nuevo PSMV Filadelfia

Nombre	Estado
<input type="checkbox"/> Anexo 1 - Red Alcantarillado Actual	⊙
<input type="checkbox"/> Anexo 2 - Identificación Puntos de Vertim	⊙
<input type="checkbox"/> Anexo 3 - Áreas Aferentes por Vertim	⊙
<input type="checkbox"/> Anexo 4 - Interceptores Colectores Construidos	⊙
<input type="checkbox"/> Anexo 5 - Interceptores Colectores a Construir	⊙
<input type="checkbox"/> Anexo 6 - Tramo a Sanear Cuerpos Receptores	⊙
<input type="checkbox"/> Anexo 7 - Esquema de Tratamiento de Aguas Residuales	⊙
<input type="checkbox"/> Anexo 8 - Plan Acción Financiación Cronograma	⊙
<input type="checkbox"/> Anexo 9 - Formato de Seguimiento Anual y Semestral PSMV	⊙



## EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

### NUEVO PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS



JULIO, 2023

Página 1 de 55

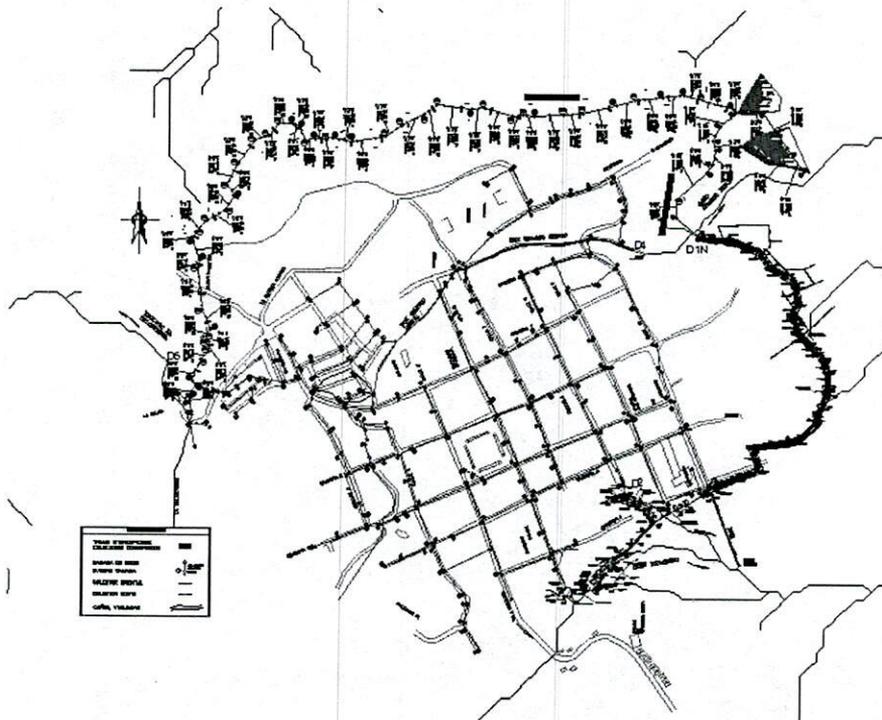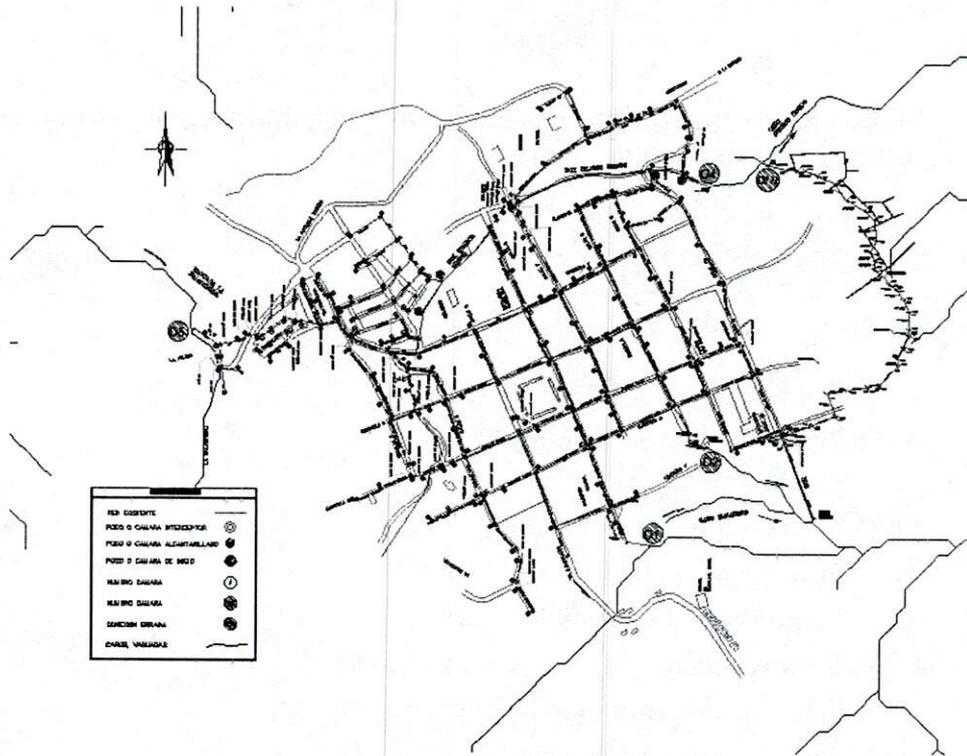


- Se realizó visita al Municipio de Filadelfia, Caldas con el fin de realizar el Nuevo Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio, obteniendo la información pertinente respecto a los Interceptores-Colectores construidos y vertimientos eliminados hasta el año 2022.

- Se realizó el Nuevo Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio de Belalcázar, Caldas.

S > EMP-MAN-PLAN-06 > 2023 > Seccionales > Belacazar > Nuevo PSMV Belacazar :

Nombre	Estado
<input type="checkbox"/> Anexo 1 - Red Alcantarillado Actual	☑
<input type="checkbox"/> Anexo 2 - Identificación Puntos de Vertim	☑
<input type="checkbox"/> Anexo 3 - Áreas Aferentes por Vertim	☑
<input type="checkbox"/> Anexo 4 - Interceptores Colectores Construidos	☑
<input type="checkbox"/> Anexo 5 - Interceptores Colectores a Construir	☑
<input type="checkbox"/> Anexo 6 - Tramo a Sanear Cuerpos Receptores	☑
<input type="checkbox"/> Anexo 7 - Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales	☑
<input type="checkbox"/> Anexo 8 - Plan Acción Financiación Cronograma	☑
<input type="checkbox"/> Anexo 9 - Formato de Seguimiento Anual y Semestral PSMV	☑

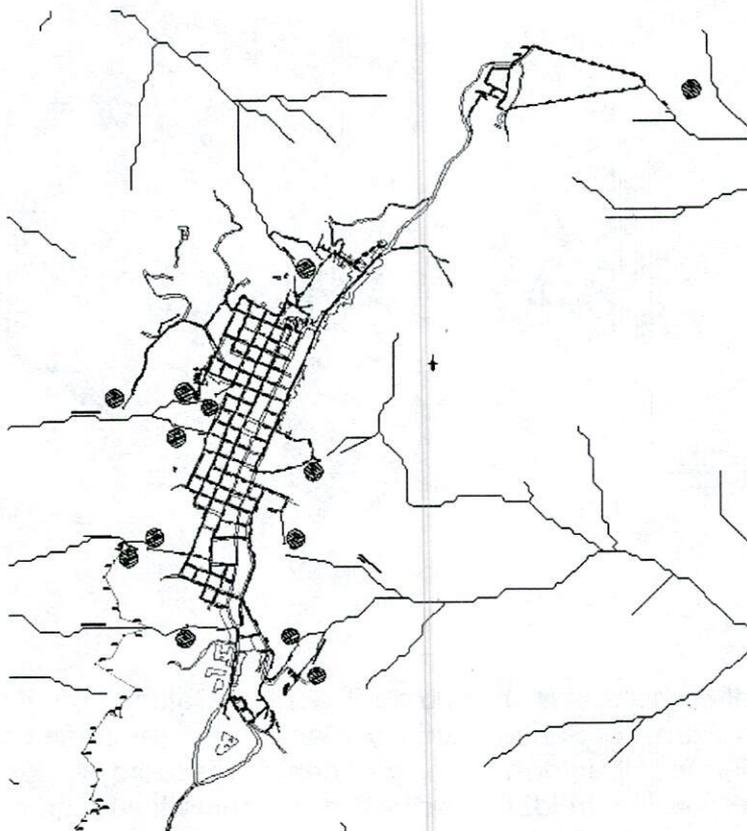



**EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

**NUEVO PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DEL  
MUNICIPIO DE BELALCÁZAR, CALDAS**



**JULIO, 2023**

Página 1 de 61

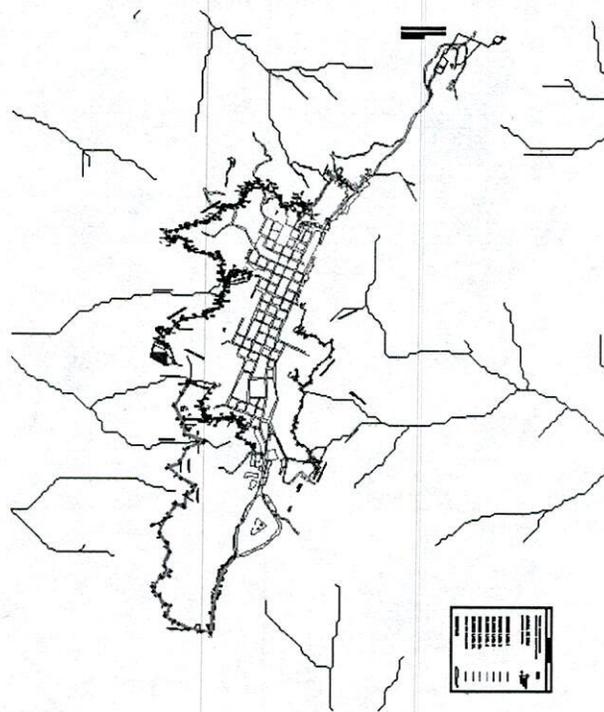

- Se realizó visita al Municipio de Belalcázar, Caldas con el fin de realizar el Nuevo Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio, obteniendo la información pertinente respecto a los Interceptores-Colectores construidos y vertimientos eliminados hasta el año 2022.

## 2- Apoyo en el departamento de Planeación y Proyectos.

- Se realizó acompañamiento en la elaboración del seguimiento al POIR hasta el 31 de junio de 2023.

PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO - POIR  
ESTADO DEL POIR Y EVALUACION DEL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO  
A JUNIO 30 DE 2023

ID PROJ	SECCIONAL	SERVICIO	NOMBRE PROYECTO	Inversion Programada (\$ Enero 2021)	Inversion Ejecutada (\$ Enero 2021)	Porcentaje de Ejecución del Proyecto (%)	Fecha Programa de Finalización del Proyecto	RIESGO	SEMAFORO
1	AGUADAS	ACUEDUCTO	Mejoramiento del acueducto de Aguadas Etapa 1 Tanque	1.002.005.307,0	23.131.429,1	2,31%	2024	MEDIO	1
2	AGUADAS	ALCANTARILLADO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Aguadas	71.682.241,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
3	AGUADAS	ACUEDUCTO	Mejoramiento del acueducto de Aguadas Etapa 2	157.853.940,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
4	AGUADAS	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Aguadas	24.594.142,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
5	AGUADAS	ALCANTARILLADO	Reposicion y mejoramiento del alcantarillado de Aguadas	631.105.805,0	8.952.393,2	1,42%	2026	BAJO	3
6	AGUADAS	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Aguadas Etapa 1	455.957.862,0	4.843.029,0	1,06%	2028	BAJO	3
7	AGUADAS	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Aguadas Etapa 1	110.777.911,6	110.777.911,6	100,00%	2022	SIN RIESGO	1
8	AGUADAS	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Aguadas Etapa 2	162.000.000,0	46.969.836,5	28,99%	2023	ALTO	1
9	AGUADAS	ACUEDUCTO	Mejoramiento Tanque Aguadas	74.457.569,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
10	AGUADAS	ACUEDUCTO	Suministro de materiales e implementación para la construcción de	16.304.425,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
11	AGUADAS	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Aguadas	138.846.378,8	143.481.549,5	103,34%	2022	SIN RIESGO	1
12	AGUADAS	ACUEDUCTO	Reposicion acueducto Aguadas Etapa 1	123.227.828,0	58.528.546,8	47,50%	2023	ALTO	1
13	AGUADAS	ACUEDUCTO	Reposicion acueducto Aguadas Etapa 2	429.687.412,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	3
14	AGUADAS	ALCANTARILLADO	Reposicion alcantarillado Aguadas Etapa 1	758.547.485,0	217.5214,0	28,56%	2024	MEDIO	3
15	ANSERMA	ACUEDUCTO	Obras de Reposicion acueducto Anserma Etapa 4	116.411.641,0	116.956.102,9	100,47%	2022	SIN RIESGO	1
16	ANSERMA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Anserma 1	1.651.096.034,0	944.392,7	0,06%	2024	MEDIO	3
17	ANSERMA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Anserma Etapa 1	199.746.898,0	200.771.697,3	100,51%	2022	SIN RIESGO	1
18	ANSERMA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Anserma Etapa 1	153.273.264,0	154.991.953,3	101,12%	2022	SIN RIESGO	1
19	ANSERMA	ACUEDUCTO	Reposicion acueducto Anserma Etapa 1	67.408.060,0	67.515.700,4	100,16%	2022	SIN RIESGO	1
20	ANSERMA	ACUEDUCTO	Mejoramiento del sistema electrico de la planta	20.000.000,0	4.078.529,2	20,39%	2023	ALTO	1
21	ANSERMA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Anserma Etapa 2	127.929.250,0	127.929.250,0	100,00%	2024	MEDIO	3
22	ANSERMA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Anserma Etapa 2	177.211.695,0	194.285.770,3	103,95%	2024	MEDIO	3
23	ANSERMA	ACUEDUCTO	Reposicion acueducto Anserma Etapa 2	187.452.594,0	94.127.131,2	50,21%	2024	MEDIO	3
24	ANSERMA	ALCANTARILLADO	Reposicion alcantarillado Anserma Etapa 1	277.341.775,0	250.553.995,4	90,34%	2024	MEDIO	3
25	ARAUCA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposicion alcantarillado Arauca Etapa 1	117.916.098,0	173.799.563,0	101,10%	2022	SIN RIESGO	1
26	ARAUCA	ALCANTARILLADO	Obras de Reposicion alcantarillado Arauca Etapa 2	266.971.085,0	10.977.944,8	4,11%	2027	BAJO	3
27	ARAUCA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización aduccion Arauca	132.395.885,0	132.490.733,0	100,08%	2022	SIN RIESGO	1
28	ARAUCA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Arauca	86.627.502,0	86.737.474,0	100,13%	2022	SIN RIESGO	1
29	ARMA	ACUEDUCTO	Reposicion de acueducto en la conducción Aguadas Arma	115.228.703,0	115.228.703,0	100,00%	2022	SIN RIESGO	1
30	ARMA	ACUEDUCTO	Mejoramiento del acueducto de Arma	9.161.596,0	9.161.596,0	100,00%	2024	MEDIO	3
31	ARMA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento del alcantarillado de Arma	24.081.237,0	0,0	0,00%	2023	BAJO	3
32	ARMA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Arma Etapa 1	366.673.554,0	7.518.607,4	2,05%	2022	ALTO	1
33	ARMA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Arma Etapa 2	366.673.554,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
34	ARMA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Arma	45.600.942,0	23.362.805,0	51,35%	2023	ALTO	1
35	ARMA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Arma	91.140.357,0	62.905.114,8	69,13%	2023	SIN RIESGO	1
36	BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Belalcázar Etapa 1	33.963.764,0	93.737.963,1	100,19%	2023	SIN RIESGO	1
37	BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Belalcázar Etapa 2	273.545.343,0	273.545.343,0	100,00%	2024	MEDIO	3
38	BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Belalcázar Etapa 1	254.256.916,0	46.107.364,3	18,13%	2023	ALTO	1
39	BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Belalcázar Etapa 2	508.513.631,0	0,0	0,00%	2025	BAJO	3
40	BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Belalcázar Etapa 3	508.513.631,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
41	BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Belalcázar Etapa 4	508.513.631,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
42	BELALCAZAR	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Belalcázar Etapa 5	508.513.631,0	0,0	0,00%	2031	BAJO	3
43	CHINCHINA	ACUEDUCTO	Obras de Expansion acueducto Chinchina Etapa 2	1.291.666.336,0	692.134.042,7	53,58%	2022	ALTO	1
44	CHINCHINA	ACUEDUCTO	Obras de Reposicion acueducto Chinchina Etapa 2	130.005.950,0	130.687.873,3	100,52%	2022	SIN RIESGO	1
45	CHINCHINA	ACUEDUCTO	Obras de Reposicion acueducto Chinchina Etapa 3	143.439.951,3	143.548.816,5	100,10%	2022	SIN RIESGO	1
46	CHINCHINA	ACUEDUCTO	Obras de Reposicion acueducto Chinchina Etapa 4	143.439.951,3	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
47	CHINCHINA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Chinchina Etapa 1	500.472.042,3	510.241.620,7	101,95%	2022	SIN RIESGO	1
48	CHINCHINA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Chinchina Etapa 2	167.628.119,0	167.628.119,0	100,00%	2023	SIN RIESGO	1
49	CHINCHINA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Chinchina Etapa 3	294.624.117,0	294.624.117,0	100,00%	2024	MEDIO	3
50	CHINCHINA	ACUEDUCTO	Mejoramiento acueducto Chinchina	215.467.967,0	219.483.024,9	101,85%	2022	SIN RIESGO	1
51	CHINCHINA	ACUEDUCTO	Mejoramiento acueducto Chinchina	282.011.542,1	283.786.209,4	100,63%	2022	SIN RIESGO	1
52	CHINCHINA	ALCANTARILLADO	Reposicion alcantarillado Chinchina	300.000.000,0	32.682.332,5	10,89%	2025	BAJO	3
53	CHINCHINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Chinchina Etapa 1	500.000.000,0	0,0	0,00%	2030	BAJO	3
54	CHINCHINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Chinchina Etapa 2	500.000.000,0	0,0	0,00%	2032	BAJO	3
55	CHINCHINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Chinchina Etapa 3	500.000.000,0	0,0	0,00%	2034	BAJO	3
56	CHINCHINA	ACUEDUCTO	Construcción Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP Campoalegre	2.150.221.894,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
57	CHINCHINA	ACUEDUCTO	Construcción Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP Los Cuervos	1.499.599.423,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	3
58	FILADELFIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento del acueducto de Filadelfia Etapa 1 Tanque	823.500.867,0	115.957.309,1	14,08%	2022	ALTO	1
59	FILADELFIA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Filadelfia	35.299.274,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
60	FILADELFIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento de la aduccion en el municipio de Filadelfia	189.570.653,0	100.011.871,7	53,04%	2022	ALTO	1
61	FILADELFIA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento PTAP de Filadelfia	10.688.757,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
62	FILADELFIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Filadelfia Etapa 1	613.587.934,0	47.046.003,5	7,67%	2022	ALTO	1
63	FILADELFIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Filadelfia Etapa 2	613.587.934,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
64	FILADELFIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Filadelfia Etapa 3	608.150.179,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
65	FILADELFIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Filadelfia Etapa 4	610.404.301,0	0,0	0,00%	2028	BAJO	3
66	GUARINOCITO	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Guarinocito Etapa 1	473.208.227,0	27.099.381,9	5,73%	2023	ALTO	1
67	GUARINOCITO	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Guarinocito Etapa 1	650.008.155,9	0,0	0,00%	2024	MEDIO	3
68	KILOMETRO 41	ACUEDUCTO	Obras de Optimización de Acueducto Kilometro 41 Fase 1	63.365.570,0	39.919.117,1	62,98%	2022	ALTO	1
69	KILOMETRO 41	ACUEDUCTO	Obras de Optimización de Acueducto Kilometro 41 Fase 2	441.258.071,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	3
70	KILOMETRO 41	ALCANTARILLADO	Obras de Reposicion alcantarillado Kilometro 41 Etapa 1	86.045.971,0	86.231.499,7	100,22%	2022	SIN RIESGO	1
71	KILOMETRO 41	ALCANTARILLADO	Obras de Reposicion alcantarillado Kilometro 41 Etapa 2	581.191.073,0	580.787.077,5	99,93%	2022	ALTO	1
72	KILOMETRO 41	ALCANTARILLADO	Obras de Reposicion alcantarillado Kilometro 41 Etapa 3	86.045.971,0	43.526.766,5	50,59%	2026	BAJO	3
73	KILOMETRO 41	ALCANTARILLADO	Obras de Reposicion alcantarillado Kilometro 41 Etapa 4	86.045.971,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3



73	LA DORADA	ACUEDUCTO	Obras de Rehabilitación acueducto La Dorada 2	166.262.884,0	166.262.884,0	100,00%	2023	SIN RIESGO	
74	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reparación alcantarillado La Dorada 4	93.335.392,0	93.505.486,8	100,16%	2022	SIN RIESGO	
75	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Optimización redes alcantarillado barrio las ferias	4.378.352.204,0	0,0	0,00%	2026	BAJO	3
76	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reparación alcantarillado La Dorada 5	100.391.500,0	21.194.164,1	21,10%	2022	ALTO	1
77	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reparación alcantarillado La Dorada 6	72.025.045,0	2.330.343,5	3,24%	2022	ALTO	1
78	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reparación alcantarillado La Dorada 7	100.132.058,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
79	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reparación alcantarillado La Dorada 8	93.335.392,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
80	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reparación alcantarillado La Dorada 9	90.178.574,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
81	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reparación alcantarillado La Dorada 10	154.572.766,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
82	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reparación alcantarillado La Dorada 11	172.051.942,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
83	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reparación alcantarillado La Dorada 12	172.051.942,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
84	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reparación alcantarillado La Dorada 13	172.051.942,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	1
85	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reparación alcantarillado La Dorada 14	172.051.942,0	0,0	0,00%	2025	BAJO	3
86	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Rehabilitación alcantarillado La Dorada 2	232.087.840,0	0,0	0,00%	2026	BAJO	3
87	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Rehabilitación alcantarillado La Dorada 2	232.087.840,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
88	LA DORADA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto La Dorada Etapa 1	281.078.865,0	281.170.403,6	100,03%	2022	SIN RIESGO	1
89	LA DORADA	ACUEDUCTO	Mejoramiento tanque de almacenamiento sector la Melissa	800.000.000,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
90	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado La Dorada Etapa 1	511.790.678,0	338.449.601,0	66,13%	2022	ALTO	1
91	LA DORADA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto La Dorada Etapa 2	938.461.280,0	53.827.061,6	5,74%	2023	ALTO	1
92	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado La Dorada Etapa 2	1.253.667.331,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
93	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado La Dorada Etapa 3	251.821.765,4	0,0	0,00%	2024	MEDIO	1
94	LA DORADA	ACUEDUCTO	Construcción Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP El Llano	2.150.221.894,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	2
95	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reparación alcantarillado La Dorada 15	506.687.941,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
96	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reparación alcantarillado La Dorada 16	506.687.941,0	0,0	0,00%	2025	BAJO	3
97	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reparación alcantarillado La Dorada 17	506.687.941,0	0,0	0,00%	2028	BAJO	3
98	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reparación alcantarillado La Dorada 18	506.687.941,0	0,0	0,00%	2032	BAJO	3
99	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reparación alcantarillado La Dorada 19	1.194.900.140,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
100	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reparación alcantarillado La Dorada 20	1.194.900.140,0	0,0	0,00%	2026	BAJO	3
101	LA DORADA	ALCANTARILLADO	Obras de Reparación alcantarillado La Dorada 21	1.194.900.140,0	0,0	0,00%	2030	BAJO	3
102	MANZANARES	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Manzanares	16.322.262,0	16.490.323,3	101,03%	2022	SIN RIESGO	1
103	MANZANARES	ACUEDUCTO	Estabilización y protección de tuberías del acueducto de Manzanares	27.775.826,0	19.188.646,6	69,08%	2022	ALTO	1
104	MANZANARES	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Manzanares	49.532.692,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
105	MANZANARES	ACUEDUCTO	Mejoramiento del cerramiento del Tanque de Manzanares	56.901.438,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
106	MANZANARES	ACUEDUCTO	Mejoramiento de las aducciones en el municipio de Manzanares	253.068.767,0	163.095.973,5	64,45%	2022	ALTO	1
107	MANZANARES	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Manzanares	1.857.808,0	1.864.545,1	100,36%	2022	SIN RIESGO	1
108	MANZANARES	ACUEDUCTO	Construcción de canal para recoger el sobrante de la PTAP de Manz	131.397.257,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
109	MANZANARES	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Manzanares	363.280.316,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
110	MANZANARES	ALCANTARILLADO	Reposición y optimización de redes de alcantarillado en Manzanares	205.795.414,0	114.675.211,1	55,72%	2022	ALTO	1
111	MANZANARES	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Manzanares Etapa 1	371.033.819,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
112	MANZANARES	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Manzanares Etapa 2	371.033.819,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
113	MANZANARES	ACUEDUCTO	Mejoramiento aducciones Manzanares Etapa 2	59.937.521,0	25.335.148,8	42,27%	2022	ALTO	1
114	MANZANARES	ALCANTARILLADO	Mejoramiento descole planta Manzanares	151.276.485,4	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
115	MANZANARES	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización planta Manzanares	238.000.000,0	2.751.542,3	0,92%	2023	ALTO	1
116	MANZANARES	ACUEDUCTO	Mejoramiento aducciones Manzanares Etapa 3	63.822.133,2	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
117	MANZANARES	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Manzanares	25.387.627,0	31.666.916,8	124,73%	2023	SIN RIESGO	1
118	MANZANARES	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Manzanares	285.032.888,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
119	MARQUETALIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Marquetalia	26.562.533,0	0,0	0,00%	2025	BAJO	3
120	MARQUETALIA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Marquetalia	49.532.692,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
121	MARQUETALIA	ACUEDUCTO	Reposición de redes en la aducción San Juan de Marquetalia	277.797.376,0	278.553.328,4	100,27%	2025	BAJO	3
122	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 1	347.781.068,0	1.373.150,3	0,39%	2022	ALTO	1
123	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 2	179.266.592,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
124	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 3	288.024.871,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	1
125	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 4	143.414.874,0	0,0	0,00%	2025	BAJO	3
126	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 5	179.266.592,0	0,0	0,00%	2026	BAJO	3
127	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 6	239.024.769,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
128	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marquetalia Etapa 7	203.171.071,0	0,0	0,00%	2028	BAJO	3
129	MARQUETALIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimización acueducto Marquetalia	250.400.865,0	251.356.878,5	100,38%	2022	SIN RIESGO	1
130	MARQUETALIA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimización alcantarillado Marquetalia	450.510.879,9	361.610.545,4	80,27%	2023	ALTO	1
131	MARILANDA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Marilanda	35.239.274,0	2.333.353,7	6,63%	2022	ALTO	1
132	MARILANDA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marilanda Etapa 1	362.750.342,0	79.614.062,7	21,95%	2022	ALTO	1
133	MARILANDA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marilanda Etapa 2	362.750.342,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
134	MARILANDA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marilanda Etapa 3	285.332.261,0	0,0	0,00%	2025	BAJO	3
135	MARILANDA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marilanda Etapa 4	288.107.342,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
136	MARILANDA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Marilanda Etapa 5	263.483.026,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
137	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 1	136.781.836,0	76.578.698,3	57,45%	2022	ALTO	1
138	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 2	136.781.836,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
139	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 3	136.781.836,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
140	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 4	136.781.836,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
141	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 5	136.781.836,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	1
142	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 6	136.781.836,0	0,0	0,00%	2025	BAJO	3
143	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 7	136.781.836,0	0,0	0,00%	2026	BAJO	3
144	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 8	136.781.836,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
145	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 9	136.781.836,0	0,0	0,00%	2028	BAJO	3
146	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición de tubería en aducciones de Neira Etapa 10	136.781.836,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
147	NEIRA	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Neira	17.102.012,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
148	NEIRA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Neira	56.688.324,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	1
149	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Neira	2.506.184,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	1
150	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposición y Mejoramiento del acueducto de Neira - Tanque	630.264.822,0	0,0	0,00%	2023	BAJO	3
151	NEIRA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 1	35.261.341,0	35.324.223,3	100,16%	2022	SIN RIESGO	1
152	NEIRA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 2	70.047.943,0	70.476.736,4	100,61%	2022	SIN RIESGO	1
153	NEIRA	ALCANTARILLADO	Reposición y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 3	246.688.983,0	45.601.086,3	18,49%	2024	MEDIO	1

153	NEIRA	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 3	246.668.383,0	45.501.086,2	18,45%	2024	MEDIO	3
154	NEIRA	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 4	246.668.383,0	0,0	0,00%	2026	BAJO	3
155	NEIRA	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Neira Etapa 5	246.668.383,0	0,0	0,00%	2028	BAJO	3
156	NEIRA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Neira Etapa 1	320.078.542,0	2.909.417,4	0,91%	2027	BAJO	3
157	NEIRA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Neira Etapa 2	320.078.542,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
158	NEIRA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimizacion alcantarillado Neira Etapa 1	122.339.025,4	122.636.540,7	100,23%	2022	SIN RESGGO	3
159	NEIRA	ACUEDUCTO	Reposicion acueducto Neira Etapa 1	107.277.583,7	36.987.043,6	34,48%	2022	ALTO	3
160	NEIRA	ALCANTARILLADO	Reposicion alcantarillado Neira Etapa	159.567.042,0	45.970.009,9	28,87%	2024	MEDIO	3
161	NEIRA	ACUEDUCTO	Construccion Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP Neira	1.400.204.895,0	0,0	0,00%	2025	BAJO	3
162	PALESTINA	ACUEDUCTO	Obras de Reposicion acueducto Palestina Etapa 2	49.364.594,0	49.364.594,0	100,00%	2022	SIN RESGGO	3
163	PALESTINA	ACUEDUCTO	Obras de Expansion acueducto Palestina	234.801.636,0	22.509.254,3	9,58%	2022	ALTO	3
164	PALESTINA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimizacion acueducto Palestina	258.333.765,0	165.853.736,8	64,25%	2022	ALTO	3
165	PALESTINA	ACUEDUCTO	Mejoramiento tanque elevado Palestina	150.000.000,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	3
166	PALESTINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Palestina Etapa 1	200.000.000,0	133.848.189,4	66,92%	2030	BAJO	3
167	PALESTINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Palestina Etapa 2	200.000.000,0	0,0	0,00%	2032	BAJO	3
168	RIOSUCIO	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Riosucio Etapa 1	1.361.408.503,0	0,0	0,00%	2025	BAJO	3
169	RIOSUCIO	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Riosucio Etapa 2	1.505.800.751,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	3
170	RIOSUCIO	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimizacion alcantarillado Riosucio Etapa 1	83.712.271,0	84.010.074,5	100,36%	2022	SIN RESGGO	3
171	RIOSUCIO	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimizacion alcantarillado Riosucio Etapa 2	178.556.270,0	178.556.270,0	100,00%	2023	SIN RESGGO	3
172	RIOSUCIO	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimizacion acueducto Riosucio	73.048.345,0	73.048.345,0	100,00%	2024	SIN RESGGO	3
173	RIOSUCIO	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimizacion alcantarillado Riosucio Etapa 3	380.359.902,0	380.634.475,3	100,07%	2024	MEDIO	3
174	RIOSUCIO	ACUEDUCTO	Reposicion acueducto Riosucio	80.005.092,0	84.508.717,3	105,63%	2024	SIN RESGGO	3
175	RISARALDA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Risaralda	547.801.634,0	16.175.077,5	2,95%	2022	ALTO	3
176	RISARALDA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimizacion alcantarillado Risaralda Etapa 1	104.062.039,0	104.062.039,0	100,00%	2022	SIN RESGGO	3
177	RISARALDA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimizacion alcantarillado Risaralda Etapa 2	219.532.736,0	147.163.108,7	67,34%	2023	ALTO	3
178	SALAMINA	ACUEDUCTO	Rehabilitacion de la aduccion El Lluto de Salamina	219.082.740,0	220.174.979,9	100,98%	2022	SIN RESGGO	3
179	SALAMINA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Salamina	49.592.562,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	3
180	SALAMINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 1	383.408.649,0	64.900.274,4	16,93%	2022	ALTO	3
181	SALAMINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 2	383.408.649,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	3
182	SALAMINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 3	383.408.649,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	3
183	SALAMINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 4	383.408.649,0	0,0	0,00%	2026	BAJO	3
184	SALAMINA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Salamina Etapa 5	383.408.649,0	0,0	0,00%	2028	BAJO	3
185	SALAMINA	ACUEDUCTO	Reposicion acueducto Salamina	52.148.789,0	52.200.854,8	100,10%	2022	SIN RESGGO	3
186	SALAMINA	ALCANTARILLADO	Reposicion alcantarillado Salamina	30.568.067,7	30.328.316,6	100,40%	2022	SIN RESGGO	3
187	SALAMINA	ACUEDUCTO	Mejoramiento planta Salamina	33.912.443,0	34.553.136,9	100,88%	2023	SIN RESGGO	3
188	SALAMINA	ACUEDUCTO	Construccion Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP Salamina	1.137.591.583,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	3
189	SAMANA	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Samana	106.478.613,3	2.678.134,4	2,49%	2029	BAJO	3
190	SAMANA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Samana	49.592.562,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	3
191	SAMANA	ACUEDUCTO	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Samana	42.680.667,2	0,0	0,00%	2023	ALTO	3
192	SAMANA	ACUEDUCTO	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Samana - Tanque	441.625.275,6	0,0	0,00%	2026	BAJO	3
193	SAMANA	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Samana Etapa 2	115.300.524,4	19.022.825,7	16,45%	2025	BAJO	3
194	SAMANA	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Samana Etapa 3	178.618.513,9	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
195	SAMANA	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Samana Etapa 4	178.618.513,9	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
196	SAMANA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Samana Etapa 1	303.154.374,0	3.070.561,3	1,01%	2022	ALTO	3
197	SAMANA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Samana Etapa 2	303.154.374,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	3
198	SAMANA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Samana Etapa 3	303.154.374,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	3
199	SAMANA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Samana Etapa 4	303.154.374,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	3
200	SAMANA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Samana Etapa 5	303.154.374,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	3
201	SAMANA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimizacion acueducto Samana Etapa 1	132.685.372,8	33.076.858,3	24,92%	2022	ALTO	3
202	SAMANA	ACUEDUCTO	Mejoramiento electrico planta Samana	20.000.000,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	3
203	SAMANA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimizacion acueducto Samana Etapa 2	127.456.118,8	19.763.901,0	15,51%	2023	ALTO	3
204	SAMANA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimizacion alcantarillado Samana Etapa 2	201.111.260,5	201.538.885,6	100,21%	2024	SIN RESGGO	3
205	SAMANA	ACUEDUCTO	Construccion Sistema de Tratamiento de Lodos PTAP Samana	1.400.204.895,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	3
206	SAN JOSE	ACUEDUCTO	Mejoramiento planta San Jose	34.885.427,0	35.013.097,6	100,34%	2023	SIN RESGGO	3
207	SAN JOSE	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de San Jose	363.612.501,0	51.220.447,8	13,99%	2024	ALTO	3
208	SUPIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Supia	37.410.651,0	37.410.651,0	100,00%	2025	SIN RESGGO	3
209	SUPIA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Supia	71.682.241,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	3
210	SUPIA	ACUEDUCTO	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Supia Etapa 3	105.146.403,0	105.146.403,0	100,00%	2025	SIN RESGGO	3
211	SUPIA	ACUEDUCTO	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Supia Etapa 4	135.201.153,0	135.201.153,0	100,00%	2027	BAJO	3
212	SUPIA	ACUEDUCTO	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Supia Etapa 5	135.201.153,0	135.201.153,0	100,00%	2029	BAJO	3
213	SUPIA	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Supia Etapa 2	246.564.16,0	246.243.553,1	100,63%	2022	SIN RESGGO	3
214	SUPIA	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Supia Etapa 3	80.165.680,0	80.229.875,3	100,08%	2024	SIN RESGGO	3
215	SUPIA	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Supia Etapa 4	320.545.733,0	309.377.251,1	96,52%	2026	BAJO	3
216	SUPIA	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Supia Etapa 5	302.882.830,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
217	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 1	408.730.202,0	240.837.434,4	59,32%	2022	ALTO	3
218	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 2	411.468.808,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	3
219	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 3	411.468.808,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	3
220	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 4	411.468.808,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	3
221	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 5	411.468.808,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	3
222	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 6	260.433.847,0	0,0	0,00%	2025	BAJO	3
223	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 7	260.433.847,0	0,0	0,00%	2026	BAJO	3
224	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 8	260.433.847,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
225	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 9	260.433.847,0	0,0	0,00%	2028	BAJO	3
226	SUPIA	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Supia Etapa 10	260.433.847,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
227	SUPIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimizacion acueducto Supia Etapa 1	212.338.153,0	212.338.153,0	100,00%	2023	SIN RESGGO	3
228	SUPIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimizacion acueducto Supia Etapa 2	50.643.000,0	50.643.000,0	100,00%	2024	SIN RESGGO	3
229	SUPIA	ALCANTARILLADO	Reposicion alcantarillado Supia	79.804.831,0	54.055.788,3	67,73%	2024	MEDIO	3
230	VICTORIA	ACUEDUCTO	Reposicion de tuberia en aduccion Doña Juana de Victoria Etapa 1	197.876.476,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	3
231	VICTORIA	ACUEDUCTO	Reposicion de tuberia en aduccion Doña Juana de Victoria Etapa 2	267.850.661,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
232	VICTORIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Victoria	28.823.521,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	3
233	VICTORIA	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Victoria	49.592.562,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	3
234	VICTORIA	ACUEDUCTO	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Victoria Etapa 1 Tanque	299.977.076,0	80.084.848,2	26,70%	2022	ALTO	3
235	VICTORIA	ACUEDUCTO	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Victoria Etapa 2	77.886.539,0	78.081.137,2	100,25%	2022	SIN RESGGO	3
236	VICTORIA	ACUEDUCTO	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Victoria Etapa 3	113.921.627,0	114.053.377,7	100,12%	2023	SIN RESGGO	3
237	VICTORIA	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Victoria Etapa C	35.588.255,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	3
238	VICTORIA	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Victoria Etapa 3	197.445.270,0	0,0	0,00%	2025	BAJO	3
239	VICTORIA	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Victoria Etapa 4	319.880.483,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
240	VICTORIA	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Victoria Etapa 5	197.445.270,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
241	VICTORIA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimizacion alcantarillado Victoria	315.475.371,0	102.938.468,8	32,64%	2022	ALTO	3
242	VICTORIA	ALCANTARILLADO	Mejoramiento y optimizacion PTAP Victoria	336.778.215,0	3.784.427,8	1,12%	2023	ALTO	3
243	VICTORIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimizacion aduccion Victoria	31.163.524,0	4.076.661,5	13,07%	2023	ALTO	3
244	VICTORIA	ACUEDUCTO	Mejoramiento y optimizacion acueducto Victoria	26.812.117,1	26.812.117,1	100,00%	2023	SIN RESGGO	3
245	VITERBO	ACUEDUCTO	Mejoramiento PTAP de Viterbo	53.444.787,0	0,0	0,00%	2023	ALTO	3
246	VITERBO	ACUEDUCTO	Tratamiento de Lodos de la PTAP de Viterbo	71.682.241,0	0,0	0,00%	2022	ALTO	3
247	VITERBO	ACUEDUCTO	Construccion acueducto nueva fuente de abastecimiento Viterbo	1.583.447.222,0	0,0	0,00%	2028	BAJO	3
248	VITERBO	ACUEDUCTO	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Viterbo Etapa 1	160.455.207,0	77.474.534,8	48,28%	2024	MEDIO	3
249	VITERBO	ACUEDUCTO	Reposicion y Mejoramiento del acueducto de Viterbo Etapa 2	284.276.456,0	0,0	0,00%	2025	BAJO	3
250	VITERBO	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 1	202.355.647,0	202.355.647,0	100,00%	2023	SIN RESGGO	3
251	VITERBO	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 2	236.475.782,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	3
252	VITERBO	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 3	236.475.782,0	0,0	0,00%	2025	BAJO	3
253	VITERBO	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 4	236.475.782,0	0,0	0,00%	2026	BAJO	3
254	VITERBO	ALCANTARILLADO	Reposicion y Mejoramiento del alcantarillado de Viterbo Etapa 5	236.475.782,0	0,0	0,00%	2029	BAJO	3
255	VITERBO	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 1	356.808.640,0	30.738.227,0	8,61%	2022	ALTO	3
256	VITERBO	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 2	356.808.640,0	0,0	0,00%	2024	MEDIO	3
257	VITERBO	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 3	356.808.640,0	0,0	0,00%	2027	BAJO	3
258	VITERBO	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 4	356.808.640,0	0,0	0,00%	2028	BAJO	3
259	VITERBO	ALCANTARILLADO	Obras correspondientes al PSMV de Viterbo Etapa 5	356.808.64					

- Se dió apoyo en la revisión de la parte técnica de varias propuestas de Solicitudes Privadas de Ofertas.
- Se realizó acompañamiento al seguimiento de información de ejecución de proyectos hasta el 31 de junio de 2023 para cargar en el sistema único de información (SUI) de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios.
- Se dio respuesta a Radicado No 2023-IE-00020926 respecto al Nuevo PSMV del Municipio de San José.



 Empocaldas  empocaldas\_oficial  
 empo@empocaldas.com.co  
 www.empocaldas.com.co

1600-2023-IE-00002673  
Manizales, 26 de Julio de 2023

SEÑORA  
ADRIANA MERCEDES MARTÍNEZ GÓMEZ  
SUBDIRECTORA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  
CALLE 21 # 23-22  
MANIZALES- CALDAS

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
  
Al contestar cite:  
**2023-IE-00002673**  
26/07/2023 23:43:12 PM Folios: 1

Referencia: Respuesta a Oficio 2023-IE-00020926 del 25 de julio de 2023. PSMV Municipio de San José. Expediente 500-15-2022-0002


Muy atentamente le remitimos dentro del Anexo 10 los documentos técnicos actualizados respecto al proyecto programado por el Plan Departamental de Aguas (PDA) respecto a la construcción de la Red de Alcantarillado y su respectiva PTAR del Sector Norte del Municipio de San José.

De igual forma se anexa todo el Nuevo Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV con las respectivas correcciones en el cronograma de ejecución respecto al proyecto mencionado anteriormente.

Es importante aclarar que dentro del Anexo 7 Plan de Acción, Financiación y Cronograma, el Programa 3.1 hace referencia al proyecto mencionado en el Párrafo 1 y el cual está a cargo del Plan Departamental de Aguas (PDA), oficina adscrita a la Gobernación de Caldas.

Por último, el Programa 3.2 hace referencia a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Principal del Municipio de San José y el cual está a cargo del Municipio y Empocaldas S.A. E.S.P. y su fuente de financiación será principalmente obtenida de recursos externos que se puedan gestionar por parte de la administración Municipal y las directivas de la empresa.

Cordialmente,

  
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
Gerente (E)

  
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA  
Jefe Depto. Planeación y Proyectos

Anexo: Lo enunciado  
Elaboró: Iván Mateo Muñoz Martínez - Profesional Auxiliar.  
Revisó: Andrés Felipe Grisales S. - Coordinador de Gestión Ambiental y Recursos Hídricos  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS

Página 1 de 1

 Carrera 23 No. 75 - 82 Manizales - Caldas  
PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9  
27/07/2023 08:28:56 AM Folios: 1

**Nota:** Todas las actuaciones expuestas anteriormente se encuentran ajustadas a las actividades encomendadas

Cordialmente,

  
**IVÁN MATEO MUÑOZ MARTÍNEZ**  
C.C. 1.053.856.851 de Manizales, Caldas  
Contratista



**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co


Manizales, julio 31 de 2023

**EL COORDINADOR DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A  
E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 017 DE 2023**

**CERTIFICA QUE:**

El contratista IVÁN MATEO MUÑOZ MARTÍNEZ, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 1.053.856.851 de Manizales Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que me reporta en el Acta Parcial No. 07 del contrato No. 017 de 2023.

Para constancia se firma a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2023.

  
**DIEGO ALEJANDRO PATIÑO RINCON**  
Coordinador Acueducto y Saneamiento  
Supervisor  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



## GESTIÓN FINANCIERA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE.

F-GF-02  
Versión: 07  
2023-02-22

Nit  
Dirección  
Responsabilidad Fiscal

890803239  
Av Santander 75 - 82  
R-99-PN

CIU  
Resolución DIAN  
Autorizada

3600  
18764032358620  
del 1 al 3000 Vig. 02/08/2023

### DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	<u>IVAN MATEO MUÑOZ MARTINEZ</u>	NIT/CEDULA	<u>1053856851</u>
DIRECCIÓN	<u>CARRERA 17 #64A-106</u>	CIUDAD	<u>MANIZALES</u>
TELÉFONO	<u>3106018887</u>	EMAIL	<u>imateomunozm@gmail.com</u>
FORMA DE PAGO	<u>Pagos Parciales</u>	MEDIO DE PAGO	<u>Instrumento no definido</u>
FECHA DE VENCIMIENTO	<u>31/07/2023</u>	RESPONSABILIDAD FISCAL	<u>R-99-PN</u>
SECCIONAL	<u>Manizales</u>	OK	
CENTRO DE COSTO	<u>amento de Planeación y Pro</u>	COD. CENTRO DE COSTO	<u>106001</u>
NRO. CONTRATO	<u>17</u>		
ACTA NRO.	<u>7 y parcial</u>		


### DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS; CON ENFASIS EN EL SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS, PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADOS Y PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO.

TOTAL 5.815.800,00

VALOR EN LETRAS

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE

  
NOMBRE: IVAN MATEO MUNOZ MARTINEZ  
CÉDULA: 1.053.856.851

### DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	3.861.109,62
ALCANTARILLADO	1.954.690,38
<b>TOTAL</b>	<b>5.815.800,00</b>
