	F-GC-22 Versión 6 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA	

# CONTRATO Y AÑO	Resolución 00040-2018 Y DE PAGO 00063	Acta N°	01 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	2.000.000	
				2. VALOR ADICION (+)	0	
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO			3. VALOR TOTAL (1+2)	2.000.000	
NIT O CC:	4,413,512			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0	
CDP (#, rubro y fecha)	00251 DEL 24 DE ENERO DE 2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.000.000	
RP (#, rubro y fecha)	000252 DEL 29 DE ENERO DE 2018			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	0	
OBJETO DEL CONTRATO:	ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONDUCCIÓN LA JULIA MUNICIPIO DE VITERBO					
TIPO DE RECURSOS	Propios	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO				
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>					✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					/	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					/	X
3- Pagos al FIC					/	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					/	
5- Informe de actividades o Bitácora.					/	X
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					/	X
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					/	
8- Ensayos de densidad.					/	X
9- Diseño de Mezclas.					/	X
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					/	X
11- Trazabilidad de la tubería. Formato F-GC-28					/	X
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					/	X
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					/	X

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.


Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Susy Gonzalez A  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

05. Mar. 2018.  
FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		✓
Factura original o Documento equivalente		
Acta original		
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		
Copia del Registro Presupuestal		
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		

Fecha de presentación \_\_\_\_\_


<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
Luis Fernando Arias Vásquez	Interventor Zona Occidente	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
70-55618386-7	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO




2. Concepto:  0  2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario: 14435081180



(415)7707212489984(8020) 000001443508118 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 4 4 1 3 5 1 2 - 7

6. DV: 7

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Manizales

14. Buzón electrónico: 10

**IDENTIFICACION**

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida  2

25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía  1 3

26. Número de identificación: 4 4 1 3 5 1 2 1

27. Fecha expedición: 1 9 6 9 1 0 1 7

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 6 9

29. Departamento: Caldas

30. Ciudad/Municipio: Chinchiná

31. Primer apellido: VALLEJO

32. Segundo apellido: HERRERA

33. Primer nombre: HERNANDO

34. Otros nombres: ANTONIO

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

**UBICACION**

38. País: COLOMBIA

39. Departamento: Caldas

40. Ciudad/Municipio: Chinchiná

41. Dirección principal: CR 10 2 13

42. Correo electrónico: hermandovallejo\_2013@live.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 1 4 8 4 4 6 5 9 7

45. Teléfono 2:

**CLASIFICACION**

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código:	51. Código:	
4 3 2 2	2 0 0 8 1 2 0 1	0 0 1 0	2 0 1 0 1 0 6 0 1	1 2		

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código: 1 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

# 12- Ventas régimen simplificado

**Obligados aduaneros**

**Exportadores**

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			57. Modo			
													58. CPC			

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI  NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 7 1 0 1 0

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.  
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  
Firma autorizada:


984. Nombre: VALLEJO HERRERA HERNANDO ANTONIO  
985. Cargo: CONTRIBUYENTE


**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034**  
**CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	4413512
Primer Nombre ó Razón Social	HERNADO ANTONIO
Primer Apellido (si es Persona natural)	VALLEJO
Tipo de documento	Cédula de Ciudadania
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CARRERA 10 No. 2 - 13
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3148446597
Correo electrónico	finance2@cinapec.com.co
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	01
Nombre Obra	EMPOCALDAS ZONA OCCIDENTE
Fecha Inicio Obra	30/01/2018
Fecha Terminación Obra	31/01/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	VITERBO
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	ENERO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$2,000,000.00
Costo Total Mano de Obra	\$2,000,000.00
Número de Trabajadores en el Periodo	1
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$19,531.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$19,531.00
Total Pagado	\$19,531.00
Valor del Pago	\$19.531,00
IP Origen	190.254.225.242
Nro. de Factura o Referencia de Pago	60628278
Fecha de Creación	20/02/2018 03:12:03 p.m.
Banco	BANCO DAVIVIENDA
Número de Confirmación/CUS	316183570
Estado de la Transacción	APROBADA

**Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.**

	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTION FINANCIERA														
F-GF-02 Versión 2 Enero de 2010	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA														
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS NIT. 890.803.239.9															
CENTRO DE COSTOS	CODIGO DEL PROCEDIMIENTO	No. 4													
REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566 FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA (LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)															
CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES FEBRERO 26 DEL 2018														
NOMBRES Y APELLIDOS:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA														
CEDULA O NIT:	4413512														
DIRECCION:	CARRERA 10 NO. 2-13 CHINCHINA CALDAS	TEL: 3148446597													
DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN															
POR CONCEPTO DE:	ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONDUCCIÓN LA JULIA MUNICIPIO DE VITERBO														
<table border="0"> <tr> <td>SUBTOTAL:</td> <td></td> <td>2.000.000</td> </tr> <tr> <td>RETENCION RENTA:</td> <td>\$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IVA ASUMIDO ( ):</td> <td>\$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR:</td> <td></td> <td>2.000.000</td> </tr> </table>				SUBTOTAL:		2.000.000	RETENCION RENTA:	\$		IVA ASUMIDO ( ):	\$		TOTAL A PAGAR:		2.000.000
SUBTOTAL:		2.000.000													
RETENCION RENTA:	\$														
IVA ASUMIDO ( ):	\$														
TOTAL A PAGAR:		2.000.000													
															
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR															
CC. 4413512															

 F-GC-20 Versión 2 Octubre 2016	<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b> <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL</b>	

Informe Número	1	Fecha del informe	22 de diciembre de 2017	Acta parcial		Acta final	X
----------------	---	-------------------	-------------------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	Resolución 0040-2018
Objeto:	ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONDUCCIÓN LA JULIA MUNICIPIO DE VITERBO
Nombre Contratista:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO
Fecha del contrato:	29 DE ENERO DE 2018
Plazo de ejecución:	2 días calendario
Valor inicial:	\$ 2.00.000
Fecha de iniciación:	30 de enero de 2018
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reiniciación:	N/A
Fecha de terminación inicial:	31 de enero de 2018
Nueva fecha de terminación:	N/A
Adición en valor:	0
Adición en tiempo:	N/A
Supervisor:	LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ


1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

En horas de la mañana del sábado 27 de enero de 2018, se presentó daño en la red de conducción de la bocatoma la Julia, la más importante y de mejor calidad para el municipio de Viterbo, pues genera 46 litros de agua. El daño está en un tramo de 10" en tubería de polietileno, ubicado en predio particular, donde estaba una maquina laborando y la rompió, por lo que procedió a desviar el agua desde la bocatoma, la falta de este caudal hace que se tenga que racionar el servicio de acueducto a los 4.138 usuarios del municipio, aproximadamente unos 15.724 habitantes. Se debe excavar brecha y hacer termofusión.

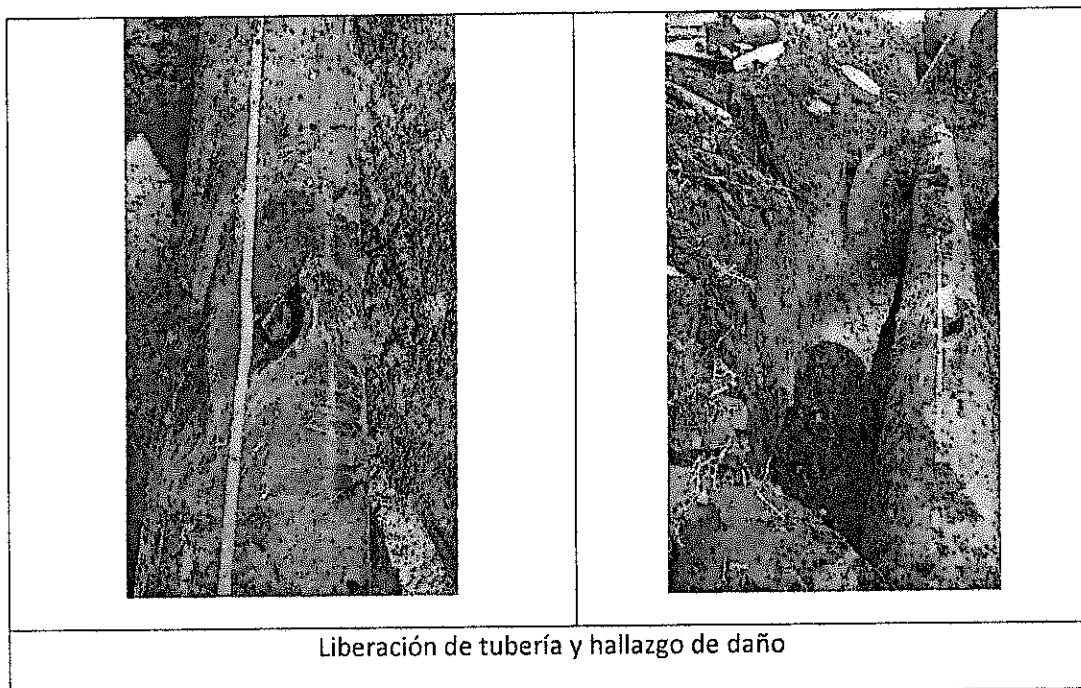
La obra se ejecuta a cabalidad no se presentan inconvenientes, se realizan actividades de Termofusión de tubería de polietileno de 10" PN 16 PE 100 incluyo mano de obra, excavación, equipo de termo fusión, transporte y acarreo de equipo al hombro .

 F-GC-20 Versión 2 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.2. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	2 días
Tiempo total transcurrido:	2 días
Avance Porcentual:	100%

1.3. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)





F-GC-20  
Versión 2  
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL




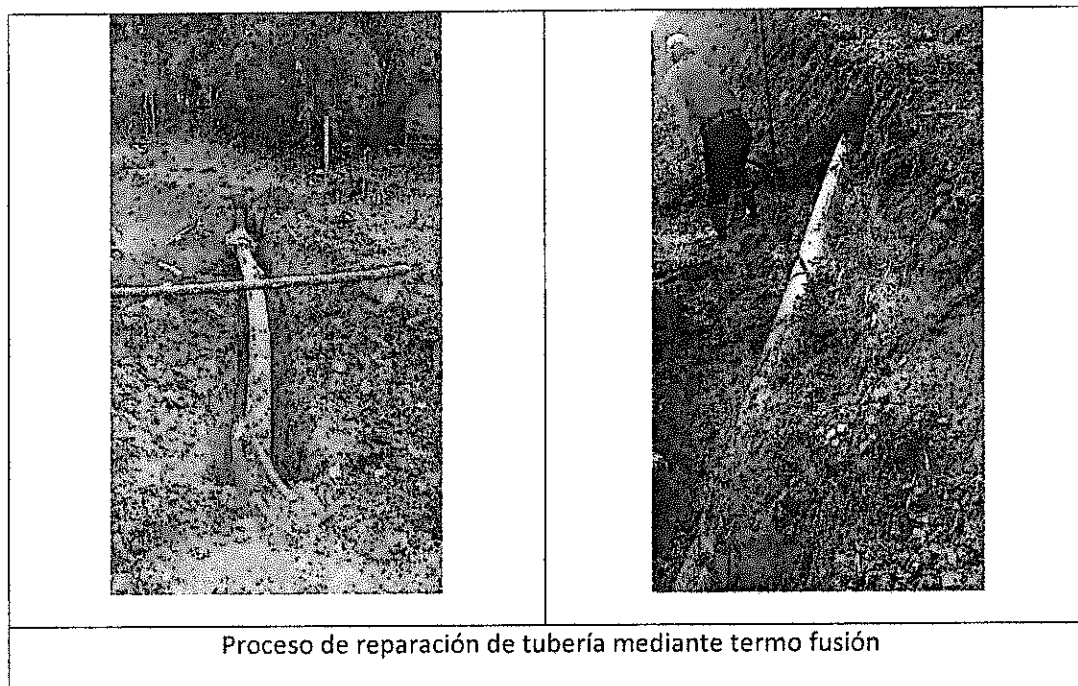
Proceso de reparación de tubería mediante termo fusión



Proceso de reparación de tubería mediante termo fusión



 F-GC-20 Versión 2 Octubre 2016	<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b> <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL</b>




#### 1.4. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 2.000.000
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 2.000.000
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	\$ 2.000.000
Porcentaje total ejecutado:	100%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra) No se requieren pólizas según la resolución de pago por ser monto inferior a 10 SMMLV.

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

CASCOS	GAFAS	CHALECO	GUANTES	BOTIQUIN	CAMILLA	ARNES	L.VIDA	TAPABOCA	TAPA OIDO	DIADEMA	BOTAS
X	X	X	X	X	X	X	NA	X	X	X	X

 F-GC-20 Versión 2 Octubre 2016	<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b> <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL</b>

- 4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
- 5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	
	A	A	A	A	A	A	A	A	
Convenciones: A:adecuada - D:deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica									

6. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios		X
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra		X
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		X
Paz y Salvo oficina de trabajo.		X
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.		X
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1	4
---	---

LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ  
 NOMBRE DEL SUPERVISOR

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL SUPERVISOR

ACTA No 1 RECIBO FINAL

CONTRATO N°: Resolución 00040-2018  
 MODALIDAD DE DIRECTA  
 CONTRATACION: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
 CONTRATANTE:  
 REPRESENTANTE LEGAL:


OBJETO: ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONDUCCIÓN LA JULIA MUNICIPIO DE VITERBO

CONTRATISTA: HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA  
 MUNICIPIO: VITERBO - CALDAS  
 COSTO DIRECTO: \$ 1.538.462  
 Administración %: \$ 307.692  
 Imprevistos %: \$ 76.923  
 Utilidad %: \$ 76.923  
 TOTAL: \$ 2.000.000  
 RECURSOS: PROPIOS  
 INTERVENTOR: LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ  
 RP 000252 DEL 29 DE ENERO DE 2018

En la ciudad de Viterbo a los 31 días del mes de enero de 2018, se reunieron los señores LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ Ingeniero de la Zona Occidente de Empocaldas S.A. E.S.P. y el señor HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA como contratista, con el fin de realizar el acta de recibo final del contrato No Resolución 00040/2018.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR TOTAL
1	Lleno compactado con material de excavación	M3	1,00	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000
2	Lleno compactado con material de excavación	M3	1,00	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000
3	Termofusión de tubería de polietileno de 10" PN 16 PE 100 incluye mano de obra, excavación, equipo de termofusión, transporte y acarreo de equipo al hombro	GL	1,00	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000
COSTO DIRECTO					\$ 1.538.462
ADMINISTRACION 20%					\$ 307.692
IMPREVISTO 5%					\$ 76.923
UTILIDAD 5%					\$ 76.923
VALOR					\$ 2.000.000

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella.

  
 LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ  
 Interventor Zona Occidente  
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P

  
 HERNANDO ANTONIO VALLEJO  
 Contratista


EMPOCALDAS A.S. E.SP.  
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
ZONA OCCIDENTE

CONTRATO No.: Resolución 00040-2018		ACTA No.: 01 y final		FECHA CORTE: ENERO 31 DE 2018		PORCENTAJE TOTAL EJECUTA			
OBJETO CONTRATO: ATENCIÓN DE EMERGENCIA DE CONDUCCIÓN LA JULIA MUNICIPIO DE VITERBO		FECHA INICIACIÓN: Enero 30 de 2018		FECHA: ENERO 31 DE 2018		100%			
CONTRATISTA: HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA		SUPERVISOR: LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ		VALOR ADICIONAL:					
ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANTIDAD	VR.UNITARIO	CONTRATUAL VR.UNITARIO	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD/VR.UNITARIO	PRESENTE ACTA CANTIDAD/VR. PARCIAL/VR. EJECUT.	ACUMULADO PRESENTE ACTA CANTIDAD VR. TOTAL	% EJECUT.
1	En material común	m3	7,20	25.000	25.000	0,00	7,20	180.000	100%
2	Lleno compactado con material de excavación	m3	6,50	17.000	17.000	0,00	6,50	110.500	100%
3	Termofusión de tubería de polietileno de 10" PN 16 PE 100 incluye mano de obra, excavación, equipo de termofusión, transporte y acarreo de equipo al hombro	GL	1,00	1.709.500	1.709.500	0,00	1,00	1.709.500	100%
<b>COSTO TOTAL</b>								<b>2.088.000</b>	

TOTAL COSTO DIRECTO ACTA 01 Y FINAL	1.538.462
ADMINISTRACION	307.692,00
IMPREVISTOS	76.923,00
UTILIDAD	76.923,00
SUMA	2.000.000,00
TOTAL ACTA No 01 Y FINAL	2.000.000,00
AMORTIZACION ANTIPO	0,00
TOTAL A PAGAR PRESENTA ACTA	2.000.000,00

SON: DOS MILLONES DE PESOS MCTE.  
RESUMEN DEL CONTRATO:  
Valor del Contrato ( Fecha: ) ENERO 31 DE 2018  
Valor Acta No. 01 Y FINAL  
Saldo del Contrato  
SUMAS IGUALES

2.000.000
0
2.000.000

  
Vc. Bo.: LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ  
ING. ZONA OCCIDENTE  
SUPERVISOR

  
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA  
Contratista

**MEMORIAS DE CANTIDADES**  
**ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONDUCCIÓN LA JULIA MUNICIPIO DE VITERBO**

Item:	1	En material común			Unidad:	m3	
No.	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Largo	Ancho	Alto			
		10,00	0,80	0,90	7,20	7,20	
		TOTAL PRE-ACTA			7,20		

Item:	2	Lleno compactado con material de excavación			Unidad:	m3	
No.	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Largo	Ancho	Alto			
		10,00	0,80	0,90	7,20	7,20	
		TOTAL PRE-ACTA			7,20		

Item:	3	Termofusión de tubería de polietileno de 10" PN 16 PE 100 incluye mano de obra, excavación, equipo de termofusión, transporte y acarreo de equipo al hombro			Unidad:	GL
No.	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad				
		1,00		1,00	1,00	
		TOTAL PRE-ACTA			1,00	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

000063



RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO DE LA RESOLUCION NUMERO 00040 DEL 29 DE ENERO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE VITERBO CALDAS.

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en uso de sus facultades conferidas mediante Escritura No. 1483 de Diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y Escritura No. 2214 de noviembre de 2.004 de la Notaria Quinta de Manizales, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No.00040 del 29 de enero del 2018, se declaró la situación de Emergencia en el Municipio de Viterbo, Caldas.

Que las circunstancias que dieron origen a la declaratoria de Emergencia en el Municipio de Viterbo, Caldas, fueron sustentadas mediante oficio No. VT-2018-II-00000674 e informe de fecha 29 de enero del 2018 enviado por la señora administradora de la seccional de Viterbo encargada Gloria Amparo Montes, solicita se declare la situación de emergencia, debido a que en horas de la mañana del sábado 27 de enero del 2018, se presentó daño en la red de conducción de la bocatoma la Julia, las importante y de mejor calidad para el Municipio de Viterbo, pues genera 46 litros de agua. El daño está en un tramo de 10" en tubería de polietileno, ubicado en predio particular, donde estaba una maquina laborando y la rompió, por lo que se procedió a desviar el agua desde la bocatoma, la falta de este caudal hace que se tenga que racionar el servicio del acueducto a los 4.318 usuarios del municipio, aproximadamente unos 15.724 habitantes. Se debe excavar y hacer termo fusión. "

EMPOCALDAS SA ESP, no cuenta con el equipo para realizar la termo fusión, por lo anterior es necesario contratar a un tercero para que realice la reparación de la tubería de polietileno de alta densidad.

Que la situación de la "URGENCIA" se presenta de acuerdo al Manual de Contratación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., "cuando existan razones que no permitan prever la ocurrencia de situaciones que puedan afectar la operación, la seguridad de las personas o de los bienes o de la prestación del servicio".(Artículo 46).

Que el daño en la conducción La Julia Viterbo, fue suficiente para declarar la Emergencia, por cuanto el escenario antes anotado puso en riesgo a la comunidad que cubre al municipio de Viterbo, Caldas

Handwritten signature and date stamp: 74 FEB 2018



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX :(+576) 886 7080
NIT: 890.803.239-9
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



000063



RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO DE LA RESOLUCION NUMERO 00040 DEL 29 DE ENERO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE VITERBO CALDAS.

Que para superar la situación antes anotada, se hizo necesario contratar al señor Hernando Antonio Vallejo Herrera.

Que las cantidades para atender la Emergencia en el Municipio de Viterbo, se especificaron en el Formato F-AG-06 de fecha 29 de enero del 2018.

Que dicha contratación se ejecutó con recursos propios de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Que la obra consistió en la reparación de la tubería por termo fusión en la Emergencia de Viterbo conducción la Julia.

Que para asegurar el pago al contratista se llevó a cabo el proceso de registro presupuestal vigencia 2018 No. 000252 por un valor de \$2.000.000.

Que después de superada la emergencia, se efectuó visita para verificar y recibir los trabajos contratados, por parte de la interventoría y el contratista, los cuales se recibieron a satisfacción y tuvieron un costo total de DOS MILLONES DE PESOS (\$2.000.000) incluido AIU.

A continuación se ilustra las cantidades de obra ejecutadas para atender la situación de emergencia.

*[Handwritten signature]*

ESPACIO EN BLANCO

76 FEB 2018



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas  
PBX :(+576) 886 7080  
NIT: 890.803.239-9  
empo@empocaldas.com.co  
www.empocaldas.com.co



*[Handwritten signature]*

00063



RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO DE LA RESOLUCION NUMERO 00040 DEL 29 DE ENERO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE VITERBO CALDAS.

EMPOCALDAS A.S. E.S.P. EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS ZONA OCCIDENTE										
CONTRATO No.:		Resolución 00040-2018		ACTA No.:		FECHA Corte:		PORCENTAJE TOTAL EJECUTA		
OBJETO CONTRATO:		ATENCIÓN DE EMERGENCIA COMUNICACIÓN LA JULIA MUNICIPIO DE VITERBO		FECHA INICIACION:		FECHA		ENERO 31 DE 2018		
CONTRATISTA:		FERRAZO ZATEÑO VALLEJO PEREZ SUPERVISOR		PLAZO ADICIONAL:		VALOR ADICION:		ENERO 31 DE 2018		
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% DE OBRA	CANTIDAD ANTICIPADA	VALOR PRESENTE ACTA	AGREGADO PRESENTE ACTA	
1	Trasero de tubería	m3	7,20	25.000	180.000	9,00%	0	7,20	180.000	100%
2	Llamo compactado con material de extracción	m3	6,50	17.000	110.500	5,54%	0	6,50	110.500	100%
3	Formulación de tubería de polietileno de 10" PN 16 PE 100 incluye mano de obra, excavación, equipo de terminación, transporte y suero de equipo al hombre	GL	1,00	1.709.500	1.709.500	85,46%	0	1,00	1.709.500	100%
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>2.000.000</b>			<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	

TOTAL COSTO DIRECTO ACTA 01 Y FINAL	1.538.467
ADMINISTRACION	307.897,37
IMPREVISTOS	76.977,00
UTILIDAD	76.977,00
SUMA	2.000.000,00
TOTAL ACTA 01 Y FINAL	2.000.000,00
Autorización Anticipo	0,00
TOTAL A PASAR PRESENTE ACTA	2.000.000,00

2.000.000	2.000.000
0	2.000.000

SON: DOS MILLONES DE PESOS MCTE.  
RESUMEN DEL CONTRATO:  
Valor del Contrato (Fecha) ENERO 31 DE 2018

Estado del Contrato  
SUMAS IGUALES

*[Signature]*  
FERRAZO ZATEÑO VALLEJO PEREZ  
Contract



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas  
PBX : (+576) 886 7080  
NIT: 890.803.239-9  
empo@empocaldas.com.co  
www.empocaldas.com.co





**RESOLUCION No.**

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO DE LA RESOLUCION NUMERO 00040 DEL 29 DE ENERO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE VITERBO CALDAS.**

Que en consecuencia de lo anterior, debe efectuarse el correspondiente pago al señor Hernando Antonio Vallejo Herrera, contratista, por un valor de DOS MILLONES DE PESOS (\$2.000.000) incluido AIU.

Que en mérito de lo expuesto el Representante Legal de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P.

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Reconocer al señor Hernando Antonio Vallejo Herrera, con cédula de ciudadanía No. 4.413.512, la suma de DOS MILLONES DE PESOS (\$2.000.000) incluido AIU, previos los descuentos de Ley.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Autorizar al jefe de Presupuesto de EMPOCALDAS S.A E.S.P. para que proceda a la liberación del saldo restante.

**ARTICULO TERCERO:** Autorizar al Tesorero Pagador de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., para que cancele al señor Hernando Antonio Vallejo Herrera, con cédula de ciudadanía No. 4.413.512, la suma de DOS MILLONES DE PESOS (\$2.000.000) incluido AIU, Una vez el supervisor Revise y Autorice por medio del trámite de la Lista de Chequeo para el pago de actas. Valor al cual se le realizaran los descuentos de Ley

**COMUNIQUESE Y CÚMPLASE**


Dada en la ciudad de Manizales,

**CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA**  
**GERENTE**

**FERNANDO HELY MEJA ALVAREZ**  
Secretario General

**ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE**  
Jefe Sección Contratación

**SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS**  
Jefe Depto de Operación y Mantenimiento

	F-AG-07	EMPOCALDAS S.A E.S.P
	Versión 1 Enero 2017	EVALUACION ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

## MEMORIA DEL EVENTO


FECHA Y HORA DE LA EMERGENCIA	27 de enero de 2018 1:00 p.m
FECHA Y HORA EN LAS QUE SE REGRESA A LAS CONDICIONES DE NORMALIDAD	31 de enero de 2018 6:00 p.m
BREVE DESCRIPCION	El día 27 de enero de 2018 se siendo la 1:00 p.m se presentó daño en la conducción de la bocatoma la julia del municipio de Viterbo. La rotura de la tubería de polietileno de 10", ubicada en predio particular, donde una máquina pesada laborando la rompio. Esto genero la resolución 00040/2018 y de esta forma se realiza la reparación de la tubería que tubo una duración de 2 días.
POSIBLES CAUSAS	Máquina retroexcavadora
IMPACTO DE LA EMERGENCIA	Racionamiento del servio en el Municipio de Viterbo
NUMERO DE USUARIOS AFECTADOS	15,724 habitantes


## CHEQUEO DE LAS ACCIONES DEL EVENTO

ASPECTO EVALUADO	SI	NO	OBSERVACIONES
La emergencia estaba contemplada dentro del plan de emergencia y contingencia	X		
Se habían realizado simulacros previos de esta emergencia?		X	
El protocolo de actuación se activó según lo previsto en el plan de emergencia y contingencia?	X		
El comité de emergencias cumplió con las funciones establecidas	X		
Se encontró disponible el stock de materiales necesarios para superar esta emergencia	X		
Se cumplió lo establecido en materia de comunicaciones?	X		
La emergencia fue superada en el tiempo previsto?	X		
Fue necesario solicitar apoyo de entes Externos?		X	
Fue necesario solicitar apoyo de personal de otras seccionales?		X	

Fecha de la evaluación

Febrero 12, 2018

  
 Nombre y Cargo de quien evalúa

  
 Firma

Firma
