 F-GC-22 Versión 10 Junio 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA	

# CONTRATO Y AÑO	ACTO 024 DE 2022	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	17.773.280
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA			2. VALOR ADICION	0
NIT O CC:	4.413.512			3. VALOR TOTAL (1+2)	17.773.280
CDP (#, rubro y fecha)	000487 DEL 28 DE MARZO DE 2022			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
RP (#, rubro y fecha)	000616 DEL 20 DE ABRIL DE 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	17.679.060
				6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	94.220

OBJETO DEL CONTRATO: REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCION CAMPOALEGRE SECTOR TARAPACA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS	✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	✓	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	NA	
3- Pagos al FIC	✓	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	✓	
5- Informe de actividades o Bitácora.	✓	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	✓	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	✓	
8- Ensayos de densidad.	NA	
9- Diseño de Mezclas.	NA	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	NA	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	NA	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	NA	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	NA	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	✓	
15- Acta parcial o final del contrato.	✓	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.


Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓
Factura original o Documento equivalente	
Acta parcial o final del contrato.	
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	
Copia del registro presupuestal	

Fecha de presentación

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO ZONA CENTRO - NORTE	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
70556183867	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ALG. PATRY
09-06-2022
2:10pm



HERNANDO ANTONIO VALLEJO
HERRERA
NIT 4.413.512-7
CR 10 2 13
Tel: (036) 3116183675
Chinchiná - Colombia
claudi3032@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE-54

Señores	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUDIENDO EMPLEAR LA EXPRESION ABREVIADA EMPOCAL		
NIT	890.803.239-9	Teléfono	(036) 8867080
Dirección	CR 23 75 82	Ciudad	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/06/2022, 07:57
Expedición	10/06/2022, 13:54
Vencimiento	10/06/2022

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCION CAMPO ALEGRE SECTOR TARAPACA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS	13,100,452.00	13,100,452.00
2	ADMINISTRACION	3,144,108.00	3,144,108.00
3	IMPREVISTOS	655,023.00	655,023.00
4	UTILIDADES	655,023.00	779,477.37

Total items: 4

Valor en Letras:

Diecisiete millones seiscientos setenta y nueve mil sesenta pesos m/cte con treinta y siete cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 17,679,060.37


Observaciones:

Total Bruto	17,554,606.00
IVA 19%	124,454.37
Total a Pagar	17,679,060.37

Elaborado por software Sligo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sligo. Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764026373083 aprobado en 20220308 prefijo FE desde el número 45 al 150 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa
CUFE: 5d8676d81a682b556e325fdb55701fb9cfd3826ca2a73512cd3be2e526393508d037dcd0fe2058234dbb24634a7e9ce8



Comprobante de pago en línea

ASOPAGOS

Pago realizado por: CLAUDIA PATRICIA VILLEGAS MUÑOZ

Nro. de recibo: 23275589

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.11.80

Concepto: CC

Razón Social: 4413512

Fecha y hora de la transacción: Lunes 6 de Junio de 2022 09:15:01 AM

Nro. de comprobante: 0000047906

Valor pagado: \$ 194,600.00

Cuenta: *****7145

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA Identificación: CC-4413512 Código dependencia o sucursal: 002 Nombre dependencia o sucursal: independiente Fecha de generación del reporte: 2022-06-06 Fecha límite de pago: 2022-06-03 Fecha de pago: 2022-06-06 Pagada por: BANCOLOMBIA Período pensión: 2022-05 Período salud: 2022-05 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: I Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 23275589	Pagada
---	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$0	\$0	\$0	\$125.000	\$125.000	<input type="checkbox"/>
14-11	890903790	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	1	\$0	\$0	\$0	\$69.600	\$69.600	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$0	\$194.600	\$194.600	

Imprimir | **Descargar Resumen**

CONSULTA EMPLEADO

RAZON SOCIAL	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
IDENTIFICACION APORTANTE	CC-4413512
SUCURSAL	002
FECHA PAGO	2022-06-08
IDENTIFICACION EMPLEADO	CC-4413512
NOMBRE EMPLEADO	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
EPS	SAJUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
APP	SIN APP
CAJA COMPENSACION	SIN CCF
ARL	ARL SUPA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NUMERO PLANILLA	23275589
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	1
PERIODO PENSION	2022-05
PERIODO SALUD	2022-05
TIPO COTIZANTE	Independiente voluntario al sistema de riesgos laborales
SUBTIPO COTIZANTE	Cotizante con requisitos cumplidos para pension
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SUN	Fecha Sin Inicio	Fecha Sin Fin	IEE	Fecha IEE Inicio	Fecha IEE Fin	LMA	Fecha LMA Inicio	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	RL	Fecha RL Inicio	Fecha RL Fin
-----	-----------	-----	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----------	-----	-----	-----	------------------	---------------	-----	------------------	---------------	-----	------------------	---------------	-----	------------------	---------------	-----	-----	------------------	---------------	----	-----------------	--------------

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria	Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
0	0	0,0000000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G	Valor	Licencias de Maternidad o	Valor
30	1,000,000	0,1250000	\$ 125,000	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES


Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de Centro de trabajo
30	1,000,000	0,0696000	\$ 69,600	17174

APORTES PARAFISCALES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	ICBF	ESAP	MIN DE EDUCACION
0	0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000

TOTAL COTIZACION EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 0	\$ 125,000	\$ 69,600	\$ 0	\$ 194,600



Comprobante de pago en línea

ASOPAGOS

Pago realizado por: CLAUDIA PATRICIA VILLEGAS MUÑOZ

Nro. de recibo: 23490650

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.11.80

Concepto: CC

Razón Social: 4413512

Fecha y hora de la transacción: Lunes 6 de Junio de 2022 09:12:49 AM

Nro. de comprobante: 0000076182

Valor pagado: \$ 609,200.00

Cuenta: *****7145

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA Identificación: CC-4413512 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2022-06-06 Fecha limite de pago: 2022-06-03 Fecha de pago: 2022-06-06 Pagada por: BANCOLOMBIA Período pensión: 2022-05 Período salud: 2022-06 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 23490650	Pagada
---	--------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
230301	800224808	PORVENIR	1	\$0	\$0	\$0	\$219.200	\$219.200	<input type="checkbox"/>
Subtotal Pensión		1	1	\$0	\$0	\$0	\$219.200	\$219.200	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$0	\$0	\$0	\$171.300	\$171.300	<input type="checkbox"/>
Subtotal Salud		1	1	\$0	\$0	\$0	\$171.300	\$171.300	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	\$0	\$0	\$0	\$95.400	\$95.400	<input type="checkbox"/>
Subtotal ARL		1	1	\$0	\$0	\$0	\$95.400	\$95.400	
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	1	\$0	\$0	\$0	\$54.800	\$54.800	<input type="checkbox"/>
Subtotal CCF		1	1	\$0	\$0	\$0	\$54.800	\$54.800	
PASENA	899999034	SENA	1	\$0	\$0	\$0	\$27.400	\$27.400	<input type="checkbox"/>
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$0	\$0	\$0	\$41.100	\$41.100	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$0	\$609.200	\$609.200	

Imprimir **Descargar Resumen**

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	✓	HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA
IDENTIFICACION APORTANTE	✓	CC-4413512
SIUCURSAL	0	
FECHA PAGO	2022-06-06	
IDENTIFICACION EMPLEADO	CC-1054986263	
NOMBRE EMPLEADO	JUAN DAVID VALLEJO GIRALDO	
EPS	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	
APP	PORVENIR	
CAJA COMPENSACION	Caja de Compensación familiar de Cajas CONFAMILARES	
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	
NÚMERO PLANILLA	23490650	
REFERENCIA PAGO(PIN)		
TIPO PLANILLA	E	
PERIODO PENSION	2022-05	
PERIODO SALUD	2022-06	
TIPO COTIZANTE	Dependiente	
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subdigo	
NOVEDAD INGRESO INICIAL		
NOVEDAD INGRESO FINAL		

NG	Fecha NG	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sin Mens	Fecha Sin Pn	Aportante	ICE	Fecha Ince Mens	Fecha Ince Pn	LMA	Fecha LMA Mens	Fecha LMA Pn	VAC	Fecha Vac Mens	Fecha Vac Pn	AVP	VCT	Fecha VCT Mens	Fecha VCT Pn	IRL	Fecha IRL Mens	Fecha IRL Pn
----	----------	-----	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----------	-----	-----	-----	----------------	--------------	-----------	-----	-----------------	---------------	-----	----------------	--------------	-----	----------------	--------------	-----	-----	----------------	--------------	-----	----------------	--------------

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Col. Obligatoria	Col. Voluntaria Afiliado	Col. Voluntaria Aportante	Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
30	1.370.000	0,1600000	\$ 219.200	\$ 0	\$ 219.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Dias Cot	IBC	Tarifa	Col. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G	Valor	Número Autorización	Valor	Libertades de Maternidad o	Valor
30	1.370.000	0,1250000	\$ 171.300	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES


Dias Cot	IBC	Tarifa	Col. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.370.000	0,0680000	\$ 95.400	17174

APORTES PARA FISCALES

Dias Cot	Caja de Compensación Familiar		Sena		ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACION					
	IBC	Tarifa	Col. Obligatoria	Tarifa	Col. Obligatoria	Tarifa	Col. Obligatoria	Tarifa	Col. Obligatoria					
30	1.370.000	0,0400000	\$ 54.800	1.370.000	0,0200000	\$ 27.400	0,0300000	\$ 41.100	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0

TOTAL COTIZACION EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 219.200	\$ 171.300	\$ 95.400	\$ 123.300	\$ 609.200



Comprobante de pago en línea

SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Pago realizado por: CLAUDIA PATRICIA VILLEGAS MUÑOZ

Nro. de factura: 75632685

Descripción del pago: Pago Ordinario - FIC

Nro. de referencia: 186.83.184.3

Nro. de referencia 2: CC

Nro. de referencia 3: 4413512

Fecha y hora de la transacción: Lunes 6 de Junio de 2022 08:59:27 AM

Nro. de comprobante: 0000067295

Valor pagado: \$ 50,000.00

Cuenta: *****7145

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	75632685	1491490104	06/06/2022

Número de Identificación

4413512

Primer Apellido (si es Persona natural)

VALLEJO

Dígito de Verificación (Si es persona

Cédula de Ciudadanía

Departamento

17

Dirección de Domicilio

CARRERA 7 No. 6 - 27

Localización

1

Correo electrónico

claudi3032@hotmail.com

Regional

17

Número Licencia de Obra

024

Nombre Obra

EMERGENCIA AGUADAS ARMA

Fecha Terminación Obra

29/04/2022

Tipo FIC

01

Mes Periodo a Pagar

4

Costo Total Mano de Obra

17679060.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

HERNADO ANTONIO

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

1700100

Ciudad de Domicilio

MANIZALES

Teléfono de Contacto

+57,314 8446597

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

024

Fecha Inicio Obra

19/04/2022

Ciudad de Ejecución de la Obra

4413512

Año Periodo a Pagar

2022

Costo Total de Obra a Todo Costo

17679060.00

Número de Trabajadores en el Periodo

2

Aporte FIC

50000.00

Valor del Pago

50000.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	75632685	1491490104	06/06/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **4413512**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.83.184.3**

Su transacción fue Total Pagado **\$ 50,000.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 50,000.00	COP\$ 50,000.00

EMPOCALDAS S.A E.SP.			
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS			
SECCIONAL FILADELFIA - CALDAS			
CONTRATO No.: ACTO 024 DE 2022	INFORME DE OBRA	DE 1	FECHA FINAL: ABRIL 30 DE 2022
REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCION CAMPO ALEGRE SECTOR TARAPACA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS			
MUNICIPIO: CHINCHINA, CALDAS.-	VALOR ACTO: \$ 17.773.280		
CONTRATISTA: HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA			
SUPERVISION: ING. JUAN PABLO ZULUAGA CORREA		FECHA: 30-04-2022	

INFORME DE OBRA

- Inicio de obra: 19 de Abril de 2022
- Plazo contractual: 30 días.
- Fecha de término de la obra: 29 de Abril de 2022
- Recibo de Obras: 29 de Abril de 2022
- Total de días para ejecución de obras: 11 días

AVANCE DE OBRA

Avance acumulado ejecutado a 29 de Abril de 2022:

99,47%

ACTIVIDADES Y REGISTRO FOTOGRÁFICO:



Localización, replanteo, transporte de tubería e inicio de actividades



Excavación, termofusión e Instalación de tubería




INFORME DE OBRA
ABRIL DE 2022

Excavación en zanja material común 0 a 2 m	Rellenos compactos con material seleccionado de excavación
	

ACUEDUCTO	
Instalación de tubería de 12" polietileno por termofusión	Instalación de tubería de 12" polietileno por termofusión
	
Anclaje tubería	Empalme reparación a red existente

INFORME DE OBRA
ABRIL DE 2022

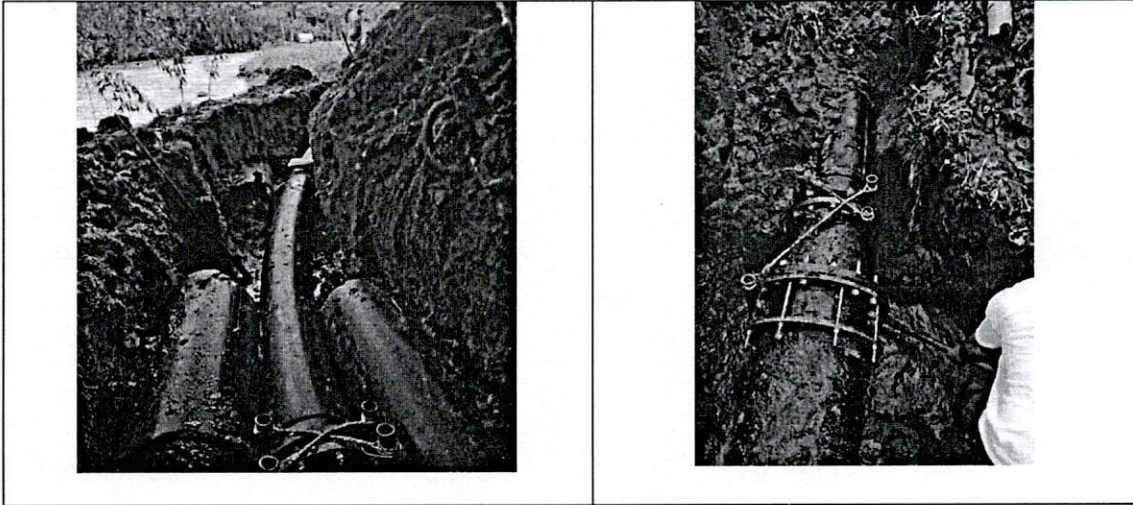

Como consecuencia a las fuertes lluvias presentadas la noche del pasado 19 de abril de 2022, la creciente del Río "Campoalegre" desempalmó cinco tubos de la conducción que surte este líquido vital a la PTAP que comparte el mismo nombre, cuestión que generó el desabastecimiento del flujo de entrada de agua a la misma. Cabe resaltar, que ese mismo día se desplegaron una serie de actividades encaminadas a realizar los empalmes necesarios para poder normalizar el abastecimiento de la planta de tratamiento de referencia.

Es preciso informar que la PTAP "Cuervos" funcionó con 60 L/s y la PTAP "Campoalegre" funcionó con 80 L/s, es decir que la población en ese momento se abasteció con 140 L/s presentándose entonces bajas de presión en algunos sectores.

Para finalizar, es importante indicar que EMPOCALDAS S.A E.S.P procedió a notificar a la población del municipio respecto a la suspensión del servicio de Acueducto que se presentó en consecuencia a la situación expuesta con anterioridad, resaltando que este fue un evento inesperado provocado por la fuerza de la naturaleza, el cual era imprevisible e irresistible.

HERNANDO A. VALLEJO HERRERA
Contratista

JHON JAIRO GIRALDO NARIÑO

CC 15.902.864

T.P 26804-T

✓ EL CONTADOR DE LA EMPRESA
✓ HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
NIT 4.413.512-7

✓ Que la empresa HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA, con Nit 4.413.512, se encuentra a **PAZ Y SALVO**, en los aportes a la seguridad social y parafiscales del mes de Abril del 2022.

En cuanto a la veracidad oportunidad de los mismos.

Firmado en Chinchiná – Caldas, a los siete (07) días del mes Junio(06) de dos mil veintidós 2022.

Atentamente;



JHON JAIRO GIRALDO NARIÑO
Contador Público Titulado
T.P. 26804-T – T J.C. Contadores

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

26804-T

JOHN JAIRO GIRALDO NARIÑO
C.C. 15902864
RES. INSCRIPCIÓN 753 DEL 05/04/1990
FUNDACION UNIVERSITARIA DE MANIZALES

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

257582





REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 15.902.864
GIRALDO NARIÑO

APellidos JOHN JAIRO

NOMBRES

John Jairo S
FIRMA



Identificación Pública S.A. 140017/0118


República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 07-JUN-1960
CHINCHINA (CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

12-JUL-1979 CHINCHINA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARNEL SÁNCHEZ TORRES

INVOCE DERECHO




A-0903400-00090723-M-0015902864-20081008 0004109994A 1 4820002221

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

819487672A899096

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JOHN JAIRO GIRALDO NARIÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15902864 de CHINCHINA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 26804-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Mayo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-4413512
SUCURSAL	002
FECHA PAGO	2022-05-06
IDENTIFICACION EMPLEADO	CC-4413512
NOMBRE EMPLEADO	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
EPS	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
AFP	Sin AFP
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	23004129
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	I
PERIODO PENSIÓN	2022-04
PERIODO SALUD	2022-04
TIPO COTIZANTE	Independiente voluntario al sistema de riesgos laborales
SUBTIPO COTIZANTE	Cotizante con requisitos cumplidos para pensión
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sin inicio	Fecha Sin Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin			
																																0	

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
0	0	0,0000000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.000.000	0,1250000	\$ 125.000	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.000.000	0,0696000	\$ 69.600	17174

APORTES PARAFISCALES

Dias Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF			ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot. Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot.	
0	0	0,0000000	\$ 0	0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 0	\$ 125.000	\$ 69.600	\$ 0	\$ 194.600

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	4413512	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 10 2 13	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	CHINCHINA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4322	CORREO ELECTRÓNICO	CLAUDI3032@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	98403316
FAX	8403316	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 04	Año: 2022	Mes: 05	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		\$2.370.000		23267977

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 04

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	2	\$379.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$379.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ. INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	2	\$94.800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$94.800	0	\$0	\$0	\$94.800	\$0	0	\$0	\$0	\$94.800	\$0	\$0	\$94.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ. INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	2	\$165.000	0	\$0	\$0	\$165.000	0	\$0	\$165.000	0	\$0	\$0	\$165.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	2	\$94.800	0	\$0	\$94.800
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR


CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$94.800
PENSIONES	1	\$379.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$165.000

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA Identificación: CC-4413512 Código dependencia o sucursal: 002 Nombre dependencia o sucursal: independiente Fecha de generación del reporte: 2022-06-07 Fecha limite de pago: 2022-05-04 Fecha de pago: 2022-05-06 Pagada por: BANCOLOMBIA Período pensión: 2022-04 Período salud: 2022-04 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: I Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 23004129	Pagada
---	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$0	\$0	\$0	\$125.000	\$125.000	<input type="checkbox"/>
14-11	890903790	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	1	\$0	\$0	\$0	\$69.600	\$69.600	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$0	\$194.600	\$194.600	

Imprimir
Descargar Resumen

 empocaldas <small>Construyendo juntos su bienestar</small>	F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	1	Fecha del informe	20-05-2022	Acta	1 Y FINAL	Acta final	X
----------------	---	-------------------	------------	------	-----------	------------	---

Número del contrato	AUTO 024-2022
Objeto:	REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCION CAMPO ALEGRE SECTOR TARAPACA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS
Nombre Contratista:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Fecha del Acto:	19 de Abril de 2022
Plazo de ejecución:	30 días calendario
Valor inicial:	\$ 17.773.280
Fecha de iniciación:	19 de Abril de 2022
Fecha de terminación:	29 de Abril de 2022
Supervisor:	Juan Pablo Zuluaga Correa

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico


Avance físico del periodo	99,47 %
Avance físico Acumulado	99,47 %

1.2. Informe de actividades

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
CHINCHINA	ACUEDUCTO	0,1

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	30 días
Tiempo total transcurrido:	11 días
Avance Porcentual:	36,66 %

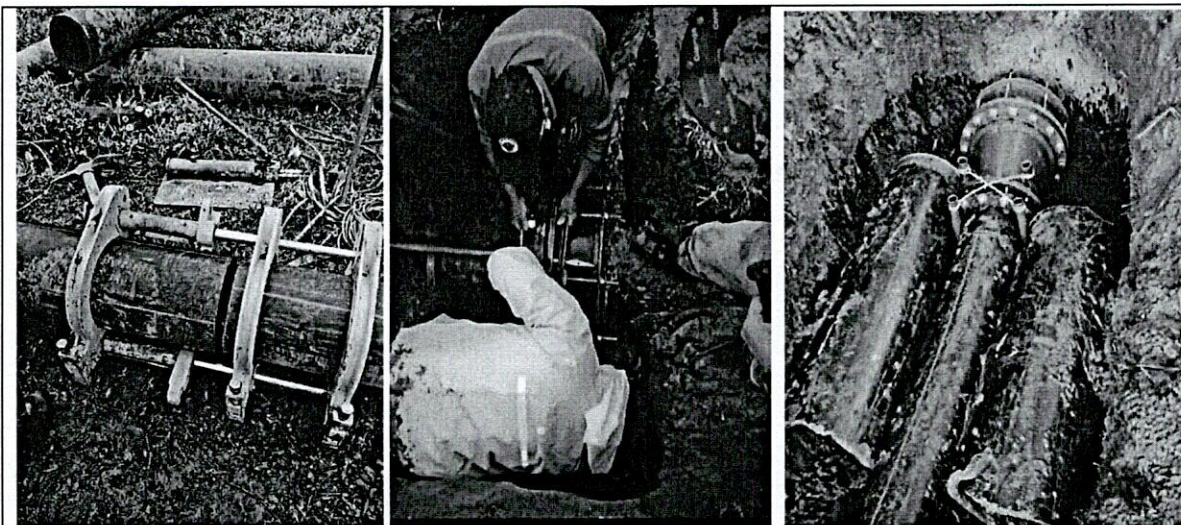

Fotos 7 a 9. Actividades de anclaje, instalación de accesorios hidráulicos y empalmes a la conducción existente

1.5. Problemáticas con la obra

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA PRESENTADA:

LUGAR: FINCA LAS PEÑAS, ubicada a un kilómetro arriba del peaje Tarapacá I, en la vía antigua Chinchiná – Santa Rosa de Cabal.

Por medio del presente, me permito informar acerca de una grave situación presentada en la conducción Campoalegre de 12” que colapsó por creciente del río Campoalegre en la finca Las Peñas, ubicada a un kilómetro arriba del peaje Tarapacá I, en la vía antigua Chinchiná – Santa Rosa de Cabal, dejando sin servicio la Planta de Tratamiento Campoalegre de la Seccional Chinchiná.

Debido a esto, se encuentra con servicio intermitente y poco caudal varios sectores del centro del municipio, el municipio de Palestina y la zona industrial. Se hace necesario, urgente, imprescindible y prioritaria la intervención en ese sitio por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., ya que se perjudican aproximadamente a 6.000 usuarios en ambos municipios.

Desplazamiento de maquinaria y equipos para la termofusión, dadas la ubicación del sitio donde se presenta la emergencia.

Lluvias torrenciales sobre la zona de los trabajos lo que generó un mayor grado de dificultad para ejecutar las actividades necesarias.



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

- Pago del FIC
- Nomina empleados

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN

FECHA DE INSPECCION	ELEMENTOS DE PROTECCION	CONVENCION
4-20-2022	CASCO	A
4-20-2022	OVEROL	NU
4-20-2022	GUANTES	NU
4-20-2022	BOTAS	A
4-20-2022	CARNE	NU
4-20-2022	CHALECO	A
4-20-2022	SEÑALIZACION	A

Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR

ITEM	DESCRIPCION	UND			
			CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCION CAMPO ALEGRE SECTOR TARAPACA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS					
1	PRELIMINARES				
2	Localización y replanteo	ml	102,00	\$ 6.680	\$ 681.360
3	EXCAVACIONES				
4	Excavaciones en zanja - material común 0 a 2 m	m3	80,40	\$ 28.000	\$ 2.251.200
5	Rellenos compactos con material seleccionado de excavación	m3	73,00	\$ 18.000	\$ 1.314.000
6	Dispersión de material sobrante	m3	7,50	\$ 15.000	\$ 112.500
7	ACUEDUCTO				
8	Empalmes de polietileno a PVC en 12"	Un	2,00	\$ 1.000.000	\$ 2.000.000
9	Instalación de tubería de 12" polietileno por termofusión	ml	96,00	\$ 60.000	\$ 5.760.000
10	Instalación de reducciones de 16" a 12" bridadas	Un	2,00	\$ 600.000	\$ 1.200.000
11	Sobreacarreo de tubería	Gl	1,00	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000
12	Termofusión de portaflanche de 12"	Un	2,00	\$ 450.000	\$ 900.000
13	Anclajes y tubería galv. De longitud 2 m de 2" de diámetro con tortones de alambre galv. Cal. 13	Un	2,00	\$ 500.000	\$ 1.000.000
14	Transporte de tubería y accesorios desde Chinchiná hasta el sitio de la obra en Risaralda Caldas	viaje	0,00	\$ 400.000	\$ -
15	Transporte de personal al sitio	dia	4,50	\$ 280.000	\$ 1.260.000
COSTO TOTAL					\$ 17.679.060
COSTO DIRECTO					\$ 13.100.452
ADMINISTRACION		24%			\$ 3.144.108
IMPREVISTOS		5%			\$ 655.023

HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
 NIT :4.413.512
 NOMINA DEL 19 DE ABRIL HASTA EL 29 DE ABRIL 2022
 ACTA 024

No.	DOCUMENTO	Gastos de Personal		BASE SUELDO	Dias DIAS TRABAJADOS	Salario		Auxilio TRANSPOR TE	Devengado TOTAL DEVENGADO	Salud		Pensión		NETO A PAGAR QUINCENAL	FIRMA
		NOMBRES	APELLIDOS			CARGO	VLR DIAS TRABAJADOS			8.5%	4.0%	12.00%	4.00%		
1	1064896263	JUAN DAVID	VALLEJO	\$ 1,370,000	11	502,333	39,033	541,366	-	20,093	-	20,093	501,180	<i>[Signature]</i>	
2	15990720	RUBEN DARIO	GIRALDO	\$ 1,000,000	11	366,667	39,033	405,700	-	14,667	-	14,667	378,366	<i>[Signature]</i>	
		TOTAL	ESCOBAR	2,370,000	22	869,000	78,066	947,066	-	34,760	-	34,760	877,546		

[Signature]
 HERNANDO ANTONIO VALLEJO
 NIT :4.413.512
 EMPLEADOR



GESTIÓN FINANCIERA
DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

F-GF-32
Versión: 06
2021-04-16

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C # O.C
 CONTRATO # ACTO
 Acta N°

024-2022

1 Y FINAL

Pág. 1 De. 1


CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
12025 CHINHINA COSTOS COMPARTIDOS	1301107 Reposición de Redes	17.554.606	124.454	17.679.060	ACUEDUCTO	17.679.060	-	17.679.060

SUBTOTAL FACTURA PAG-1 17.554.606 124.454 17.679.060 17.679.060 17.679.060

TOTAL FACTURA PAG-1 17.554.606 124.454 17.679.060 17.679.060 17.679.060

Fecha de presentación _____ Páginas **1** FIN **1**

DATOS DEL SUPERVISOR

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO DE ZONA
NOMBRE	CARGO
 FIRMA	

EMPOCALDAS S.A.E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
ZONA CENTRO NORTE

CONTRATO No.:	Acto 024 del 19 de Abril de 2022	ACTA No.:	Acta 01 y Final	FECHA CORTE:	29 de Abril de 2022
OBJETO CONTRATO:	REPARACION POR EMERGENCIA CONDUCCION CAMPO ALEGRE SECTOR TARAPACA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS	FECHA INICIACION:	19 DE ABRIL DE 2022	FECHA VENCIMIENTO:	18 de Mayo de 2022
CONTRATISTA:	Hernando Antonio Vallejo Herrera	PRORROGA:	NA	VALOR ADICION:	NA
		SUPERVISOR:	Ingeniero Zona Centro-Norte	FECHA:	29 de abril de 2022

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL			PRESENTE ACTA			ACUM PRESENTE ACTA		
			CANT	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. TOTAL		
REPARACION POR EMERGENCIA CONDUCCION CAMPO ALEGRE SECTOR TARAPACA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS											
1	PRELIMINARES		96.00	\$ 6.680	\$ 641.280	102.00	\$ 681.360	102.00	\$ 681.360		\$ 681.360
2	Localizacion y replanteo	ml									
3	EXCAVACIONES										
4	Excavaciones en zanja - material comun 0 a 2 m	m3	78.00	\$ 28.000	\$ 2.184.000	80.40	\$ 2.251.200	80.40	\$ 2.251.200		\$ 2.251.200
5	Rellenos compactos con material seleccionado de excavacion	m3	66.00	\$ 18.000	\$ 1.188.000	73.00	\$ 1.314.000	73.00	\$ 1.314.000		\$ 1.314.000
6	Dispersion de material sobrante	m3	12.00	\$ 15.000	\$ 180.000	7.50	\$ 112.500	7.50	\$ 112.500		\$ 112.500
7	ACUEDUCTO										
8	Empalmes de polietileno a PVC en 12"	Un	2.00	\$ 1.000.000	\$ 2.000.000	2.00	\$ 2.000.000	2.00	\$ 2.000.000		\$ 2.000.000
9	Instalacion de tubería de 12" polietileno por termofusion	ml	96.00	\$ 60.000	\$ 5.760.000	96.00	\$ 5.760.000	96.00	\$ 5.760.000		\$ 5.760.000
10	Instalacion de reducciones de 16" a 12" bridadas	und	2.00	\$ 600.000	\$ 1.200.000	2.00	\$ 1.200.000	2.00	\$ 1.200.000		\$ 1.200.000
11	Sobreacarreos de tubería	Gl	1.00	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	1.00	\$ 1.200.000	1.00	\$ 1.200.000		\$ 1.200.000
12	Termofusion de portafianche de 12	Un	2.00	\$ 450.000	\$ 900.000	2.00	\$ 900.000	2.00	\$ 900.000		\$ 900.000
13	Anclajes y tubería galv. De longitud 2 m de 2" de diametro con tornones de alambre galv. Cal. 13	Un	2.00	\$ 500.000	\$ 1.000.000	2.00	\$ 1.000.000	2.00	\$ 1.000.000		\$ 1.000.000
14	Transporte de tubería y accesorios desde Chinchina hasta el sitio de la obra en Risaralda Caldas	viaje	1.00	\$ 400.000	\$ 400.000	-	\$ -	0.00	\$ -		\$ -
15	Transporte de personal al sitio	dia	4.00	\$ 280.000	\$ 1.120.000	4.50	\$ 1.260.000	4.50	\$ 1.260.000		\$ 1.260.000
COSTO TOTAL					\$ 17.773.280		\$ 17.679.060		\$ 17.679.060		\$ 17.679.060
COSTO DIRECTO					\$ 13.170.270		\$ 13.100.452		\$ 13.100.452		\$ 13.100.452
ADMINISTRACION					\$ 3.160.865		\$ 3.144.108		\$ 3.144.108		\$ 3.144.108
IMPREVISTOS		24%			\$ 658.514		\$ 655.023		\$ 655.023		\$ 655.023
UTILIDADES		5%			\$ 658.514		\$ 655.023		\$ 655.023		\$ 655.023
IVA SOBRE UTILIDADES		5%			\$ 125.118		\$ 124.454		\$ 124.454		\$ 124.454
COSTO TOTAL		19%			\$ 17.773.280		\$ 17.679.060		\$ 17.679.060		\$ 17.679.060

SON: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SESENTA PESOS MCTE

RESUMEN DEL CONTRATO:

Valor del Contrato	\$ 17.679.060
Valor Acta 1 y final	\$ 94.220
Saldo No ejecutado	\$ 17.773.280
SUMAS IGUALES	\$ 17.773.280


JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE


HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Contratista
