



JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA  
INGENIERO CIVIL U.N.

Manizales, marzo 24 de 2023

OFICIO – JJGP – 28 - 2023

Señores  
**EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**  
Carrera 23 Nro. 75-82  
Manizales

**REFERENCIA: Contrato 212 del 2022**

Objeto: “GRUPO 6: CAMBIO RED ACUEDUCTO Y OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO CARRERA 7 DE LA CALLE 9 HASTA LA 11 BULEVAR ETAPA II Y CARRERA 7BIS CALLES 18 A LA 19, OBRAS COMPLEMENTARIAS PSMV SECTOR LAGO BALSORA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS”.


Por medio de la presente solicito se suspenda el contrato 212 a partir de la fecha debido a:

- Hace falta que se apruebe por parte de la CHEC el rediseño de las obras a ejecutar en el lago Balsora.
- Empocaldas se encuentra tramitando los permisos por parte de la CHEC para poder autorizar la ejecución de las obras el sector del lago Balsora.

Esta suspensión se solicita hasta que la entidad contratante tenga los diseños y permisos aprobados por parte de la CHEC.

Cordialmente;

Nombre	JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA
Profesión	INGENIERO CIVIL
C. C. No.	10.280.643 de Manizales
Matrícula Profesional No.	17202 – 66562 Caldas
Dirección electrónica	<a href="mailto:javiergarciapareja@hotmail.com">javiergarciapareja@hotmail.com</a>
Celular	3104558948
Ciudad	Manizales

  
-----  
**JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA**  
Ingeniero Civil U. N.

MULTIPLAZA EL CABLE – CARRERA 21 N°64 A 33 OF. 1408 TELEFONO 8934273  
CEL. 3104558948 Correo **electrónico: [javiergarciapareja@hotmail.com](mailto:javiergarciapareja@hotmail.com)**  
MANIZALES - CALDAS

Manizales Caldas, Marzo 24 de 2023

Doctor:

**ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE**

Gerente

EMPOCALDAS S.A.E.S.P

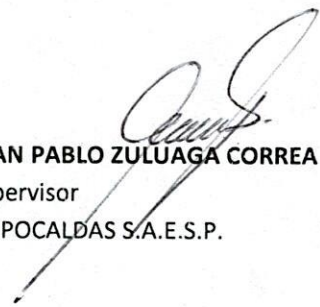
**ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN No. 01 al Contrato de Obra N° 212 DE 2022, cuyo objeto es “CAMBIO RED DE ACUEDUCTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO CARRERA 7 DE LA CALLE 9 HASTA LA 11 BULEVAR ETAPA II Y CARRERA 7 BIS CALLES 18 A LA 19, OBRAS COMPLEMENTARIAS PSMV SECTOR LAGO BALSORA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS”**

**Asunto: Solicitud de suspensión 01 al Contrato 212 de 2022.**

De acuerdo con la solicitud de suspensión N°01 al contrato de obra 212-2022 realizada por el ingeniero contratista Javier García Pareja, la supervisión de Empocaldas S.A.E.S.P. valida su aprobación teniendo en cuenta que se encuentra en trámite la modificación del diseño requerido para intervenir el tramo: OBRAS COMPLEMENTARIAS PSMV SECTOR LAGO BALSORA, gestión que se viene adelantando días atrás con la Central Hidroeléctrica de Caldas – CHEC como propietaria de los predios de este LAGO y cuya aprobación permiso para intervenir aún esta pendiente.

No siendo otro el motivo de la presente agradezco su atención y positiva respuesta.

Cordialmente,




**JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**  
Supervisor  
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.




## ACTA DE SUSPENSION

CONTRATO	212 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CONTRATISTA	JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA
C.C. No	10.280.643 DE MANIZALES
OBJETO	<u>GRUPO 6:</u> CAMBIO RED ACUEDUCTO Y OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO CARRERA 7 DE LA CALLE 9 HASTA LA 11 BULEVAR ETAPA II Y CARRERA 7BIS CALLES 18 A LA 19, OBRAS COMPLEMENTARIAS PSMV SECTOR LAGO BALSORA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS.
VALOR	\$ 629.391.383
RECURSOS	EMPRESTITO INFICALDAS \$9.000 MILLONES
PLAZO	NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
PRORROGA 01	HASTA EL 28 DE MARZO DE 2023
TERMINACION	28 DE MARZO DE 2023

En el municipio de Chinchiná, Caldas a los VEINTICUATRO (24) días del mes de MARZO de 2023 se reunieron **JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**, ingeniero de zona de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en representación de la empresa contratante y **JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA** como contratista, con el fin de SUSPENDER el contrato 212 de 2022, toda vez que a la fecha se encuentra en trámite la modificación del diseño requerido para intervenir el tramo: OBRAS COMPLEMENTARIAS PSMV SECTOR LAGO BALSORA, gestión que se viene adelantando días atrás con la Central Hidroeléctrica de Caldas – CHEC como propietaria de los predios de este LAGO y cuya aprobación y permiso para intervenir aún está pendiente. El contrato tendrá reinicio de las actividades del mismo en la fecha que se tengan legalizadas ambas circunstancias.

  
**JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**  
Supervisor Obra  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P

  
**JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA**  
Contratista
