	GESTION DE CONTRATACION		F-GC-22 Versión 11 2022-08-03
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA		

# CONTRATO Y AÑO:	ACTO 052-2022	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	3.439.800	
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA			2. VALOR ADICION	0	
NIT O CC:	4.413.512			3. VALOR TOTAL (1+2)	3.439.800	
CDP (#, rubro y fecha)	00784 DEL 22-7-2022			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0	
RP (#, rubro y fecha)	001279 DEL 20-10-2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.439.800	
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACION POR EMERGENCIA CONDUCCION LAS CAROLAS FRUTAS SECTOR EL LAGO MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	0	
DOCUMENTO VERIFICADOS					✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					NA	
3- Pagos al FIC					X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					X	
5- Informe de actividades o Bitácora.					X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					X	
8- Ensayos de densidad.					NA	
9- Diseño de Mezclas.					NA	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					NA	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)					NA	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					NA	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					NA	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)					X	
15- Acta parcial o final del contrato.					X	
16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor					X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.


Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura original o Documento equivalente		X
Acta parcial o final del contrato.		X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X	
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
70556183867	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO


19-12-22

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
IDENTIFICACION APORTANTE	CC-4413512
SUCURSAL	002
FECHA PAGO	2022-11-03
IDENTIFICACION EMPLEADO	CC-4413512
NOMBRE EMPLEADO	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
EPS	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
AFP	Sin AFP
CAJA COMPENSACION	Sin CCF
ARL	ARL SURIA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NUMERO PLANILLA	24438654
REFERENCIA PAGO(PIN)	I
TIPO PLANILLA	2022-10
PERIODO PENSION	2022-10
PERIODO SALUD	Independiente voluntario al sistema de riesgos laborales
TIPO COTIZANTE	Cotizante con requisitos cumplidos para pensión
SUBTIPO COTIZANTE	
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SUN	Fecha Sin Ingreso	IGE	Fecha Ige Inicial	Fecha Ige Final	LMA	Fecha LMA	VAC	Fecha Vac Inicio	VAC Fin	A/P	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																										0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Col. Voluntaria		Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante		
0	0	0,000000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o
					Número Autorización	Valor	
30	1.000.000	0,1250000	\$ 125.000	\$ 0	0	\$ 0	0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.000.000	0,0696000	\$ 69.600	17174

APORTES PARAFISCALES

Dias Cot	Caja de Compensación Familiar		Sena		ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot.	Cot. Obligatoria
0	0	0,0000000	\$ 0	0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 0	\$ 125.000	\$ 69.600	\$ 0	\$ 194.600

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA Identificación: CC-4413512 Código dependencia o sucursal: 002 Nombre dependencia o sucursal: independiente Fecha de generación del reporte: 2022-11-28 Fecha límite de pago: 2022-11-03 Fecha de pago: 2022-11-03 Pagada por: BANCOLOMBIA Período pensión: 2022-10 Período salud: 2022-10 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: I Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 24438654	Pagada
---	--------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$0	\$0	\$0	\$125.000	\$125.000	<input type="checkbox"/>
14-11	890903790	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	1	\$0	\$0	\$0	\$69.600	\$69.600	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$0	\$194.600	\$194.600	

[Imprimir](#)
[Descargar Resumen](#)

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-4113512
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2022-11-03
IDENTIFICACION EMPLEADO	CC-1054596263
NOMBRE EMPLEADO	JUAN DAVID VALLEJO GIRALDO
EPS	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensación familiar de Cuidas CONFAMILIARES
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	24673708
REFERENCIA PAGO(PIN)	E
TIPO PLANILLA	
PERIODO PENSION	2022-10
PERIODO SALUD	2022-11
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sin Ingreso	Fecha Sin Fin	IGE	Fecha Ingreso	Fecha Ingreso	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin				
																						0												

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Fondo de Solidaridad de	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante		
30	1.370.000	0,1600000	\$ 219.200	\$ 0	\$ 219.200	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor		
30	1.370.000	0,0400000	\$ 54.800	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.370.000	0,0696000	\$ 95.400	17174

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar		Sena		ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN			
	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	
30	1.370.000	0,0400000	\$ 54.800	0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Riesgos	Total
\$ 219.200	\$ 95.400	\$ 424.200

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

<p>Razón social: HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA Identificación: CC-4413512 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2022-11-29 Fecha límite de pago: 2022-11-03 Fecha de pago: 2022-11-03 Pagada por: BANCOLOMBIA</p> <p>Período pensión: 2022-10 Período salud: 2022-11 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 24673708</p>	Pagada
--	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
230301	800224808	PORVENIR	2	\$0	\$0	\$0	\$299.200	\$299.200	<input type="checkbox"/>
Subtotal Pensión		1	2	\$0	\$0	\$0	\$299.200	\$299.200	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$0	\$0	\$0	\$54.800	\$54.800	<input type="checkbox"/>
EPS041	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	1	\$0	\$0	\$0	\$20.000	\$20.000	<input type="checkbox"/>
Subtotal Salud		2	2	\$0	\$0	\$0	\$74.800	\$74.800	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2	\$0	\$0	\$0	\$130.200	\$130.200	<input type="checkbox"/>
Subtotal ARL		1	2	\$0	\$0	\$0	\$130.200	\$130.200	
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	2	\$0	\$0	\$0	\$74.800	\$74.800	<input type="checkbox"/>
Subtotal CCF		1	2	\$0	\$0	\$0	\$74.800	\$74.800	
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$0	\$579.000	\$579.000	

[Imprimir](#)
[Descargar Resumen](#)

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	80965921	1794394107	05/12/2022

Número de Identificación

4413512

Primer Apellido (si es Persona natural)

VALLEJO

Dígito de Verificación (Si es persona

Cédula de Ciudadanía

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

CARRERA 7 No. 6 - 27

Localización

Nacional

Correo electrónico

claudi3032@hotmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra

052

Nombre Obra

REPARACION LAS CAROLAS

Fecha Terminación Obra

29/10/2022

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

10

Costo Total Mano de Obra

3439800.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

HERNADO ANTONIO

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

MANIZALES

Teléfono de Contacto

+57,314 8446597

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

052

Fecha Inicio Obra

20/10/2022

Ciudad de Ejecución de la Obra

4413512

Año Periodo a Pagar

2022

Costo Total de Obra a Todo Costo

3439800.00

Número de Trabajadores en el Periodo

1

Aporte FIC

25000.00

Valor del Pago

25000.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	80965921	1794394107	05/12/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **4413512**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**


Dirección IP: **186.83.184.49**

Su transacción fue Total Pagado **\$ 25,000.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 25,000.00	COP\$ 25,000.00

Comprobante

de pago en línea



SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Pago realizado por: DORIS LUCIA DEL SOCORRO GARCIA DE OSORIO

Nro. de factura: 80965921

Descripción del pago: Pago Ordinario - FIC

Nro. de referencia: 186.83.184.49

Nro. de referencia 2: CC

Nro. de referencia 3: 4413512

Fecha y hora de la transacción: Lunes 5 de Diciembre de 2022 11:10:50 AM

Nro. de comprobante: 0000089601

Valor pagado: \$ 25,000.00

Cuenta: *****4593

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com

SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE



HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
 NIT 4.413.512-7
 CR 10 2 13
 Tel: (036) 3116183675
 Chinchiná - Colombia
 claudi3032@hotmail.com

Factura electrónica de venta
 No. FE-72

Señores	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUDIENDO EMPLEAR LA EXPRESION ABREVIADA EMPOCAL		
NIT	890.803.239-9	Teléfono	(036) 8867080
Dirección	CR 23 75 82	Ciudad	Manizales - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2022-12-13	2022-12-28

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ReparaciónporemergenciaconducciónLasCarolasFrutas sector el Lago municipio de Chinchiná Caldas	2,548,944.00	2,548,944.00
2	ADMINISTRACION	611,747.00	611,747.00
3	IMPREVISTOS	127,447.00	127,447.00
4	UTILIDADES	127,447.00	151,661.93

Elaborado por Silgo S.A. S Nit: 830.048.145-8

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Tres millones cuatrocientos treinta y nueve mil setecientos noventa y nueve pesos m/cte con noventa y tres cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-28 por \$ 3,439,799.93

Observaciones:

Acto 052 del 20 de Octubre de 2022

Total Bruto	3,415,585.00
IVA 19%	24,214.93
Total a Pagar	3,439,799.93

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035852195 aprobado en 20220909 prefijo FE desde el número 59 al 150 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa

EMPOCALDAS S.A E.SP.					
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS					
SECCIONAL ARMA - CALDAS					
CONTRATO No.: ACTO 052 DE 2022	INFORME DE OBRA 1	FECHA FINAL: OCTUBRE 29 DE 2022			
REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN LAS CAROLAS FRUTAS SECTOR EL LAGO MUNICIPIO DE CHINCHINÁ CALDAS					
MUNICIPIO: CHINCHINÁ, CALDAS.	VALOR ACTO: \$ 3.439.800				
CONTRATISTA: HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA					
SUPERVISION: ING. JUAN PABLO ZULUAGA CORREA				FECHA: 29-10-22	

INFORME DE OBRA

- Inicio de obra: 20 de Octubre de 2022
- Plazo contractual: 10 días.
- Fecha de término de la obra: 29 de Octubre de 2022
- Recibo de Obras: 29 de Octubre de 2022
- Total, de días para ejecución de obras: 10 días

AVANCE DE OBRA

Avance acumulado ejecutado a 29 de Octubre de 2022: 100%

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



Imágenes 1 y 2. Tubería PVC afectada con el movimiento del terreno

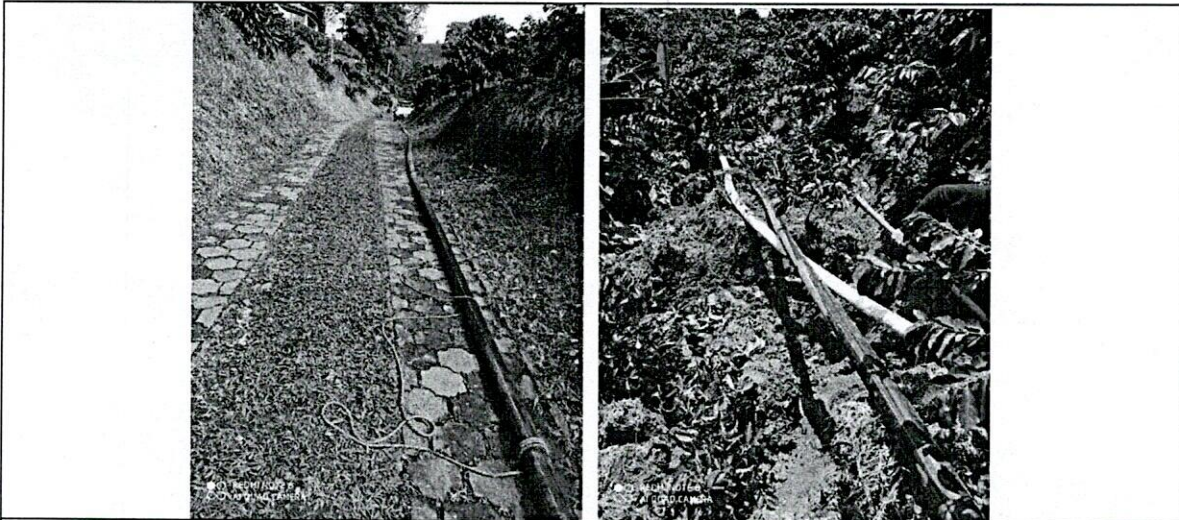


Imagen 3 y 4. Tubería de polietileno 4 pulgadas para reparación

ACTIVIDADES: Reparación tubería en PVC de 4" pulgadas por polietileno de 4" pulgadas conducción las Carolas frutas sector el lago municipio de Chinchiná caldas

Que mediante "mediante oficio e informe de fecha 20 de octubre del 2022, enviado por el señor administrador de la seccional de Chinchiná, Oscar Salazar García, donde se informa "acerca de una grave situación presentada en la conducción las Carolas – Bamos y fabricas ubicados en el lago Balsora de Chinchiná, concretamente en la finca la Doctora, lugar donde se presentó la noche anterior un deslizamiento de tierra, producto de un fuerte aguacero que colapso la red de acueducto de 4", dejando sin servicio a 128 viviendas y 2 fabricas que allí funcionan (ARME y FLP PROCESADOS). Por lo anterior, solicito de usted con todo respeto, declarar la emergencia con el fin de dar solución definitiva a estos daños, teniendo en cuenta que en los últimos quince días se han presentado 4 daños en el mismo sector", lo cual obliga a la Empresa, a realizar de manera inmediata, las acciones tendientes a reparar la contingencia presentada.


- Desplazamiento al sitio del evento
- Localización y replanteo, actividades de rocería y limpieza
- Actividades de excavación para instalación de polietileno en las zonas del daño
- Transporte de máquina para uniones de termofusión
- Instalación de tubería de polietileno
- Suministro e instalación de portaflanche y brida loca para empalmes
- Anclajes con tubería galvanizada y empotramiento en concreto de 21 MPa.
- Llenos con material de la excavación

HERNANDO A. VALLEJO HERRERA
Contratista

HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
 NIT :4.413.512
 NOMINA DEL 20 DE OCTUBRE HASTA EL 29 DE OCTUBRE 2022
 ACTA 052

No. DOCUMENTO	Gastos de Personal		BASE SUELDO	Dias TRABAJADOS	Salario VLR DIAS TRABAJADOS	Auxilio TRANSPORTE	Devengado TOTAL DEVENGADO	Salud		Pensión		NETO A PAGAR QUINCENAL	FIRMA
	NOMBRES	APELLIDOS						CARGO	8,5%	4,0%	12,00%		
1054095263	JUAN DAVID	VALLEJO GIRALDO	\$ 1.370.000	10	456.667	35.485	492.151	-	18.267	-	18.267	455.618	<i>[Firma]</i>
	TOTAL		1.370.000	10	456.667	35.485	492.151	-	18.267	-	18.267	455.618	

[Firma]
 HERNANDO ANTONIO VALLEJO
 NIT :4.413.512
 EMPLEADOR

 empocaldas <small>Construyendo juntos su bienestar</small>	F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	1	Fecha del informe	29-10-2022	Acta	1 Y FINAL	Acta final	X
----------------	---	-------------------	------------	------	-----------	------------	---

Número del contrato	AUTO 052-2022
Objeto:	REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN LAS CAROLAS FRUTAS SECTOR EL LAGO MUNICIPIO DE CHINCHINÁ CALDAS
Nombre Contratista:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Fecha del contrato:	20-10-2022
Plazo de ejecución:	10 días calendario
Valor inicial:	\$ 3.439.800
Fecha de iniciación:	20 de octubre de 2022
Fecha de terminación:	29 de octubre de 2022
Supervisor:	Juan Pablo Zuluaga Correa

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100 %
Avance físico Acumulado	100 %

1.2. Informe de actividades

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
CHINCHINA	ACUEDUCTO	0,033

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	10 días
Tiempo total transcurrido:	10 días
Avance Porcentual:	100 %

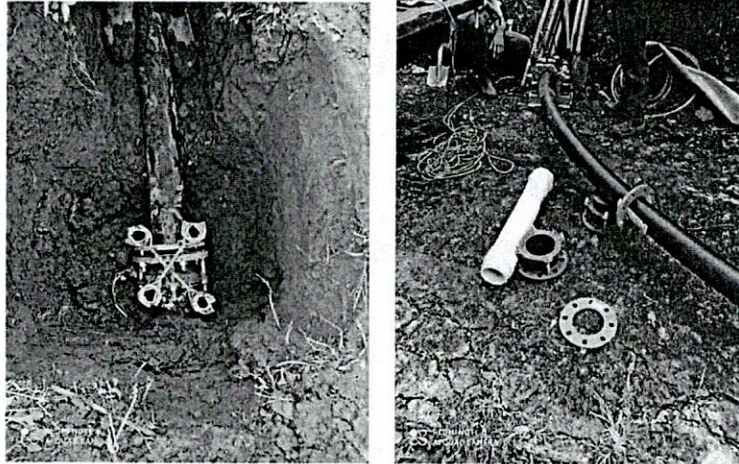


Imagen 6 y 7 Actividades de empalme, construcción de anclajes, instalación de accesorios hidráulicos para unión a la red o conducción existente


1.5. Problemáticas con la obra

Esencialmente se presentaron dificultades relacionadas con el desplazamiento de máquina para la termofusión dadas las fuertes pendientes del terreno sobre el cual se desarrollaron los trabajos;

Se presentaron permanentes lluvias sobre la zona de los trabajos lo que generó un mayor grado de dificultad para ejecutar las actividades necesarias para la termofusión y demás actividades en obra, lo mismo que para los movimientos de tierra (excavaciones y llenos).

ASUNTO: SOLICITUD DECLARATORIA DE EMERGENCIA

Por medio del presente, me permito informar acerca de una grave situación presentada en la conducción Carolas – Barrios y fábricas ubicadas en el Lago Balsera de Chinchiná, concretamente en la finca la Doctora, lugar donde se presentó la noche anterior un deslizamiento de tierra, producto de un fuerte aguacero que colapso la red de acueducto de 4", dejando sin servicio a 128 viviendas y 7 fábricas que allí funcionan (ARME Y FLP PROCESADOS).

 <p>F-GC-20 Versión 3 Junio 2019</p>	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		
			CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Reparación por emergencia conducción Las Carolas Frutas sector el Lago municipio de Chinchiná Caldas					
1	PRELIMINARES				
2	Localización y replanteo	ml	35,00	6.680	\$ 233.800
3	EXCAVACIONES				
4	Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m	m3	11,00	28.000	\$ 308.000
5	Rellenos compactos con material seleccionado de excavación	m3	11,00	18.000	\$ 198.000
6	ACUEDUCTO				\$ -
7	Empalmes de polietileno a PVC en 4" incluye tornillería y empaques	Un	2,00	500.000	\$ 1.000.000
8	Instalación de tubería de 4" polietileno por termo fusión. Incluye manipulación	ml	35,00	10.000	\$ 350.000
9	Termo fusión de portaflanche de 4"	Un	2,00	200.000	\$ 400.000
10	Anclajes y tubería galv. De longitud 2 m de 2". De diámetro con tortones de alambre galv. Cal. 13	un	2,00	350.000	\$ 700.000
11	Trasporte de personal, tubería y accesorios al sitio	Día	1,00	250.000	\$ 250.000
COSTO TOTAL					\$ 3.439.800
COSTO DIRECTO					\$ 2.548.944
ADMINISTRACION		24%			\$ 611.747
IMPREVISTOS		5%			\$ 127.447
UTILIDADES		5%			\$ 127.447
IVA SOBRE UTILIDADES		19%			\$ 24.215
COSTO TOTAL					\$ 3.439.800

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

1 empleos directos X 10 días calendario

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

Suscriptores del servicio de acueducto del municipio de Chinchiná, Caldas.



Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

O.C

CONTRATO

CONTRATO

Acta N°

acto 052-2022

1 y final

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
12025 CHINCHINA COSTOS COMPARTIDOS	1301107 Reposición de Redes	3.415.585	24.215	3.439.800	ACUEDUCTO	3.439.800	-	3.439.800
				-		-		-
				-		-		-
				-		-		-
				-		-		-
				-		-		-
				-		-		-
				-		-		-
				-		-		-
				-		-		-
				-		-		-
				-		-		-
				-		-		-
				-		-		-
				-		-		-
				-		-		-
				-		-		-
				-		-		-
				-		-		-

SUBTOTAL FACTURA PAG-1	3.415.585	24.215	3.439.800	3.439.800	-	3.439.800
-------------------------------	-----------	--------	-----------	-----------	---	-----------

TOTAL FACTURA PAG-1	3.415.585	24.215	3.439.800	3.439.800	-	3.439.800
----------------------------	-----------	--------	-----------	-----------	---	-----------

Fecha de presentación

Páginas

FIN

1

DATOS DEL SUPERVISOR

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO DE ZONA
NOMBRE	CARGO
	FIRMA

EMPOCALDAS S.A E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
ZONA CENTRO NORTE

CONTRATO No.:	Acto 052 del 20 de Octubre de 2022	ACTA No.:	Acta 01 y Final	FECHA CORTE:	29 de octubre de 2022
OBJETO CONTRATO:	Reparación por emergencia conducción Las Carolas Frutas sector el Lago municipio de Chinchiná Caldas	FECHA INICIACIÓN:	20 de octubre de 2022	FECHA VENCIMIENTO:	29 de octubre de 2022
CONTRATISTA:	Hernando Antonio Vallejo Herrera	PRORROGA:	NA	VALOR ADICIÓN:	NA
		SUPERVISOR:	Ingeniero Zona Centro-Norte	FECHA:	29 de octubre de 2022

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL			PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANT	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES								
2	Localización y replanteo	ml	35,00	6.680	\$ 233.800	35,00	\$ 233.800	35,00	\$ 233.800
3	EXCAVACIONES								
4	Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m	m3	11,00	28.000	\$ 308.000	11,00	\$ 308.000	11,00	\$ 308.000
5	Rellenos compactos con material seleccionado de excavación	m3	11,00	18.000	\$ 198.000	11,00	\$ 198.000	11,00	\$ 198.000
6	ACUEDUCTO								
7	Empalmes de polietileno a PVC en 4" incluye tornillería y empaques	Un	2,00	500.000	\$ 1.000.000	2,00	\$ 1.000.000	2,00	\$ 1.000.000
8	Instalación de tubería de 4" polietileno por termo fusión. Incluye manipulación	ml	35,00	10.000	\$ 350.000	35,00	\$ 350.000	35,00	\$ 350.000
9	Termo fusión de portaflanche de 4"	Un	2,00	200.000	\$ 400.000	2,00	\$ 400.000	2,00	\$ 400.000
10	Anclajes y tubería galv. de longitud 2 mts de 2 pulg de diámetro con tornos de alambre galvanizado, Cal. 13	un	2,00	350.000	\$ 700.000	2,00	\$ 700.000	2,00	\$ 700.000
11	Transporte de personal, tubería y accesorios al sitio	Día	1,00	250.000	\$ 250.000	1,00	\$ 250.000	1,00	\$ 250.000
COSTO TOTAL					\$ 3.439.800		\$ 3.439.800		\$ 3.439.800
COSTO DIRECTO					\$ 2.548.944		\$ 2.548.944		\$ 2.548.944
ADMINISTRACION		24%			\$ 611.747		\$ 611.747		\$ 611.747
IMPREVISTOS		5%			\$ 127.447		\$ 127.447		\$ 127.447
UTILIDADES		5%			\$ 127.447		\$ 127.447		\$ 127.447
IVA SOBRE UTILIDADES		19%			\$ 24.215		\$ 24.215		\$ 24.215
COSTO TOTAL					\$ 3.439.800		\$ 3.439.800		\$ 3.439.800

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE

RESUMEN DEL CONTRATO:

Valor del Contrato	
Valor Acta 1 y final	\$ 3.439.800
Saldo No ejecutado	\$ -
SUMAS IGUALES	\$ 3.439.800 \$ 3.439.800



JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
 INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE
 SUPERVISOR



HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
 Contratista

**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FE72Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-12-13 12:00:00.000 UTC-5Estado vigente:
TÍTULO VALORCUFE:
5d9bdc2cd639b6c181912c69d66caf7ae2cc293157d277a01cf3
99cf5f8297ccd7bdbfcd30d71bc013543a49eee63323RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERARAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUDIENDO EMPLEAR
LA EXPRESION ABREVIADA EMPOCALNIT:
4413512NIT:
890803239VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
3439799.93FORMA DE PAGO:
A CRÉDITODIVISA:
COPVENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
2022-12-28 UTC-5**VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**CUDE:
1dc5925f413acc491a1650a25357a8254a908791d7c8a7c0800
60e2be1e4241073ff2d672a9fd115e5c38009401419e6PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas NacionalesFECHA DE VALIDACIÓN:
2022-12-13 11:24:25.000 UTC-5**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.RECEPTOR DEL EVENTO:
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:** Documento validado por la DIANLa validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co

**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FE72Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-12-13 12:00:00.000 UTC-5Estado vigente:
TÍTULO VALORCUFE:
5d9bdc2cd639b6c181912c69d66caf7ae2cc293157d277a01cf3
99cf5f8297ccd7bdfcd30d71bc013543a49eee63323**EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta**

CUDE:

06fd94b5fff764c2c10a1a42d3db884d52f92eb7b1f1e1bb3e1d95
ada7498079a811c72f838a13e6acf84aa368adcce1PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-12-15 09:49:05.000 UTC-5RECEPTOR DEL EVENTO:
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:** Documento validado por la DIANDOCUMENTOS Y EVENTOS ASOCIADOS A LA
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COMO
TÍTULO VALOR:

NRO. TOTAL DE DOCUMENTOS: 1

NRO. TOTAL DE EVENTOS: 3

FIN DE ESTE DOCUMENTOEl interesado debe comunicar a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, cualquier falla o error en el registro de los
documentos o eventos.

FECHA: 12/15/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ

