


Emergencia



	F-GC-22 Versión 10 Junio 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA	

# CONTRATO Y AÑO	036-2021	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	1.000.000
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA			2. VALOR ADICION	0
NIT O CC:	4413512			3. VALOR TOTAL (1+2)	1.000.000
CDP (#, rubro y fecha)	00840 DEL 2021/10/04			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
RP (#, rubro y fecha)	001149 DEL 2021/11/17			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.000.000
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACION POR EMERGENCIA TUBERIA DE 3° SECTOR CAJA AGRARIA CORREGIMIENTO DE ARAUCA				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	0

DOCUMENTO VERIFICADOS	✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	NA	
3- Pagos al FIC	X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Informe de actividades o Bitácora.	X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
8- Ensayos de densidad.	NA	
9- Diseño de Mezclas.	NA	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	NA	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	NA	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	NA	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	NA	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	X	
15- Acta parcial o final del contrato.	X	


Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.



 NOMBRE DE QUIEN RECIBE
 
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓
Factura original o Documento equivalente	
Acta parcial o final del contrato.	
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	
Copia del registro presupuestal	

Fecha de presentación \_\_\_\_\_

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
70556183867	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO


 23-12-21

**JHON JAIRO GIRALDO NARIÑO**

CC 15.902.864

T.P 26804-T


**EL CONTADOR DE LA EMPRESA  
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA  
NIT 4.413.512-7**

Que la empresa **HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA**, con Nit 4.413.512, se encuentra a **PAZ Y SALVO**, en los aportes a la seguridad social y parafiscales del mes de noviembre- diciembre del 2021.

En cuanto a la veracidad oportunidad de los mismos.

Firmado en Chinchiná – Caldas, a los Veintidós (22) días del mes Diciembre (12) de dos mil veintiuno2021.

Atentamente;



---

**JHON JAIRO GIRALDO NARIÑO**  
Contador Público Titulado  
T.P. 26804-T – T J.C. Contadores



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

F 0 F 0 E E 0 0 8 0 9 5 0 E 5 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOHN JAIRO GIRALDO NARIÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15902864 de CHINCHINA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 26804-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Diciembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Unión de Contadores, Abogados y Taxistas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

26804-T

JOHN JAIRO GIRALDO NARIÑO  
C.C. 15902864  
RES. INSCRIPCIÓN 753 DEL 05/04/1990  
FUNDACION UNIVERSITARIA DE MANIZALES



OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA  
DIRECTOR GENERAL

257582


REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 15.902.864  
GIRALDO NARIÑO

AFELLIDOS  
JOHN JAIRO

NOMBRES

*John Jairo S.*  
FIRMA



Unión de Contadores, Abogados y Taxistas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 0444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

FIRMA

INCOE DERECHO



FECHA DE NACIMIENTO 07-JUN-1960  
CHINCHINA (CALDAS)  
LUGAR DE NACIMIENTO  
1.60 O+ M  
ESTATURA G.S. RH SEXO  
12-JUL-1979 CHINCHINA  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0903400-00090723-M-0015902864-20081008 0004109994A 1 4820002221



DETALLE PLANILLA  
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA Identificación: CC-4413512 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2021-11-17 Fecha límite de pago: 2021-11-04 Fecha de pago: 2021-11-17 Pagada por: BANCOLOMBIA  Período pensión: 2021-10 Período salud: 2021-11 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 21819403	<b>Pagada</b>
---	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR
									TODOS
230301	800224808	PORVENIR	2	\$0	\$0	\$0	\$364.600	\$364.600	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal Pensión</b>		1	2	\$0	\$0	\$0	\$364.600	\$364.600	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	\$0	\$0	\$0	\$91.200	\$91.200	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal Salud</b>		1	2	\$0	\$0	\$0	\$91.200	\$91.200	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2	\$0	\$0	\$0	\$158.700	\$158.700	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal ARL</b>		1	2	\$0	\$0	\$0	\$158.700	\$158.700	
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	2	\$0	\$0	\$0	\$91.200	\$91.200	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal CCF</b>		1	2	\$0	\$0	\$0	\$91.200	\$91.200	
<b>GRAN TOTAL</b>				\$0	\$0	\$0	\$705.700	\$705.700	

**Imprimir** **Descargar Resumen**



RAZON SOCIAL :	HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA
IDENTIFICACION:	CC-4413512
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	002
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	independiente
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-12-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-12-03
FECHA DE PAGO:	2021-12-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-11
PERIODO SALUD:	2021-11
NUMERO PLANILLA:	21823611
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21823611
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 908.526	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 113.600	\$ 113.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 908.526	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 63.300	\$ 63.300
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 176.900	\$ 176.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/01/2021
----------------------------------	------------



# CONSULTA EMPLEADO

RAZON SOCIAL	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA										
IDENTIFICACION APORTANTE	CC-441.3512										
SUCURSAL	002										
FECHA PAGO	2021-12-02										
IDENTIFICACION EMPLEADO	CC-441.3512										
NOMBRE EMPLEADO	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA										
EPS	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD										
AFP	Sin AFP										
CAJA COMPENSACION	Sin CCF										
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.										
NUMERO PLANILLA	21623611										
REFERENCIA PAGO(PIN)	/										
TIPO PLANILLA	/										
PERIODO PENSION	2021-11										
PERIODO SALUD	2021-11										
TIPO COTIZANTE	Independiente voluntario al sistema de riesgos laborales										
SUBTIPO COTIZANTE	Cobizante con requisitos cumplidos para pensión										
NOVEDAD INGRESO INICIAL											
NOVEDAD INGRESO FINAL											

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sin inicio	Fecha Sin Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin				
																											0						

## SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Fondo de Solidaridad de	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante		
0	0	0,0000000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

## SISTEMA GENERAL DE SALUD

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o
					Número Autorización	Valor	
30	908.526	0,1250000	\$ 113.600	\$ 0	0	\$ 0	0

## SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	908.526	0,0699000	\$ 63.300	17174

## APORTES PARAFISCALES

Dias Cot	Caja de Compensación Familiar		IBCF	ESAP	MIN DE EDUCACIÓN
	Cot. Obligatoria	Tarifa			
0	0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0

## TOTAL COTIZACION EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 0	\$ 113.600	\$ 63.300	\$ 0	\$ 176.900

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	73243290	1248783631	16/12/2021

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **4413512**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.83.185.22**

Su transacción fue **Total Pagado \$45,426.00**  
<strong>APROBADA</strong> por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$45,426.00	\$45,426.00



NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	73243290	1248783631	16/12/2021

**Número de Identificación**

4413512

**Primer Apellido (si es Persona natural)**

VALLEJO

**Dígito de Verificación (Si es persona**

Cédula de Ciudadanía

**Departamento**

17

**Dirección de Domicilio**

CARRERA 7 No. 6 - 27

**Localización**

1

**Correo electrónico**

claudi3032@hotmail.com

**Regional**

17

**Número Licencia de Obra**

036

**Nombre Obra**

EMG CORREGIMIENTO DE ARAUCA

**Fecha Terminación Obra**

23/11/2021

**Tipo FIC**

01

**Mes Periodo a Pagar**

11

**Costo Total Mano de Obra**

1000000.00

**Valor Intereses Moratorios**

0.00

**Aporte SENA**

0.00

**Primer Nombre ó Razón Social**

HERNADO ANTONIO

**Tipo de documento**

03

**Naturaleza Juridica**

03

**Ciudad Capital**

1700100

**Ciudad de Domicilio**

MANIZALES

**Teléfono de Contacto**

+57,314 8446597

**Código SIIF**

3-2-07-1-02-1-04-43

**Regional Centros SIIF**

36-02-00-017-000000

**Número Contrato de Obra**

036

**Fecha Inicio Obra**

19/11/2021

**Ciudad de Ejecución de la Obra**

4413512

**Año Periodo a Pagar**

2021

**Costo Total de Obra a Todo Costo**

1000000.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**

2

**Aporte FIC**

45426.00

**Valor del Pago**

45426.00

# Comprobante

de pago en línea

## SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Pago realizado por: CLAUDIA PATRICIA VILLEGAS MUÑOZ

Nro. de factura: 73243290

Descripción del pago: Pago Ordinario - FIC

Nro. de referencia: 186.83.185.22

Nro. de referencia 2: CC

Nro. de referencia 3: 4413512

Fecha y hora de la transacción: Jueves 16 de Diciembre de 2021 04:08:18 PM

Nro. de comprobante: 0000087224

Valor pagado: \$ 45,426.00

Cuenta: \*\*\*\*\*7145

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 381 8080 - Cartagena 695 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 895 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a [correosospchoso@bancolombia.com](mailto:correosospchoso@bancolombia.com)





HERNANDO ANTONIO VALLEJO  
HERRERA  
NIT 4.413.512-7  
CR 10 2 13  
Tel: (036) 3116183675  
Chinchiná - Colombia  
claudi3032@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. FE-41

Señores	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUDIENDO EMPLEAR LA EXPRESION ABREVIADA EMPOCAL		
NIT	890.803.239-9	Teléfono	(036) 8867080
Dirección	CR 23 75 82	Ciudad	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/12/2021, 09:32
Expedición	22/12/2021, 09:34
Vencimiento	22/12/2021

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	REPARACION POR EMERGENCIA TUBERIA DE 3 SECTOR CAJA AGRARIA CORREGIMIENTO ARAUCA	741,015.00	741,015.00
2	ADMINISTRACION	177,844.00	177,844.00
3	IMPREVISTOS	37,051.00	37,051.00
4	UTILIDADES	37,051.00	44,090.69

Total items: 4

Valor en Letras:

Un millón de pesos m/cte con sesenta y nueve cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 1,000,000.69

Observaciones:

Acto 036 de noviembre de 2021

Total Bruto	992,961.00
IVA 19%	7,039.69
Total a Pagar	1,000,000.69

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764017262915 aprobado en 20210831 prefijo FE desde el número 38 al 150 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa  
CUFE: 6d3df0e3ebf0dce12a7e378b26b81d74fa4c4470c37aceed15d2292787fd8943473985b4f63892551e7e08d97b6a3c

**EMPOCALDAS S.A E.SP.**  
**EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS**  
**SECCIONAL PALESTINA - CALDAS -**

<b>CONTRATO No.:</b> ACTO 036 DE 2021	<b>INFORME DE OBRA</b>	<b>DE</b> 1 Y	<b>FECHA FINAL:</b> NOVIEMBRE 23 DE 2021
--	------------------------	------------------	--

REPARACION POR EMERGENCIA TUBERIA DE 3" SECTOR CAJA AGRARIA CORREGIMIENTO DE ARAUCA

<b>MUNICIPIO:</b> PALESTINA, CALDAS.-	<b>VALOR ACTO:</b> \$ 1.000.000
--	------------------------------------

**REPRESENTANTE LEGAL:**  
ANDRES FELIPE TABA  
ARROYAVE

<b>CONTRATISTA:</b> HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA	<b>SUPERVISION:</b> ING. JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	<b>FECHA:</b> NOVIEMBRE 23 DE 2021
--	--	--

**INFORME DE OBRA**

A continuación, se detalla el plazo contractual y la fecha de término de la obra:

- Fecha inicio de obra: 19 de Noviembre de 2021
- Plazo contractual: 5 días.
- Total de días paralizados: 0 días
- Total de días ampliados: 5 días calendario
- Fecha de término de la obra: 23 de noviembre 2021
- Total de días para ejecución de obras: 5 días

**AVANCE DE OBRA**

Avance acumulado ejecutado a 23 de Noviembre 2021: 100%


**Registro Fotográfico:**



- REPARACION POR EMERGENCIA TUBERÍA DE 3" PORTAFLANCHE Y BRIDAS LOCAS



*Imagen 1. UNION DE REPARACION TUBERÍA DE 3" – CONEXIÓN A POLIETILENO*

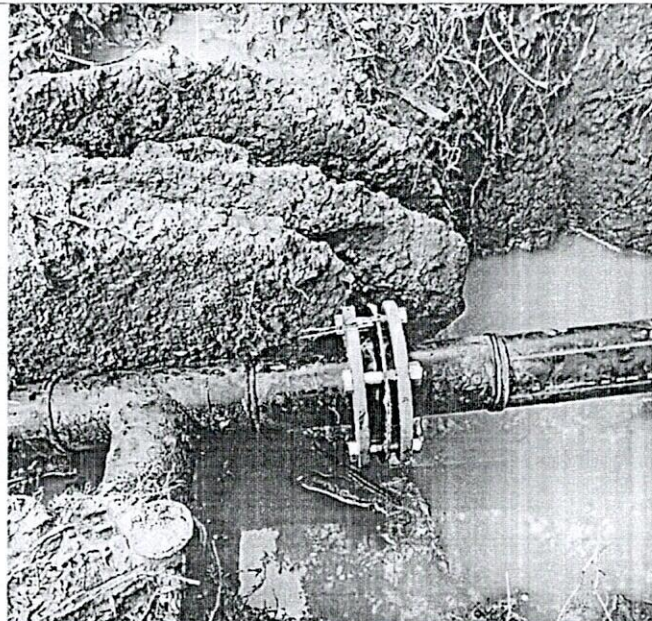

*Imagen 2. Detalle de los elementos de la reparació*



*Imagen 3. Longitud del tramo reparado*

**NOVEDADES**

- **REPARACION TUBERIA 3" PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CONDOMINIOS SECTOR LAS MARGARITAS**
  - Desplazamiento al sitio del evento
  - Actividades de excavación para despejar la zona del daño
  - Suspensión del servicio de acueducto para efectuar la reparación
  - Transporte de máquina para uniones a la red existente
  - Ubicación de portaflanche para realizar los empalmes a la red existente
  - Instalación de tubería de polietileno
  - Prueba hidráulica

**HERNANDO A. VALLEJO HERRERA**  
Contratista




HERNANDO ANTONIO VALLEJO  
 NIT :4.413.512  
 NOMINA DEL 19 NOVIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DEL 2021  
 ACTA 036

No	DOCUMENTO	Gastos de Personal			BASE SUELDO	Dias DIAS TRABAJADOS	Salario VALR DIAS TRABAJADOS	Auxilio TRANSPOR TE	Devengado TOTAL DEVENGADO	Salud			Pensión		NETO A PAGAR QUINCENAL	FIRMA
		NOMBRES	APELLIDOS	CARGO						8,5%	4,0%	12,00%	4,00%			
1	105496298	JUAN DAVID	VALLEJO GIRALDO	AUXILIAR	\$ 1.370.000	5	228.333	17.742	246.076	-	9.133	9.133	-	9.133	227.809	<i>Juan David Vallejo</i>
2	1061624128	WILMAR JOVANNY	OCAMPO GIRALDO	AUXILIAR	\$ 808.526	5	151.421	17.742	169.163	-	6.057	6.057	-	6.057	157.050	<i>Victor Manuel Cortes Rincon</i>
3	4416882	VICTOR MANUEL	RINCON CORTES	AUXILIAR	\$ 808.526	5	151.421	17.742	169.163	-	6.057	6.057	-	6.057	157.050	VICTOR RINCON
TOTAL					3.187.052	15	379.754	35.485	415.239	-	15.190	15.190	-	15.190	384.859	

*Hernando Vallejo*

HERNANDO ANTONIO VALLEJO  
 NIT :4.413.512  
 EMPLEADOR

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	

Informe Número	1	Fecha del informe	10-DIC-2021	Acta 1	1 Y FINAL	Acta final	X
----------------	---	-------------------	-------------	--------	-----------	------------	---

Número del contrato	<i>acto</i>	AUTO 036-2021
Objeto:	✓	REPARACION POR EMERGENCIA TUBERIA DE 3" SECTOR CAJA AGRARIA CORREGIMIENTO DE ARAUCA
Nombre Contratista:	✓	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Fecha del contrato:	✓	12-11-2021
Plazo de ejecución:	✓	5 días calendario
Valor inicial:	✓	\$ 1.000.000
Fecha de iniciación:	✓	19 de Noviembre de 2021
Fecha de suspensión:		NA
Fecha de reiniciación:		NA
Fecha de terminación inicial:	✓	23 Noviembre de 2021
Nueva fecha de terminación:		NA
Adición (en valor):		NA
Prórroga (en tiempo):		NA
Supervisor:	✓	Juan Pablo Zuluaga Correa

## 1. AVANCE DEL CONTRATO

### 1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	✓	100 %
Avance físico Acumulado	✓	100 %

### 1.2. Informe de actividades


INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
ARAUCA	ACUEDUCTO	



### 1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	5 días
Tiempo total transcurrido:	5 días
Avance Porcentual:	100 %

### 1.4. Registro fotográfico

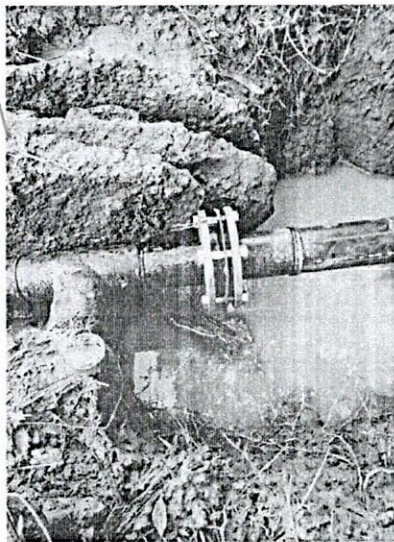

Fotos 1, 2 y 3: actividades de reparación mediante excavación, suministro e instalación por termo fusión de 2 portaflanche de 3" para polietileno, instalación de dos (2) bridas locas con tornillería y empaque, dos soldaduras por termo fusión.



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

#### 1.5. Problemáticas con la obra

##### Origen de la Emergencia:

Por medio del presente le informo que hoy 12 de Noviembre del 2021, siendo las 6am se presentó un daño en la tubería de 3" polietileno, ubicado en el sector de las margaritas más exactamente en la finca de la caja agraria, quedándose sin servicio los condominios de las margaritas, cerros y mirador de la cruz, donde al parecer hubo daño de la Tee de 3" de polietileno que alimenta la tubería de 8" que conduce al corregimiento de Arauca.

Por lo anterior necesito de la manera más atenta se atienda esta emergencia presentada y se disponga de un rubro especial para el arreglo de la tubería el cual se necesita un equipo de soldadura de termofusión..

#### 1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$1.000.000
Inversión ejecutada en el periodo:	\$1.000.000
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	\$ 1.000.000
Porcentaje total ejecutado:	100%

#### 2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES

Por la mínima cuantía contratada no tiene exigencia de Pólizas

#### 3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

Al paquete de pago se anexa las certificaciones de pago de la seguridad social del contratista y los empleados a cargo.

Adicionalmente, parafiscales y FIC.

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN

FECHA DE INSPECCION	ELEMENTOS DE PROTECCION	CONVENCION
24-nov	CASCO	A
24-nov	OVEROL	NU
24-nov	GUANTES	NU
24-nov	BOTAS	A
24-nov	CARNE	NU
24-nov	CHALECO	A
24-nov	SEÑALIZACION	A
24-nov	CAPACITACION SOBRE EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	A

Convenciones: A:adecuada - D:deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		
			CANT	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
Reparación por emergencia tubería de 3" sector Caja Agraria corregimiento de Arauca					
1	Suministro e instalación por termo fusión de 2 portaflanche de 3" para polietileno dos (2) bridas locas, tornillería y empaque y dos soldaduras por termo fusión, incluye además transporte de maquinaria y equipos desde Chinchiná	Glb	1,00	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

3 empleos director X 5 días calendario



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

#### 7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

Usuarios de los condominios del sector Las Margaritas del corregimiento de Arauca, Palestina.


#### 8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		x
Acta de veeduría		x
Acta de convenio de precios		x
Plan de manejo ambiental		x
Ensayos de laboratorio		x
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		x
Bitácora de la obra		x
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		x
Paz y Salvo oficina de trabajo.	x	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	x	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		x
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar		x

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1

4

Juan Pablo Zuluaga  
NOMBRE DEL SUPERVISOR

  
FIRMA DEL SUPERVISOR



Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

# O.C

CONTRATO

# CONTRATO

Acta N°

X

ACTO 038-2021

1 y final

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
13014:AGUADAS COSTOS COMPARITIDOS	1301107 Reposición de Redes	7.998.494	56.706	8.055.200	ACUEDUCTO	8.055.200	-	8.055.200
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-1

7.998.494	56.706	8.055.200	8.055.200	-	8.055.200
-----------	--------	-----------	-----------	---	-----------

TOTAL FACTURA PAG-1


7.998.494	56.706	8.055.200	8.055.200	-	8.055.200
-----------	--------	-----------	-----------	---	-----------

Fecha de presentación

Páginas

FIN 1

**DATOS DEL SUPERVISOR**

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO ZONA CENTRO NORTE
NOMBRE	CARGO
 FIRMA	

**EMPOCALDAS A. S. E.S.P.**  
**EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS**  
**ZONA CENTRO-NORTE**

<b>CONTRATO No.:</b>	Acto 036 de Noviembre 12 de 2021	<b>ACTA No.:</b>	ACTA 01 y Final	<b>FECHA CORTE:</b>	Noviembre 23 de 2021
<b>OBJETO CONTRATO:</b>	REPARACION POR EMERGENCIA TUBERIA DE 3" SECTOR CAJA AGRARIA CORREGIMIENTO DE ARAUCA	<b>FECHA INICIACION:</b>	19 de Noviembre de 2021	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b>	Noviembre 23 de 2021
<b>CONTRATISTA:</b>	Hernando Antonio Vallejo Herrera	<b>PRORROGA:</b>	NA	<b>VALOR ADICION:</b>	-
		<b>SUPERVISOR:</b>	Ingeniero Zona Centro-Norte	<b>FECHA:</b>	Diciembre 13 de 2021

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL			ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE ACTA			ACUMULADO PRESENTE ACTA		
			CANT	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	
1	Reparacion por emergencia tubería de 3" sector Caja Agraria corregimiento de Arauca	Glb	1,00	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	-	\$ 1.000.000	1,00	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	1,00	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	
	<b>COSTO TOTAL</b>				\$ 1.000.000		\$ 1.000.000		\$ 1.000.000	\$ 1.000.000		\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	
	<b>COSTO DIRECTO</b>				\$ 741.015		\$ 741.015		\$ 741.015	\$ 741.015		\$ 741.015	\$ 741.015	
	<b>ADMINISTRACION</b>				\$ 177.844		\$ 177.844		\$ 177.844	\$ 177.844		\$ 177.844	\$ 177.844	
	<b>IMPREVISTOS</b>				\$ 37.051		\$ 37.051		\$ 37.051	\$ 37.051		\$ 37.051	\$ 37.051	
	<b>UTILIDADES</b>				\$ 37.051		\$ 37.051		\$ 37.051	\$ 37.051		\$ 37.051	\$ 37.051	
	<b>IVA</b>				\$ 7.040		\$ 7.040		\$ 7.040	\$ 7.040		\$ 7.040	\$ 7.040	
	<b>COSTO TOTAL</b>				\$ 1.000.000		\$ 1.000.000		\$ 1.000.000	\$ 1.000.000		\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	

SON: UN MILLON DE PESOS MCETE

**RESUMEN DEL CONTRATO:**

Valor del Contrato	\$ 1.000.000
Valor Acta 1 Y final	\$ -
Saldo No ejecutado	\$ -
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 1.000.000</b>

1.000.000	\$ 1.000.000
	\$ -
	\$ -
<b>\$ 1.000.000</b>	<b>\$ 1.000.000</b>

*[Signature]*  
**Vo. Bc.: JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**  
**ING. ZONA CENTRO-NORTE**  
**SUPERVISOR**

*[Signature]*  
**HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA**  
**Contratista**



**EL SUSCRITO INGENIERO JUAN PABLO ZULUAGA CORREA  
 INGENIERO ZONA ORIENTE DE LA EMPRESA DE OBRAS DE CALDAS  
 EMPOCALDAS S.A. ESP.**

**HACE CONSTAR QUE:**

**HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA** identificado con C.C: 4.413.512 suscribió el Acto 036-2021 con EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Que la información de dicho contrato se relaciona a continuación:

**Contrato:** ✓ Acto 036 de 2021  
**Contratista:** ✓ HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA  
**Objeto:** ✓ REPARACION POR EMERGENCIA TUBERIA 3" ECTOR CAJA AGRARIA CORREGIMIENTO DE ARAUCA  
**VALOR DEL CONTRATO:** ✓ \$ 1.000.000  
**FECHA DE INICIACIÓN:** ✓ Noviembre 19 de 2021  
**FECHA TERMINACION:** ✓ Noviembre 23 de 2021

Que las cantidades correspondientes al Acta No. 1 y final ejecutas fueron:

REPARACION POR EMERGENCIA TUBERIA 3" ECTOR CAJA AGRARIA CORREGIMIENTO DE ARAUCA					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	Suministro e instalación por termo fusión de 2 portaflanche de 3" para polietileno dos (2) bridas locas, tornillería y empaque y dos soldaduras por termofusion, incluye además transporte de maquinaria y equipos desde Chinchiná.	Glb	1	1.000.000	1.000.000
	<b>Costo directo</b>				741.015
	Administración	%	24		177.844
	Imprevisto	%	5		37.051
	Utilidad	%	5		37.051
	IVA	%	19		7.040
	<b>Vir total Obras</b>				<b>1.000.000</b>



f @Empocaldas @empocaldas\_oficial  
✉ empo@empocaldas.com.co  
🌐 www.empocaldas.com.co

Para constancia se firma a los 23 días del mes de Noviembre de 2021.

**JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**  
Ingeniero Zona Centro Norte  
Empocaldas S.A. E.S.P.



📍 Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas  
☎ PBX: (+57) (6) 886 7080 NIT: 890.803.239-9
