	F-GC-22 Versión 10 Junio 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA	

# CONTRATO Y AÑO	037-2021	Acta N°	1 y final	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	18.326.000
				2. VALOR ADICION	0
CONTRATISTA	GEOFORAGROS LTDA			3. VALOR TOTAL (1+2)	18.326.000
NIT O CC:	800252749-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	000281 del 18-Enero-2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	18.326.000
RP (#, rubro y fecha)	000230 del 19-Enero-2022			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	0
OBJETO DEL CONTRATO:	LIMPIEZA DE BOCATOMA POR EMERGENCIA EL LLANO-RIO GUARINO UBICADA EN VICTORIA QUE ABASTECE EL ACUEDUCTO DE LA DORADA EMERGENCIA POR DISMINUCIÓN DE CAUDAL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

DOCUMENTO VERIFICADOS		√	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.		NA	
3- Pagos al FIC		X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	
5- Informe de actividades o Bitácora.		X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.		X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20			
8- Ensayos de densidad.		NA	
9- Diseño de Mezclas.		NA	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.		NA	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)		NA	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51		NA	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)		NA	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)		X	
15- Acta parcial o final del contrato.		X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		√
Factura original o Documento equivalente		
Acta parcial o final del contrato.		
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		
Copia del registro presupuestal		

Fecha de presentación

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO DE ZONA	FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
00130467000100008669	CUENTA CORRIENTE	BBVA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Ido. PATTY.
01-03-2022
10:57am

Pág



lligite el No. de referencia 7009906

Ser
Co
wa

DIC 07 2021 17:59:53 REPONES 9.35
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO III PUER
CRA 11 13 40
C.UANCO: 3007024982
RECIBO: 025772
TER: 48121033
RRR: 027858
APRO: 110782

**PAGOS EN EFECTIVO
EQUE**

ORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
solo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a restar la liquidación y
generar un nuevo cupón

TICKET		
73122256		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
06	12	2021
FECHA VENCIMIENTO		
11	12	2021

RECAUDO
CONVENIO: 29232
SERVICIO NACIONAL DE
REF: 7009906

VALOR \$ 68.150
Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta.

RAGROS LTDA

Identificación: 800252749

Telefono: +57,1 8399606

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		
3-2-07-1-02-1-04-43		
Caidas		
SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS.		
	SUBTOTAL	\$68,150.00
	IVA	
	TOTAL →	\$68,150.00

Observaciones

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (solo efectivo o todo con cheque).
La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m² (papel para fotocopiado).
No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas.



(415)7707012100010(8020)7009906(3900)00000068150(86)20211211

CE 14039

Bancolombia

CONVENIO No 29232

TICKET No. 73122256

Ciudad	Nro Cédula	Telefono
	800252749	
Nombre del Pagador /Cliente		
GEOFORAGROS LTDA		

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Las cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.	CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO
		CHEQUE
		TOTAL

AREA PARA SELLO

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	73122256	917818980365	07/12/2021

Número de Identificación

800252749

Primer Apellido (si es Persona natural)**Dígito de Verificación (Si es persona**

0

Departamento

11

Dirección de Domicilio

CL 148 21 79

Localización

1

Correo electrónico

contabilidadgeoforagros Ltda@gmail.com

Regional

17

Número Licencia de Obra

037

Nombre Obra

EMPOCLADAS ESP

Fecha Terminación Obra

15/11/2021

Tipo FIC

01

Mes Periodo a Pagar

11

Costo Total Mano de Obra

2423000.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

GEOFORAGROS LTDA

Tipo de documento

01

Naturaleza Jurídica

01

Ciudad Capital

1100100

Ciudad de Domicilio

BOGOTA

Teléfono de Contacto

+57,1 8399606

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

ACTO 037

Fecha Inicio Obra

01/11/2021

Ciudad de Ejecución de la Obra

LA DORADA CALDAS

Año Periodo a Pagar

2021

Costo Total de Obra a Todo Costo

0.00

Número de Trabajadores en el Periodo

3

Aporte FIC

68139.00

Valor del Pago

68139.00

COMPRÓBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	73122256	917818980365	07/12/2021

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **800252749**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP:

Su transacción fue Total Pagado **\$ 68,150.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 68,150.00	\$ 68,139.00

GEOFORAGROS SAS
 NIT.: 800252749-0
 CR 14 17 75
 PUERTO SALGAR
 Tel: 8399606
 CIU: 4290
 geoforagros Ltda@gmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
 Numero: FVE309
 Fecha : 2022-FEB-16 05:29 PM
 Pagina: 01 de 01

Cliente : EMPOCALDAS SA ESP | Forma de Pago: CREDITO | Fecha de Vencimiento
 NIT. : 890803239-9 Codigo: 890803239 | CREDITO 30 DIAS | 2022-MAR-16
 Direccion : CL 16 8 19
 Telefono : 8658035 Fax: | Vendedor: 2834586 GARCIA BELTRAN JOSE RAFAEL
 Email : facturacionelectronica@empocaldas.com.co
 Contacto : | OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Moneda
 Ciudad : SAMANA | | | PESOS

Referencia	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	VALOR UNITARIO	Descuento	Valor_Total	Impto.
10007	SERVICIOS CONEXAS LIMPIEZA DE BOCATOMA POR EMERGENCIA EL LLANO-RIO GUARINO UBICADA EN VICTORIA QUE ABASTECE EL ACUEDUCTO DE LA DORADA EMERGENCIA POR DISMINUCION DE CAUDAL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS SEGUN ACTO 037	1.000		15,400,000.00	0.00	15,400,000.00	19.00

TOTAL_BRUTO	DESCUENTOS	SUB_TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL_NETO
15,400,000.00	0.00	15,400,000.00	2,926,000.00	1,131,900.00	17,194,100.00

Valor Letras: DIECISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS MCTE.

[DETALLE DE VALORES]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
119	15,400,000	2,926,000	100	0	0	100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0						
RTE FUENTE :	616,000.00	RTE IVA:	438,900.00	RTE ICA:	77,000.00	RTE OTROS:	0.00				

Observacion: LIMPIEZA DE BOCATOMA POR EMERGENCIA

SOMOS RESPONSABLES DE IVA Y NO SOMOS AUTORRETENEDORES. FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CTE No 467008660 DEL BBVA A NOMBRE DE GEOFORAGROS LTDA.

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
 Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764024926171 vigente de FEB-03-2022 Hasta FEB-03-2023
 Numeracion Habilitada FVE307 Al FVE500 Vigencia: 12 Meses

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.
 Cufe:f4c59e9bdb5bc9d31659a0ee415e236f7e734d1d5elc3de2c8441efa5f7fac9b6e61660f8e0955b5f8debc5b9d502c6f
 Fecha de certificacion: 2022-02-16T17:29:28.

Forma digital: Ay6JqM/bbhXfxcVnGr6WfdaIC7+p4c1twNlTIRS1sQc1s89u6VkrKx40bn2qXW4osdKa+Gcv3PhHgc10m57QUvqvbudM0T+/ZvF9LZtPh:6SkMI2xolZLCoNDV1pKnPR1zdaG1qrEFfCcsP+rt2Y00+vwGo0GH1Xc
 tYskcM660y3/bwV6HfpPphmWtz6dr1/KW1M41qNp1sKV0Qa/qkxzncUJ0abK/yghYKQFjV2o0H8Kxh3rrwuPFounPr2JyBMZj+Qo1SX9C3yAy7znqF44e0BHKW9:51zhqGhuYU4



INFORME DE EJECUCION DE OBRA

CONTRATO No. 037 de 22 noviembre 2021 ✓

Dicembre 2021 ✓
La Dorada, Caldas

TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	2 ✓
2. RESUMEN EJECUTIVO	2 ✓
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	2 ✓
4. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO	3 ✓
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	5 ✓

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El propósito fundamental del contrato No. 037 de noviembre 22 de 2021 consiste en desempeñar Rehabilitación de Infraestructura Plantas, Redes, Bocatoma en Emergencia, bajo labores de limpieza de bocatoma por emergencia de disminución de caudal en El Llano - Río Guarinó ubicada en la vereda El Llano del municipio de Victoria, que abastece el acueducto del municipio de La Dorada, Caldas; por tal razón es urgente e imprescindible realizar dicha actividad, debido a que podría verse en riesgo la prestación del servicio al municipio.

2. RESUMEN EJECUTIVO

El contrato No. 037 de 2021 cuyo objeto es *LIMPIEZA DE BOCATOMA POR EMERGENCIA EL LLANO - RIO GUARINO UBICADA EN VICTORIA QUE ABASTECE EL ACUEDUCTO DE LA DORADA, EMERGENCIA POR DISMINUCION DE CAUDAL, MUNICIPIO DE LA DORADA-CALDAS*, tiene fecha de inicio el 30 de noviembre de 2021 y plazo de ejecución de 20 días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio, ejecutándose en trabajo continuo durante los primeros días de diciembre hasta agotar el presupuesto de \$ 18.326.000.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Tabla 1. Descripción General

CONTRATO No.	037 de Noviembre 2021
OBJETO	LIMPIEZA DE BOCATOMA POR EMERGENCIA EL LLANO - RIO GUARINO UBICADA EN VICTORIA QUE ABASTECE EL ACUEDUCTO DE LA DORADA, EMERGENCIA POR DISMINUCION DE CAUDAL, MUNICIPIO DE LA DORADA-CALDAS.
VALOR EN PESOS	\$ 18.326.000
PLAZO	20 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO	30-Noviembre-2021




4. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

A continuación, se presentan las actividades ejecutadas durante el periodo asociado al Acta de Ejecución de obra: ✓

Se realizó la movilización de la maquinaria hacia el punto de intervención el día 30 de Noviembre de 2021. ✓



Ilustración 1. Transporte de Maquinaria Pesada, se realiza excavación y limpieza mecánica en El Llano – Rio Guarinó dando caudal a la misma

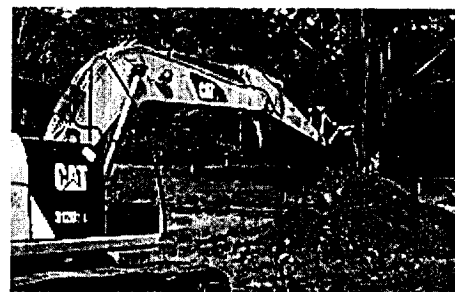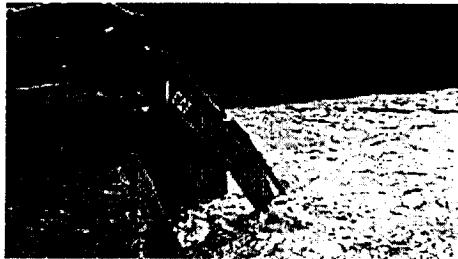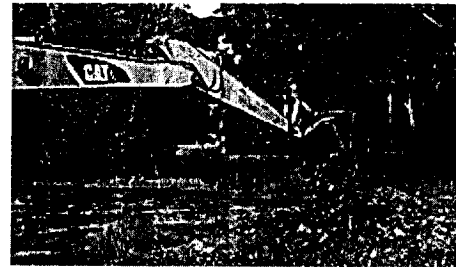

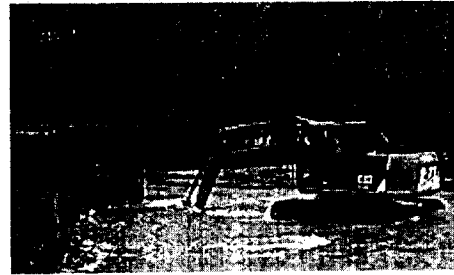
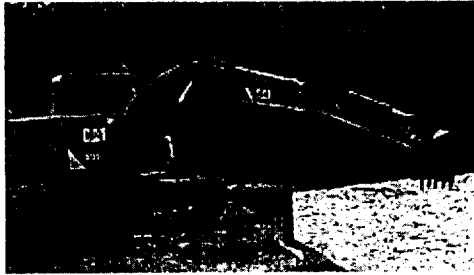
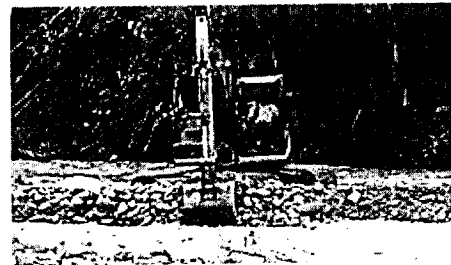
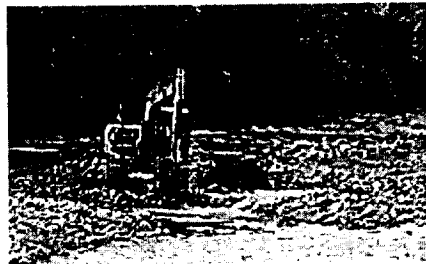
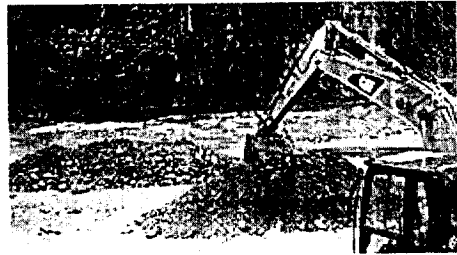
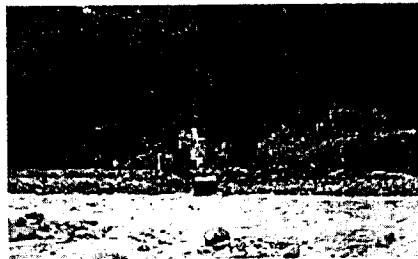
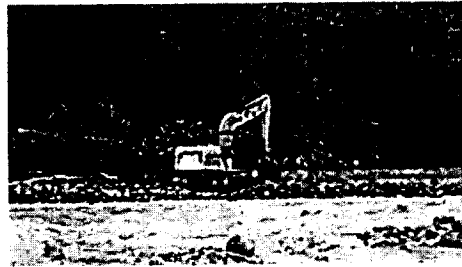
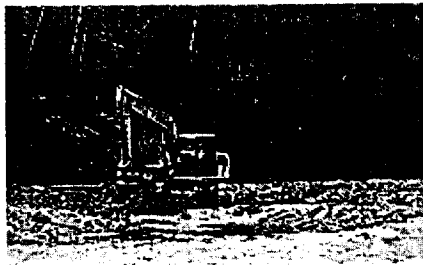


Ilustración 2. Excavación mecánica y dragado de bocatoma.

El 7 de Diciembre se finaliza rehabilitación y limpieza de bocatoma El Llano – Rio Guarinó.



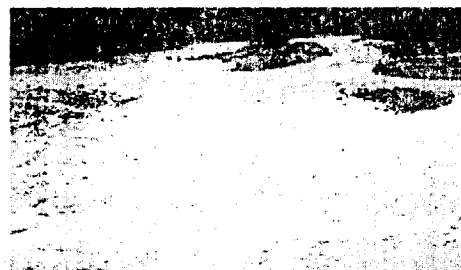


Ilustración 3. Limpieza y rehabilitación bocatoma El Llano.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Las obras se realizaron de acuerdo con lo especificado en el procedimiento de trabajo y tiempo estimado en el PDT sin generar retrasos.
- No se realizaron afectaciones a ecosistemas, ni se realizaron obras que afecten el medio ambiente circundante en la zona.
- No se presentaron inconvenientes con el personal del área intervenida.
- Se finalizaron las actividades al 100% en el sector El Llano – Rio Guarinó del municipio de Victoria, Caldas.
- No ocurrieron accidentes ni incidentes que pudieran afectar a terceros.
- Se hicieron todos los pagos de ley estipulados en el contrato.

GEOFORAGROS SAS	
Nit : 800.252.749-0	
Pago de Nómina Personal Legal	
PERIODO: 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	
PROYECTO	BODEGA
ITEM	9
Nombre Empleado	CARLOS ARTURO ROJAS HERNANDEZ
Grupo	OPER RET
Cédula N°	10.175.197
Cargo	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
Salario Básico Diario	\$ 33.333,3
Fecha inicial	16 de noviembre de 2021
Fecha final	30 de noviembre de 2021
Dias ausencia	
Dias laborados quincena	15

1. SALARIOS				
CONCEPTO	PORCENTA JE	VALOR	CANT.	VALOR
DIAS ORDINARIOS		\$ 33.333,30	15	\$ 500.000
HRS EXT. DIURNAS	1,25	\$ 5.208,33		\$ -
HRS EXT. NOCTURNAS	1,75	\$ 7.291,66		\$ -
HRS EXT. DIUR. FESTIVAS-DOM	1,75	\$ 7.291,66		\$ -
HRS EXT. NOCT FESTIVAS-DOM	2,50	\$ 10.416,66		\$ -
SUB. TRANSPORTE		\$ 3.548,47	15	\$ 53.227
TOTAL SALARIOS DEVENGADOS				\$ 553.227

2. DEDUCCIONES		
CONCEPTO	PORCENTAJE	VALOR
APOORTE A SALUD	4%	\$ 20.000
APOORTE A PESION	4%	\$ 20.000
DESCUENTOS -PRESTAMOS-		
FONDO SOLIDARIDAD PENS.	1%	
TOTAL DEDUCCIONES		\$ 40.000

VALOR TOTAL QUINCENA	\$ 513.227
-----------------------------	-------------------

Carlos A. Rojas
Recibí Conforme
C.C. No.

Elaboró
JENNIFER TABORDA ARBOLEDA

Revisó
LUZ CARIME CADENA SANCHEZ

Aprobó
RAFAEL GARCIA BELTRAN Y/O
MIGUEL ANGEL GARCIA CRUZ

GEOFORAGROS SAS	
Nit : 800.252.749-0	
Pago de Nómina Personal Legal	
PERIODO: 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021	
PROYECTO	BODEGA
ITEM	9
Nombre Empleado	CARLOS ARTURO ROJAS HERNANDEZ
Grupo	OPER RET
Cédula N°	10.175.197
Cargo	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
Salario Básico Diario	\$ 33.333,3
Fecha inicial	1 de noviembre de 2021
Fecha final	15 de noviembre de 2021
Dias ausencia	
Dias laborados quincena	15

1. SALARIOS				
CONCEPTO	PORCENT AJE	VALOR	CANT.	VALOR
DIAS ORDINARIOS		\$ 33.333,30	15	\$ 500.000
HRS EXT. DIURNAS	1,25	\$ 5.208,33		\$ -
HRS EXT. NOCTURNAS	1,75	\$ 7.291,66		\$ -
HRS EXT. DIUR. FESTIVAS-DOM	1,75	\$ 7.291,66		\$ -
HRS EXT. NOCT FESTIVAS-DOM	2,50	\$ 10.416,66		\$ -
SUB. TRANSPORTE		\$ 3.548,47	15	\$ 53.227
TOTAL SALARIOS DEVENGADOS				\$ 553.227

2. DEDUCCIONES		
CONCEPTO	PORCENTAJE	VALOR
APOORTE A SALUD	4%	\$ 20.000
APOORTE A PESION	4%	\$ 20.000
DESCUENTOS -PRESTAMOS-		
FONDO SOLIDARIDAD PENS.	1%	
TOTAL DEDUCCIONES		\$ 40.000

VALOR TOTAL QUINCENA	\$ 513.227
-----------------------------	-------------------

Carlos A. Rojas
Recibí Conforme
C.C. No.

Elaboró
JENNIFER TABORDA ARBOLEDA

Revisó
LUZ CARIME CADENA SANCHEZ


Aprobó
RAFAEL GARCIA BELTRAN Y/O
MIGUEL ANGEL GARCIA CRUZ


GEOFORAGROS SAS	
Nit : 800.252.749-0	
Pago de Nómina Personal Legal	
PERIODO: 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021	
PROYECTO	BODEGA
ITEM	9
Nombre Empleado	CARLOS ARTURO ROJAS HERNANDEZ
Grupo	OPER RET
Cédula N°	10.175.197
Cargo	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
Salario Básico Diario	\$ 33.333,3
Fecha inicial	1 de diciembre de 2021
Fecha final	15 de diciembre de 2021
Dias ausencia	
Dias laborados quincena	15

1. SALARIOS				
CONCEPTO	PORCENTAJE	VALOR	CANT.	VALOR
DIAS ORDINARIOS		\$ 33.333,30	15	\$ 500.000
HRS EXT. DIURNAS	1,25	\$ 5.208,33		\$ -
HRS EXT. NOCTURNAS	1,75	\$ 7.291,66		\$ -
HRS EXT. DIUR. FESTIVAS-DOM	1,75	\$ 7.291,66		\$ -
HRS EXT. NOCT FESTIVAS-DOM	2,50	\$ 10.416,66		\$ -
SUB. TRANSPORTE		\$ 3.548,47	15	\$ 53.227
TOTAL SALARIOS DEVENGADOS				\$ 553.227

2. DEDUCCIONES		
CONCEPTO	PORCENTAJE	VALOR
APORTE A SALUD	4%	\$ 20.000
APORTE A PESION	4%	\$ 20.000
DESCUENTOS -PRESTAMOS-		
FONDO SOLIDARIDAD PENS.	1%	
TOTAL DEDUCCIONES		\$ 40.000

VALOR TOTAL QUINCENA	\$ 513.227
----------------------	------------


 Recibí Conforme
 C.C. No. 10175197


 Elaboró
 JENNIFER TABORDA ARBOLEDA

Revisó
 LUZ CARIME CADENA SANCHEZ


Aprobó
 RAFAEL GARCIA BELTRAN Y/O
 MIGUEL ANGEL GARCIA CRUZ


GEOFORAGROS SAS	
Nit : 800.252.749-0	
Pago de Nómina Personal Legal	
PERIODO: 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
PROYECTO	BODEGA
ITEM	9
Nombre Empleado	CARLOS ARTURO ROJAS HERNANDEZ
Grupo	OPER RET
Cédula N°	10.175.197
Cargo	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
Salario Básico Diario	\$ 33.333,3
Fecha inicial	16 de diciembre de 2021
Fecha final	31 de diciembre de 2021
Dias ausencia	
Dias laborados quincena	16

1. SALARIOS				
CONCEPTO	PORCENTAJE	VALOR	CANT.	VALOR
DIAS ORDINARIOS		\$ 33.333,30	16	\$ 533.333
HRS EXT. DIURNAS	1,25	\$ 5.208,33		\$ -
HRS EXT. NOCTURNAS	1,75	\$ 7.291,66		\$ -
HRS EXT. DIUR. FESTIVAS-DOM	1,75	\$ 7.291,66		\$ -
HRS EXT. NOCT FESTIVAS-DOM	2,50	\$ 10.416,66		\$ -
SUB. TRANSPORTE		\$ 3.548,47	16	\$ 56.776
TOTAL SALARIOS DEVENGADOS				\$ 590.109

2. DEDUCCIONES		
CONCEPTO	PORCENTAJE	VALOR
APORTE A SALUD	4%	\$ 21.333
APORTE A PESION	4%	\$ 21.333
DESCUENTOS -PRESTAMOS-		\$ 50.000
FONDO SOLIDARIDAD PENS.	1%	
TOTAL DEDUCCIONES		\$ 92.666

VALOR TOTAL QUINCENA	\$ 497.443
----------------------	------------


 Recibí Conforme
 C.C. No. 10175197



 Elaboró
 JENNIFER TABORDA ARBOLEDA

Revisó
 LUZ CARIME CADENA SANCHEZ

Aprobó
 RAFAEL GARCIA BELTRAN Y/O
 MIGUEL ANGEL GARCIA CRUZ

GEOFORAGROS SAS

Nit : 800.252.749-0



Pago de Nómina
Personal Legal

PERIODO: 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

PROYECTO	BODEGA
ITEM	16
Nombre Empleado	ORLANDO GARCIA DONCEL
Grupo	AYUD.
Cédula N°	10.181.740
Cargo	AYUDANTE
Salario Básico Diario	\$ 30.284,2
Fecha inicial	16 de noviembre de 2021
Fecha final	30 de noviembre de 2021
Días ausencia	
Días laborados quincena	15

1. SALARIOS

CONCEPTO	PORCENTAJE	VALOR	CANT.	VALOR
DIAS ORDINARIOS		\$ 30.284,20	15	\$ 454.263
HRS EXT. DIURNAS	1,25	\$ 4.731,91	11,5	\$ 54.417
HRS EXT. NOCTURNAS	1,75	\$ 6.624,67	4	\$ 26.499
HRS EXT. DIUR. FESTIVAS-DOM	1,75	\$ 6.624,67		\$ -
HRS EXT. NOCT FESTIVAS-DOM	2,50	\$ 9.463,81		\$ -
SUB. TRANSPORTE		\$ 3.548,47	15	\$ 53.227
TOTAL SALARIOS DEVENGADOS				\$ 588.406

2. DEDUCCIONES

CONCEPTO	PORCENTAJE	VALOR
APORTE A SALUD	4%	\$ 21.407
APORTE A PESION	4%	\$ 21.407
DESCUENTOS -PRESTAMOS-		
FONDO SOLIDARIDAD PENS.	1%	
TOTAL DEDUCCIONES		\$ 42.814

VALOR TOTAL QUINCENA \$ **545.592**

Recibí/Conforme

C.C. No. 10181740

Elaboró

JENNIFER TABORDA ARBOLEDA

Revisó


LUZ CARIME CADENA SANCHEZ

Aprobó

RAFAEL GARCIA BELTRAN Y/O
MIGUEL ANGEL GARCIA CRUZ

GEOFORAGROS SAS

Nit : 800.252.749-0



Pago de Nómina
Personal Legal

PERIODO: 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021

PROYECTO	BODEGA
ITEM	17
Nombre Empleado	ORLANDO GARCIA DONCEL
Grupo	AYUD.
Cédula N°	10.181.740
Cargo	AYUDANTE
Salario Básico Diario	\$ 30.284,2
Fecha inicial	1 de noviembre de 2021
Fecha final	15 de noviembre de 2021
Días ausencia	
Días laborados quincena	15

1. SALARIOS

CONCEPTO	PORCENTAJE	VALOR	CANT.	VALOR
DIAS ORDINARIOS		\$ 30.284,20	15	\$ 454.263
HRS EXT. DIURNAS	1,25	\$ 4.731,91	6	\$ 28.391
HRS EXT. NOCTURNAS	1,75	\$ 6.624,67		\$ -
HRS EXT. DIUR. FESTIVAS-DOM	1,75	\$ 6.624,67		\$ -
HRS EXT. NOCT FESTIVAS-DOM	2,50	\$ 9.463,81		\$ -
SUB. TRANSPORTE		\$ 3.548,47	15	\$ 53.227
TOTAL SALARIOS DEVENGADOS				\$ 535.881

2. DEDUCCIONES

CONCEPTO	PORCENTAJE	VALOR
APORTE A SALUD	4%	\$ 19.306
APORTE A PESION	4%	\$ 19.306
DESCUENTOS -PRESTAMOS-		
FONDO SOLIDARIDAD PENS.	1%	
TOTAL DEDUCCIONES		\$ 38.612

VALOR TOTAL QUINCENA \$ **497.269**

Recibí/Conforme

C.C. No. 10181740

Elaboró

JENNIFER TABORDA ARBOLEDA

Revisó

LUZ CARIME CADENA SANCHEZ

Aprobó


RAFAEL GARCIA BELTRAN Y/O
MIGUEL ANGEL GARCIA CRUZ


GEOFORAGROS SAS	
Nit : 800.252.749-0	
Pago de Nómina Personal Legal	
PERIODO: 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021	
PROYECTO	BODEGA
ITEM	15
Nombre Empleado	IVAN LOPEZ ALCAZAR
Grupo	AYUD.
Cédula N°	10.166.458
Cargo	AYUDANTE
Salario Básico Diario	\$ 30.284,2
Fecha inicial	1 de diciembre de 2021
Fecha final	15 de diciembre de 2021
Dias ausencia	
Dias laborados quincena	15

1. SALARIOS				
CONCEPTO	PORCENTA JE	VALOR	CANT.	VALOR
DIAS ORDINARIOS		\$ 30.284,20	15	\$ 454.263
HRS EXT. DIURNAS	1,25	\$ 4.731,91		\$ -
HRS EXT. NOCTURNAS	1,75	\$ 6.624,67		\$ -
HRS EXT. DIUR. FESTIVAS-DOM	1,75	\$ 6.624,67		\$ -
HRS EXT. NOCT FESTIVAS-DOM	2,50	\$ 9.463,81		\$ -
SUB. TRANSPORTE		\$ 3.548,47	15	\$ 53.227
TOTAL SALARIOS DEVENGADOS				\$ 507.490

2. DEDUCCIONES		
CONCEPTO	PORCENTAJE	VALOR
APORTE A SALUD	4%	\$ 18.171
APORTE A PENSION	4%	\$ 18.171
DESCUENTOS -PRESTAMOS-		
FONDO SOLIDARIDAD PENS.	1%	
TOTAL DEDUCCIONES		\$ 36.342

VALOR TOTAL QUINCENA	\$ 471.148
----------------------	------------


 Recibi Conforme
 C.C. No. 10.166.458


 Elaboró
 JENNIFER TABORDA ARBOLEDA

Revisó
 LUZ CARIME CADENA SANCHEZ


Aprobó
 RAFAEL GARCIA BELTRAN Y/O
 MIGUEL ANGEL GARCIA CRUZ


GEOFORAGROS SAS	
Nit : 800.252.749-0	
Pago de Nómina Personal Legal	
PERIODO: 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021	
PROYECTO	BODEGA
ITEM	16
Nombre Empleado	ORLANDO GARCIA DONCEL
Grupo	AYUD.
Cédula N°	10.181.740
Cargo	AYUDANTE
Salario Básico Diario	\$ 30.284,2
Fecha inicial	1 de diciembre de 2021
Fecha final	15 de diciembre de 2021
Dias ausencia	
Dias laborados quincena	15

1. SALARIOS				
CONCEPTO	PORCENTA JE	VALOR	CANT.	VALOR
DIAS ORDINARIOS		\$ 30.284,20	15	\$ 454.263
HRS EXT. DIURNAS	1,25	\$ 4.731,91		\$ -
HRS EXT. NOCTURNAS	1,75	\$ 6.624,67		\$ -
HRS EXT. DIUR. FESTIVAS-DOM	1,75	\$ 6.624,67		\$ -
HRS EXT. NOCT FESTIVAS-DOM	2,50	\$ 9.463,81		\$ -
SUB. TRANSPORTE		\$ 3.548,47	15	\$ 53.227
TOTAL SALARIOS DEVENGADOS				\$ 507.490

2. DEDUCCIONES		
CONCEPTO	PORCENTAJE	VALOR
APORTE A SALUD	4%	\$ 18.171
APORTE A PENSION	4%	\$ 18.171
DESCUENTOS -PRESTAMOS-		
FONDO SOLIDARIDAD PENS.	1%	
TOTAL DEDUCCIONES		\$ 36.342


VALOR TOTAL QUINCENA	\$ 471.148
----------------------	------------


 Recibi Conforme
 C.C. No. 10.166.458


 Elaboró
 JENNIFER TABORDA ARBOLEDA

Revisó
 LUZ CARIME CADENA SANCHEZ

Aprobó
 RAFAEL GARCIA BELTRAN Y/O
 MIGUEL ANGEL GARCIA CRUZ

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	

Informe Número	1	Fecha del informe	10-DIC-2021	Acta	1 y FINAL	Acta final	X
----------------	---	-------------------	-------------	------	-----------	------------	---

Número del contrato	AUTO 037-2021
Objeto:	LIMPIEZA DE BOCATOMA POR EMERGENCIA EL LLANO - RIO GUARINO UBICADA EN VICTORIA QUE ABASTECE EL ACUEDUCTO DE LA DORADA, EMERGENCIA POR DISMINUCION DE CAUDAL, MUNICIPIO DE LA DORADA-CALDAS
Nombre Contratista:	GEOFORAGROS SAS
Fecha del contrato:	22/11/2021
Plazo de ejecución:	20 días calendario
Valor inicial:	\$ 8.515.998
Fecha de iniciación:	30-NOV-2021
Fecha de suspensión:	NA
Fecha de reiniciación:	NA
Nueva fecha de terminación:	7 de Diciembre de 2021
Adición (en valor):	NA
Prórroga (en tiempo):	NA
Supervisor:	Juan Pablo Zuluaga Correa

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100 %
Avance físico Acumulado	100 %

1.2. Informe de actividades

- Desplazamiento de la maquinaria al cerca del sitio de acceso al rio Guarinó
- Acceso cerca del canal de la bocatoma Retroexcavadora
- Inicio de limpieza con brazo mecánico días 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de Diciembre hasta restablecimiento del ingreso de agua y retiro del material acumulado que obstruía el paso de agua cruda hacia la conducción.
- Movimiento del depósito hacia las márgenes a manera de jarillón y despeje de la zona de la corriente del río con encausamiento del mismo.

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	20 días
Tiempo total transcurrido:	8 días
Avance Porcentual:	100 %

1.4. Registro fotográfico

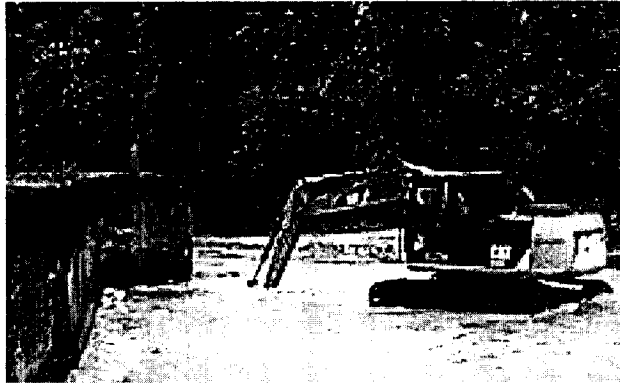


Foto 1: Detalle del ingreso de la maquina al sitio de intervencion

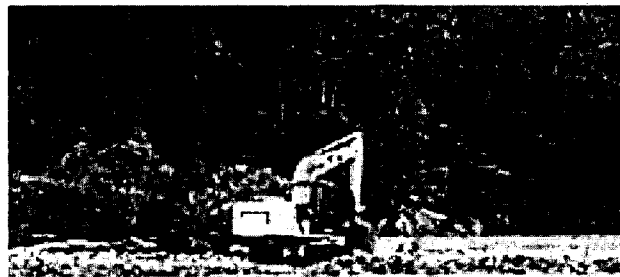


Foto 2: Ac arreo de materiales de depósito para conformacion de jarillon lateral



Foto 3: encausamiento del río para adecuado ingreso de agua cruda a la bocatoma sobre el Guarinó. ✓

1.5. Problemáticas con la obra ✓

Origen de la Emergencia:

Teniendo en cuenta la situación que se ha generado en la bocatoma del río Guarino, donde debido a las avalanchas que se han presentado en los últimos días por la creciente del mismo y a la fuerte ola invernal que azota nuestro territorio, la fuerza del río arrastro material pétreo, arenas y demás elementos dejando el ingreso del agua a la bocatoma muy reducida, toda vez que este material ha construido una isla de material que dificulta el ingreso del agua a la bocatoma y disminuye el caudal necesario para que la planta del llano trate y envíe hacia los tanques de almacenamiento de la Dorada la cual requiere la población de la Dorada, Guarinocio y Purnio, por tal razón se necesita de manera urgente e imprescindible los servicios de una retroexcavadora de oruga que ingrese al cauce del río y construya un canal abierto que conduzca las aguas del mismo hacia la bocatoma con el fin de mejorar el ingreso del caudal hacia la planta, ya que de lo contrario podríamos quedarnos sin agua para tratar en la misma y por ende se desabastecería la población antes mencionada.

Por tal razón le solicito se declare la emergencia manifiesta en el mencionado sector a fin de atender y dar solución inmediata a esta problemática, máxime cuando son muchos los usuarios que se afectarían en caso de no darse solución inmediata al problema planteado.

Con la presente emergencia se atendieron las necesidades de protección de orillas, remoción de depósitos por avenidas torrenciales y redireccionamiento de las líneas de corriente para el adecuado ingreso de agua cruda a la bocatoma de la que se surte la planta El llano que trata el agua para abastecimiento del municipio de La Dorada y sus zonas circundantes (Purnio, Guarinocito, El Japón entre otras).

1.6. Avance financiero



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Inversión Contratada:	\$ 18.326.000
Inversión ejecutada en el periodo:	\$18.326.000
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	\$18.326.000
Porcentaje total ejecutado:	100%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES

Por la mínima cuantía contratada no tiene exigencia de Pólizas

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Se aporta en el paquete de trámite de pago la nómina y seguridad social de los empleados de la empresa Geoforagros SAS

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

Al paquete de pago se anexa las certificaciones de pago de la seguridad social del contratista y los empleados a cargo.

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN

Empresa que cuenta con todos los protocolos para la adecuada prestación de un servicio con las medidas de protección y cumplimiento de la normatividad de la SST.



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR

Se cancela según el cuadro de la propuesta realizada y contratada con la empresa Geofragros SAS.

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

Operarios de la retroexcavadora y ayudantes del operario, además de la gente del transporte y recogida de la máquina.

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA


Usuarios del municipio de La Dorada, Caldas

8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Informe de actividades	x	
Registro fotográfico	x	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		x
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	x	
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	x	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1 4

Juan Pablo Zuluaga
NOMBRE DEL SUPERVISOR


FIRMA DEL SUPERVISOR



GESTIÓN FINANCIERA
DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

F-GF-32
Versión: 06
2021-04-16

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

X

O.C

CONTRATO

037-2021

Acta N°

1 y FINAL

Pág. 1 De. 1

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
12014 LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301108 Mantenimiento de Redes y Accesorios	15.400.000	2.926.000	18.326.000	ACUEDUCTO	18.326.000	-	18.326.000
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-1

15.400.000	2.926.000	18.326.000		18.326.000	-	18.326.000
------------	-----------	------------	--	------------	---	------------

TOTAL FACTURA PAG-1


15.400.000	2.926.000	18.326.000		18.326.000	-	18.326.000
------------	-----------	------------	--	------------	---	------------

Fecha de presentación 15-dic-21

Páginas

FIN

DATOS DEL SUPERVISOR

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	

EMPOCALDAS A.S. E.SP.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
ZONA ORIENTE

CONTRATO No.:	Acto 037 DE NOVIEMBRE 22 DE 2021	ACTA No.:	ACTA 01 y Final	FECHA CORTE:	DICIEMBRE 7 DE 2021
OBJETO CONTRATO:	LIMPIEZA DE BOCATOMA POR EMERGENCIA EL LLANO-RIO GUARINO UBICADA EN VICTORIA QUE ABASTECE EL ACUEDUCTO DE LA DORADA EMERGENCIA POR DISMINUCIÓN DE CAUDAL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS	FECHA INICIACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2021	FECHA VENCIMIENTO:	DICIEMBRE 19 DE 2021
		PRORROGA:	NA	VALOR ADICION:	NA
CONTRATISTA:	GEOFORAGROS SAS	SUPERVISOR:	INGENIERO DE ZONA	FECHA:	DICIEMBRE 7 DE 2021


ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL			PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA	
			CANT	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
LIMPIEZA DE BOCATOMA POR EMERGENCIA EL LLANO-RIO GUARINO UBICADA EN VICTORIA QUE ABASTECE EL ACUEDUCTO DE LA DORADA EMERGENCIA POR DISMINUCIÓN DE CAUDAL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS									
1	Transporte de Maquinaria Pesada	UND	2,00	\$ 3.000.000	\$ 6.000.000	2,00	\$ 6.000.000	2,00	\$ 6.000.000,00
2	Localizacion y replanteo	HORA	30,00	\$ 280.000	\$ 8.400.000	30,00	\$ 8.400.000	30,00	\$ 8.400.000
3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	GLB	1,00	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	1,00	\$ 1.000.000	1,00	\$ 1.000.000
COSTO TOTAL					\$ 15.400.000	\$ 15.400.000	\$ 15.400.000	\$ 15.400.000	\$ 15.400.000
IVA					19%	\$ 2.926.000	\$ 2.926.000	\$ 2.926.000	\$ 2.926.000
COSTO TOTAL					\$ 18.326.000	\$ 18.326.000	\$ 18.326.000	\$ 18.326.000	\$ 18.326.000


SON: DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS

RESUMEN DEL CONTRATO:

Valor del Contrato
 Valor Acta 1 Y final
 Saldo No ejecutado
SUMAS IGUALES

18.326.000	
	\$ 18.326.000
	\$ -
\$ 18.326.000	\$ 18.326.000


 Vo. Bo.: JUAN PABLO ZULUAGA C
 ING. ZONA ORIENTE
 SUPERVISOR


 JOSE RAFAEL GARCIA BELTRAN
 Contratista
 RL. GEOFORAGROS SAS
