	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN			F-GC-22 Versión 11 2022-08-03
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA			

# CONTRATO Y AÑO	E 045 DE 2023	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AJU e IVA)	12.064.450
				2. VALOR ADICION	0
CONTRATISTA	EDGARDO JOSÉ DE LEÓN BRUNO			3. VALOR TOTAL (1+2)	12.064.450
NIT O CC:	1.064.992.002			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	20230898 DE NOVIEMBRE 24 DE 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	12.064.450
RP (#, rubro y fecha)	001138 DE NOVIEMBRE 24 DE 2023			6. VALOR POR EJECUTAR (3-4-5)	0
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN CHAMBERY SECTOR ALTO MAIBA EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA CALDAS.				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	N/A	
3- Pagos al FIC	X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Informe de actividades o Bitácora.	X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
8- Ensayos de densidad.	N/A	
9- Diseño de Mezclas.	N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	X	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	N/A	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	X	
15- Acta parcial o final del contrato.	X	
16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Andrés Felipe Giraldo R
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Andrés G.
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓
Factura original o Documento equivalente	X
Acta parcial o final del contrato.	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación

30/01/24

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN CARLOS GOMEZ MOZQUERA	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
18600036986	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Manizales, 12 de diciembre de 2023

EDGARDO JOSÉ DE LEÓN BRUNO
1.064.992.002

CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO,

Que me encuentro al día con los pagos de seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores, tales como, las entidades promotoras de salud EPS, Fondos de pensión, Administradoras de riesgos profesionales, caja de compensación familiar y servicio nacional de aprendizaje SENA.

Atentamente,



EDGARDO JOSÉ DE LEÓN BRUNO
CONTRATISTA



VICTOR ALFONSO ARIZA ENNIS
CONTADOR PUBLICO

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 F 5 0 B E 0 E 7 F 9 8 2 5 7 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **VICTOR ALFONSO ARIZA ENNIS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10967296 de MONTERIA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 157609-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

157609-T

VICTOR ALFONSO
ARIZA ENNIS
C.C. 10967296
RESOLUCION INSCRIPCION 107 FECHA 07/04/2011
UNIVERSIDAD CORP UNIV DEL SINU

[Signature]

FRENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 168061



[Signature]

FIRMA DEL TITULAR 83451

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.967.296**

ARIZA ENNIS
APELLIDOS

VICTOR ALFONSO
NOMBRES

VICTOR ARIZA
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-SEP-1985**
MONTERIA
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 **A-** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

01-OCT-2003 MONTERIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Alm. Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-1300100-38123991-M-0010967296-20040413

0160504104P 02 151424033

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	101180104	333646578	12/12/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **1064992002**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.28.100.138**

Su transacción fue

APROBADA por la

Total Pagado

\$ 30,161.00

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 30,161.00	COP\$ 30,161.00

NIT

8999990341

Medio de Pago

BANCOLOMBIA

No. Transacción

101180104

No. Autorización/CUS Fecha y Hora

333646578

12/12/2023

Número de Identificación

1064992002

Primer Apellido (si es Persona natural)

DE LEÓN BRUNO

Dígito de Verificación (Si es persona

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

CR 10 # 8 30

Localización

Nacional

Correo electrónico

ing.ejdlb@gmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra

CE-045-2023

Nombre Obra

REPARACIÓN POR EMERGENCIA COND

Fecha Terminación Obra

13/12/2023

Tipo FIC

Costo Total de Obra (Sin Aportes) ✓

Mes Periodo a Pagar

12 ✓

Costo Total Mano de Obra

2412890.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

EDGARDO JOSÉ

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

NEIRA

Teléfono de Contacto

+57,313 6020487

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

CE-045-2023 ✓

Fecha Inicio Obra

23/11/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

FILADELFIA

Año Periodo a Pagar

2023

Costo Total de Obra a Todo Costo

12064450.00 ✓

Número de Trabajadores en el Periodo

3 ✓

Aporte FIC

30161.00

Valor del Pago

30161.00

Espacio para
Logo Corporativo

EDGARDO JOSE DE LEON BRUNO
NIT 1.064.992.002-4
CRA 10 8 30
Tel: (604) 7846797
Montería - Colombia
ing.ejdlb@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. EJLB 4

Señores	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS SA		
NIT	890.803.239-9	Teléfono	(604) 8867080 - Ext. 000
Dirección	CRA 23 75 82	Ciudad	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2023, 10:45
Expedición	14/12/2023, 10:30
Vencimiento	13/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACTA FINAL - ACTO DE EMERGENCIA 045 DE 2023	1.00	9,003,320.90	9,003,320.90	0.00	9,003,320.90
2	ADMINISTRACION 29%	1.00	2,610,963.06	2,610,963.06	0.00	2,610,963.06
3	UTILIDAD 5%	1.00	450,166.04	450,166.04	0.00	450,166.04

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Doce millones sesenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Consignación

\$ 12,064,450.00

Total Bruto	12,064,450.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	12,064,450.00

Observaciones:

REPARACION POR EMERGENCIA CONDUCCION CHAMBERY SECTOR ALTO MAIBA
EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA CALDAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764061773313 aprobado en 20231212 prefijo EJLB desde el número 4 al 100 Vigencia: 6 Meses



- Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa
CUFE: c22b8b44be45a0a1203738b1f919efb6709acabdc70cf9e9d013c9b9389abf910ab669490182273f01f85f098c106a1a



EDGARDO JOSÉ DE LEÓN BRUNO

**REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN CHAMBERY SECTOR
ALTO MAIBA EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA CALDAS.**

CONTRATO DE EMERGENCIA No. 045 DEL 2023



	EDGARDO JOSÉ DE LEÓN BRUNO	
	INFORME No.1 FINAL REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN CHAMBERY SECTOR ALTO MAIBA EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA CALDAS.	

INFORME No.1 FINAL CONTRATISTA

FECHA ELABORACIÓN DE INFORME	Día	Mes	Año
	12	12	2023

PERÍODO REPORTADO:

Desde	Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año
	23	11	2023		06	12	2023

	EDGARDO JOSÉ DE LEÓN BRUNO	
	INFORME No.1 FINAL REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN CHAMBERY SECTOR ALTO MAIBA EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA CALDAS.	

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN.

Contrato de Emergencia No.: 045 DEL 2023. ✓

Contratante: EMPOCALDAS.

Contratista: EDGARDO JOSÉ DE LEÓN BRUNO



Objeto: REPARACIÓN POR EMERGENCIA
CONDUCCIÓN CHAMBERY SECTOR ALTO
MAIBA EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA
CALDAS. ✓

Valor contrato: \$ 12.064.450 INCLUIDO AIU E IVA SOBRE
UTILIDADES ✓

Adición: \$ 0 INCLUIDO AIU E IVA SOBRE
UTILIDADES

Fecha de inicio Noviembre 23 de 2023 ✓



Fecha de final Diciembre 06 de 2023 ✓

	EDGARDO JOSÉ DE LEÓN BRUNO	
	INFORME No.1 FINAL REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN CHAMBERY SECTOR ALTO MAIBA EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA CALDAS.	

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto "REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN CHAMBERY SECTOR ALTO MAIBA EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA CALDAS. es una emergencia que surgió por la falla en la tubería de conducción Chambery, la cual se encontraba en Pvc con un Diámetro de 6", dicha fuga dejó sin el suministro de agua al municipio de Filadelfia, por lo que surge la necesidad de suscribir dicha emergencia, para realizar las reparaciones en el menor tiempo posible.

El objetivo principal del proyecto es reemplazar o reposicionar las redes de conducción por 56m en tubería de 160 mm, en tubería de Polietileno, con los respectivos empalmes para poder solucionar y poder distribuir agua potable en las mencionado municipio con el fin de mejorar la calidad y la eficiencia del servicio de suministro de agua.

	EDGARDO JOSÉ DE LEÓN BRUNO	
	INFORME No.1 FINAL REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN CHAMBERY SECTOR ALTO MAIBA EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA CALDAS.	

2.1. Localización del Proyecto



Filadelfia es un municipio colombiano situado en el noroccidente del departamento de Caldas. Posee una extensión total de 193 km², cuenta con una temperatura media de 20 °C y su altura sobre el nivel del mar es de 1.550 m. El municipio está situado a 48 km de la capital del departamento, Manizales. Su población actual (2009) es de aproximadamente 12.400 habitantes, con una densidad poblacional de 64,26 Hab/km².

El municipio dispone de varios pisos térmicos y su superficie es predominantemente quebrada. Su economía se basa en la agricultura, con productos como el café, el maíz, el plátano, el tabaco, el frijol la yuca, el tomate y la caña de azúcar. También se explota extensivamente la ganadería.

3.0 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

En el período de reporte del presente informe, el contratista realizó las siguientes actividades:

- Localización y replanto
- Excavación en material común de 0 a 2m
- Relleno compacto con material seleccionado de excavación
- Dispersión del sobrante
- Empalmes a la red existente
- Sobre acarreo de tubería al sitio de instalación
- Instalación de tubería de 6" polietileno por termo fusión
- Termo fusión de portaflanche de 6"

	EDGARDO JOSÉ DE LEÓN BRUNO	
	INFORME No.1 FINAL REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN CHAMBERY SECTOR ALTO MAIBA EN EL MUNICIPIO DE FILADELFA CALDAS.	

- Anclaje de tubería galv. De longitud 2m de 2". Debidamente con tortones de alambre galv. Cal. 13
- Transporte de accesorios desde Chinchiná al sitio de transborde a tro vehiculo en Aranzazu
- Sobre acarreo de tubería des Aránzazu al sitio de la obra
- Transporte de personal

4.0 REGISTRO FOTOGRAFICO DE INTERVENCIONES





EDGARDO JOSÉ DE LEÓN BRUNO



**INFORME No.1 FINAL
REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN
CHAMBERY SECTOR ALTO MAIBA EN EL MUNICIPIO DE
FILADEFIA CALDAS.**





EDGARDO JOSÉ DE LEÓN BRUNO


**INFORME No.1 FINAL
REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN
CHAMBERY SECTOR ALTO MAIBA EN EL MUNICIPIO DE
FILADELFA CALDAS.**

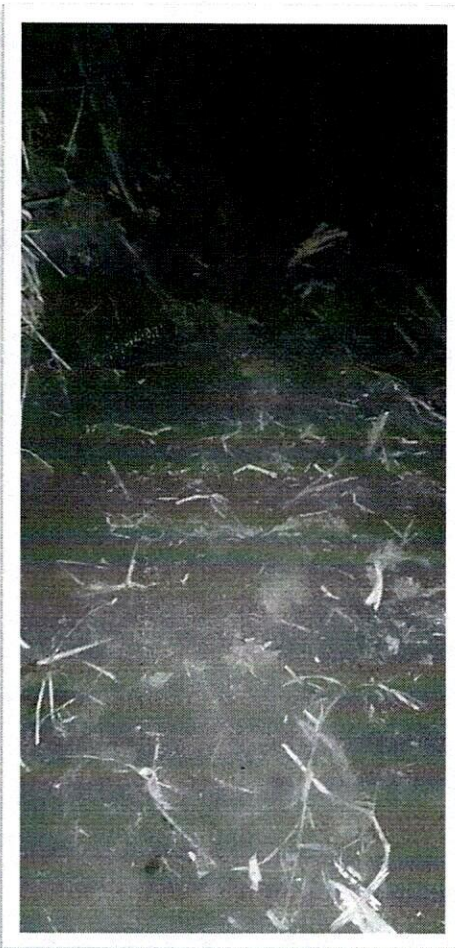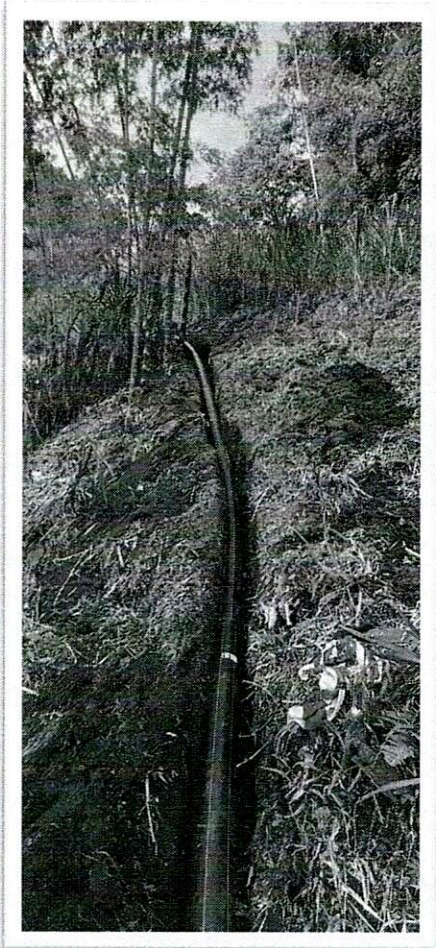



EDGARDO JOSÉ DE LEÓN BRUNO

INFORME No.1 FINAL
REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN
CHAMBERY SECTOR ALTO MAIBA EN EL MUNICIPIO DE
FILADELFIA CALDAS.

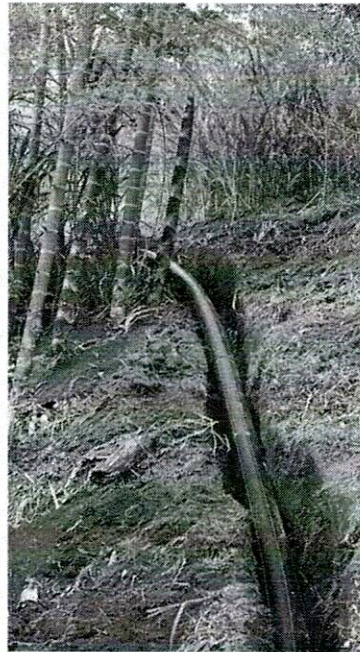



EDGARDO JOSÉ DE LEÓN BRUNO


**INFORME No.1 FINAL
REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN
CHAMBERY SECTOR ALTO MAIBA EN EL MUNICIPIO DE
FILADEFIA CALDAS.**





EDGARDO JOSÉ DE LEÓN BRUNO

**INFORME No.1 FINAL
REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN
CHAMBERY SECTOR ALTO MAIBA EN EL MUNICIPIO DE
FILADELFIA CALDAS.**

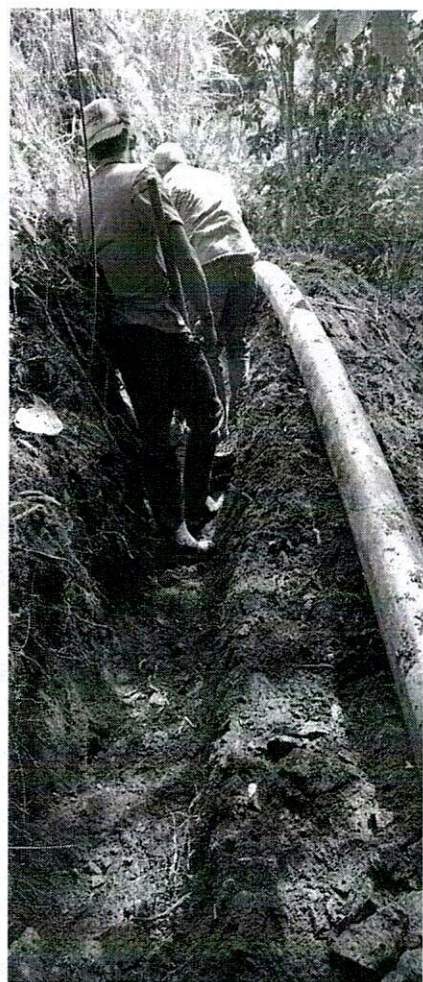



EDGARDO JOSÉ DE LEÓN BRUNO

**INFORME No.1 FINAL
REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN
CHAMBERY SECTOR ALTO MAIBA EN EL MUNICIPIO DE
FILADELFIA CALDAS.**





EDGARDO JOSÉ DE LEÓN BRUNO


**INFORME No.1 FINAL
REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN
CHAMBERY SECTOR ALTO MAIBA EN EL MUNICIPIO DE
FILADELFIA CALDAS.**





EDGARDO JOSÉ DE LEÓN BRUNO


**INFORME No.1 FINAL
REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN
CHAMBERY SECTOR ALTO MAIBA EN EL MUNICIPIO DE
FILADELFA CALDAS.**

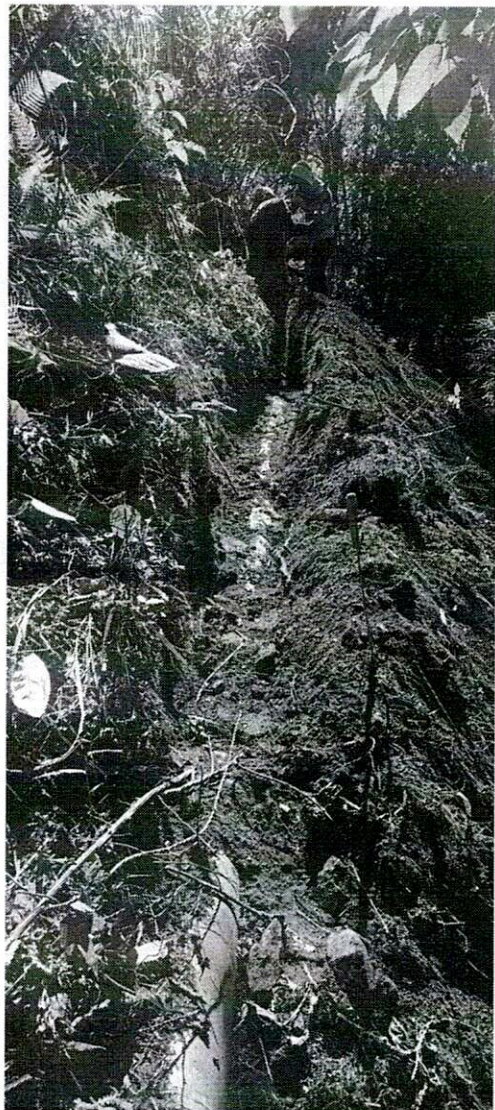



EDGARDO JOSÉ DE LEÓN BRUNO

**INFORME No.1 FINAL
REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN
CHAMBERY SECTOR ALTO MAIBA EN EL MUNICIPIO DE
FILADELFIA CALDAS.**

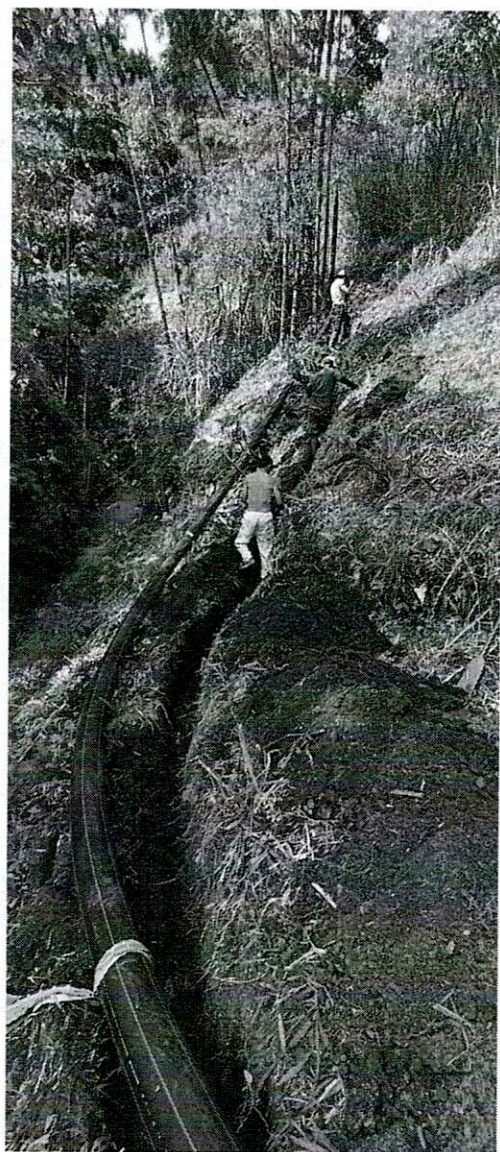



EDGARDO JOSÉ DE LEÓN BRUNO


**INFORME No.1 FINAL
REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN
CHAMBERY SECTOR ALTO MAIBA EN EL MUNICIPIO DE
FILADELFIA CALDAS.**






EDGARDO JOSÉ DE LEÓN BRUNO

INFORME No.1 FINAL
REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN
CHAMBERY SECTOR ALTO MAIBA EN EL MUNICIPIO DE
FILADELFIA CALDAS.

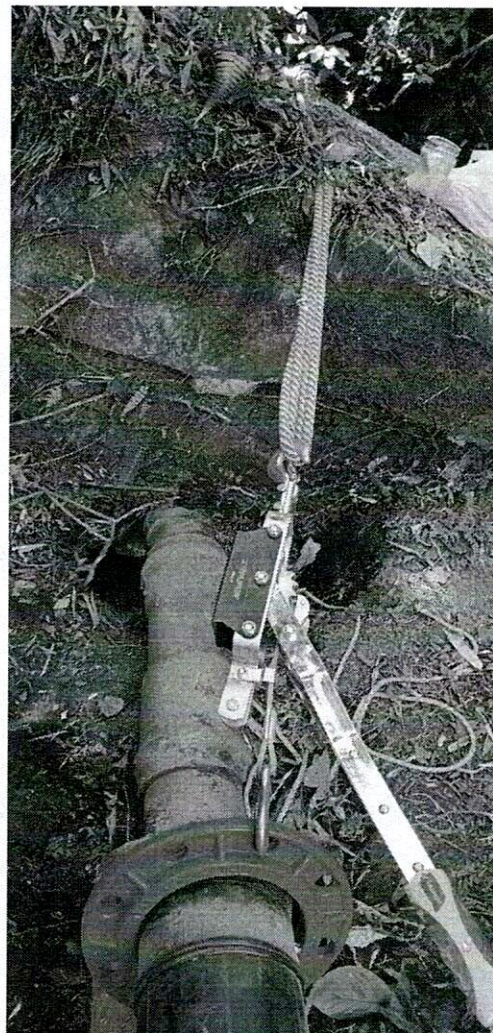


EDGARDO JOSÉ DE LEÓN BRUNO
Contratista

EDGARDO JOSÉ DE LEÓN BRUNO

CT- E045

30 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023

Nomina Trabajadores												
Nombre	Cédula	Cuenta	Banco	Teléfono	Cargo	Salario/día	Horas Extras o Alimentación	Fecha Inicial	Fecha	Días lab	Total a pagar	Observaciones
ROBERTO ABAD HIGUITA	98.461.132	Efectivo	N/A	3145978075	Ayudante	\$ 200.000,00	\$ 600.000,00	30/11/23	5/12/23	6,00	\$ 1.800.000,00	30.01.02.03.04.05
JORGE ELIECER RIVERA GRANADA	75.144.158	Efectivo	N/A	3145978075	Ayudante	\$ 200.000,00	\$ 600.000,00	30/11/23	5/12/23	6,00	\$ 1.800.000,00	30.01.02.03.04.05
JUAN DAVID VALLEJO GIRALDO	1.054.996.263	Efectivo	N/A	3145978075	Muestro	\$ 200.000,00	\$ 700.000,00	30/11/23	5/12/23	6,00	\$ 1.900.000,00	30.01.02.03.04.05

\$ 5.500.000

Horas extra diurna	\$ 6.170,00
Horas Extra Nocturna	\$ 8.638,00
hora extra dominicar festivo diurna	\$ 9.872,00
hora extra nocturna dominical o festivo	\$ 14.808,00

Horas Trabajada	\$ 4.936,00
-----------------	-------------

OP
56408



COMPROBANTE DE EGRESO

No.


CIUDAD Y FECHA: 05 Diciembre 2023

VALOR: \$ 1.900.000

PAGADO A: Juan David Vallejo Giraldo

POR CONCEPTO DE: Nomina por trabajo realizado en emergencia de
Filadelfia

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUESTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
				TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:	
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO		APROBADO	CONTABILIZADO	 C.C. / NIT. 1.054.996.263	



COMPROBANTE DE EGRESO

No.



VALOR: S 1.800.000

CIUDAD Y FECHA: 05 Diciembre 2023

PAGADO A: Roberto Abad Figueroa

POR CONCEPTO DE: Nomina por trabajo realizado en emergencia de
Filadelfia

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
				TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:	
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO		APROBADO		 	
		CONTABILIZADO			
				C.C. / NIT. 98.461.132	

07
06408



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: 05 Diciembre 2023

VALOR: \$ 1.800.000

PAGADO A: Jorge Eliecer Rivera Granada

POR CONCEPTO DE: Nomina por trabajo realizado en emergencia de
Filadelfia

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
				TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:	
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO		APROBADO		CONTABILIZADO	
				Jorge eliecer Rivera G. G.C. / NIT 75.144.158	



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01	Fecha del informe	Diciembre 13 de 2023	Acta Parcial		Acta final	X
----------------	----	-------------------	----------------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	E 045 DEL 2023
Objeto:	REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN CHAMBERY SECTOR ALTO MAIBA EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA CALDAS.
Nombre Contratista:	EDGARDO JOSÉ DE LEÓN BRUNO
Fecha del contrato:	23 de noviembre de 2023
Plazo de ejecución:	VEINTE DIAS (20) DÍAS CALENDARIOS
Valor inicial Obras	\$ 12,064,450 INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES
Fecha de iniciación:	23 DE NOVIEMBRE 2023
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reiniciación:	N/A
Fecha de terminación inicial:	13 DE DICIEMBRE 2023
Nueva fecha de terminación:	N/A
Adición (en valor):	\$ 0
Prórroga (en tiempo):	N/A
Supervisor:	JUAN CARLOS GOMEZ MOZQUERA

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

1.2. Avance en tiempo



Plazo de ejecución:	20
Tiempo total transcurrido:	20
Avance Porcentual:	100%

1.3. Registro fotográfico



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

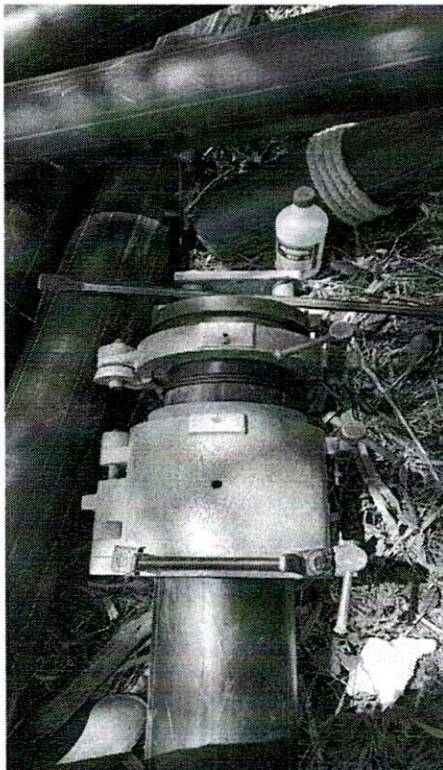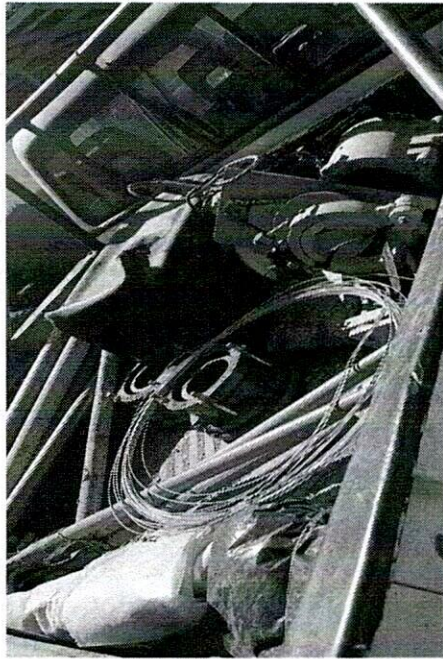



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL





EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN


INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL





EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN


INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

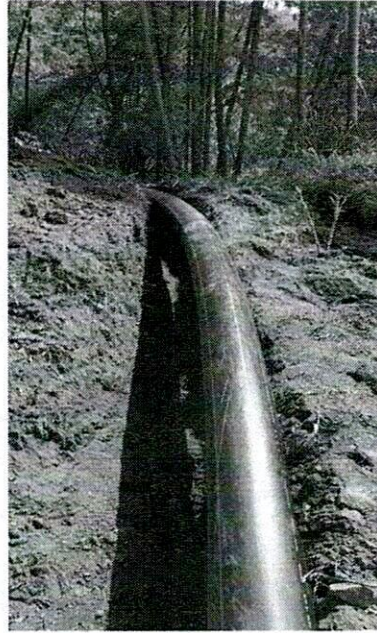



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

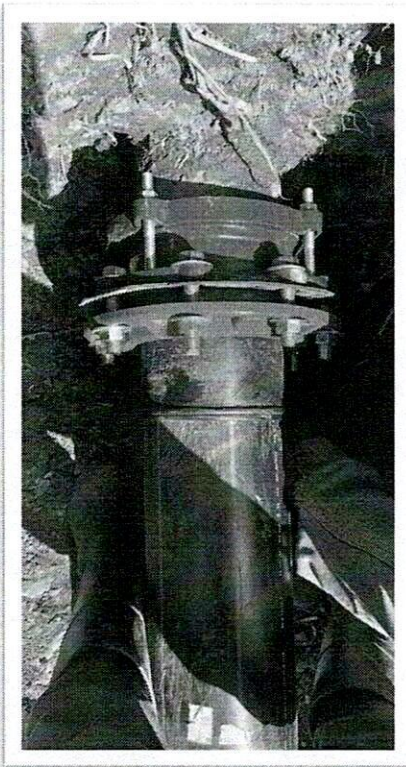



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN


INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL





EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

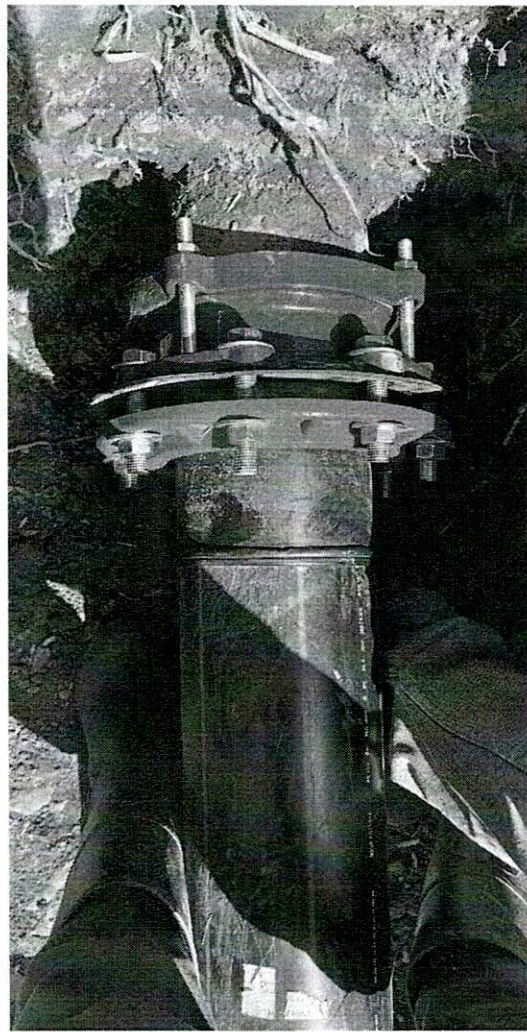



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN



INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL





EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

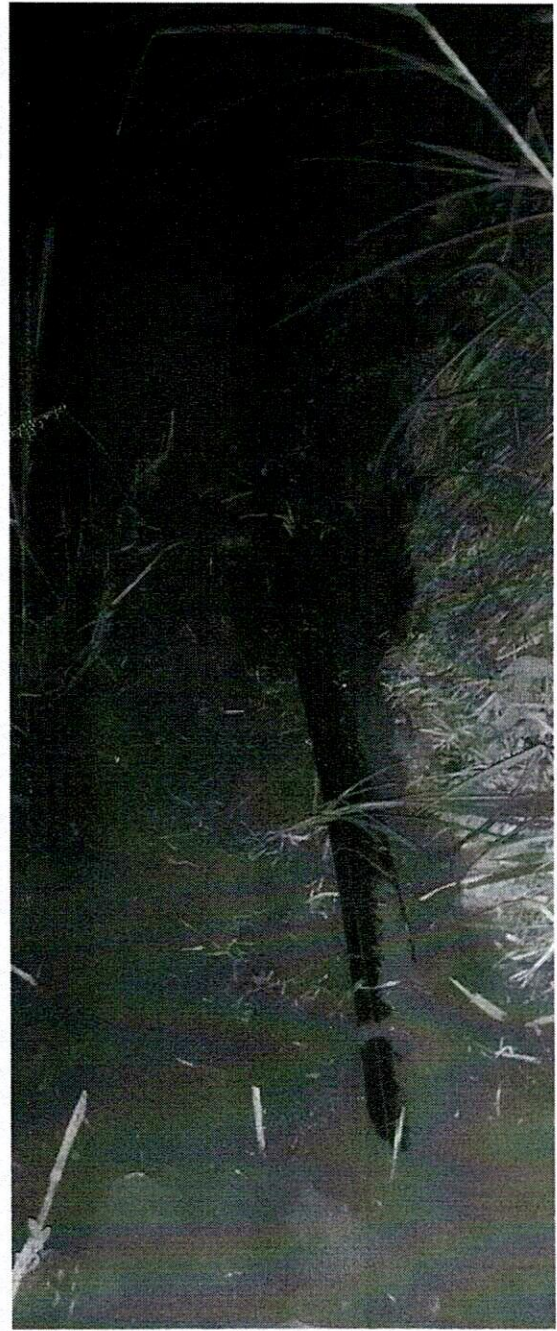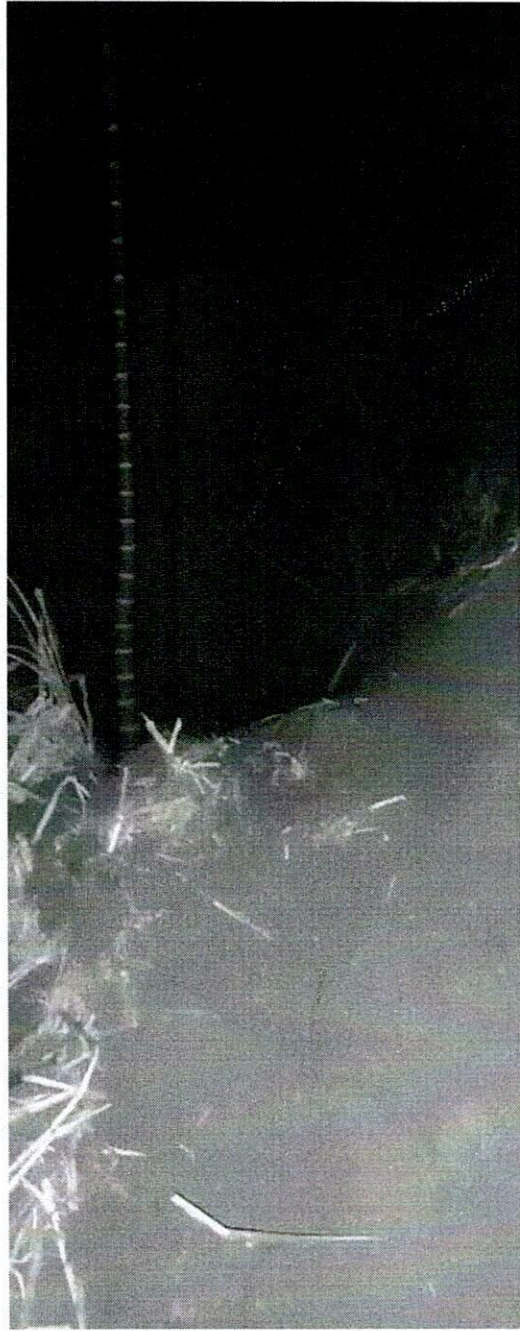



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Problemáticas con la obra

ANTECEDENTES:

El proyecto "REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN CHAMBERY SECTOR ALTO MAIBA EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA CALDAS. es una emergencia que surgió por la falla en la tubería de conducción Chambery, la cual se encontraba en Pvc con un Diámetro de 6", dicha fuga dejó sin el suministro de agua al municipio de Filadelfia, por lo que surge la necesidad de suscribir dicha emergencia, para realizar las reparaciones en el menor tiempo posible.

El objetivo principal del proyecto es reemplazar o reposicionar las redes de conducción por 56m en tubería de 160 mm, en tubería de Polietileno, con los respectivos empalmes para poder solucionar y poder distribuir agua potable en el mencionado municipio con el fin de mejorar la calidad y la eficiencia del servicio de suministro de agua.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

Inversión Contratada:	\$ 12.064.450
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 12.064.450
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	\$ 12.064.450
Porcentaje total ejecutado:	100%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra) N/A

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Cumplimiento	Seguros Mundial NIT: 860.037.013-6	NB- 100297910	23/11/2023	23/03/2024	\$2.412.890,00
Salarios, Prestaciones sociales e Indemnizaciones	Seguros Mundial NIT: 860.037.013-6	NB- 100297910	23/11/2023	23/12/2026	\$3.619.335,00
Estabilidad de Obra	Seguros Mundial NIT: 860.037.013-6	NB- 100297910	05/09/2023	23/12/2025	\$2.412.890,00
Responsabilidad Civil	Seguros Mundial NIT: 860.037.013-6	NB- 100073668	23/11/2023	23/04/2024	\$3.619.335,00



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Ingeniero Residente	X	X	X	X	X
Profesional Siso	X	X	X	X	X
Profesional Social	X	X	X	X	X
Maestro de Obra	X	X	X	X	X
Oficial	X	X	X	X	X
Ayudantes	X	X	X	X	X

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
SE ANEXAN PAGOS (FORMATO PILA)

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
Diciembre 01 de 2023	A	N/A	A	N/A	N/A	A	A	N/A

Convenciones: A:adecuada - D:deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR
(se anexa memorias de cantidades)

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

8.- DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Ensayos de laboratorio		x
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		x
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	X	
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1 4

JUAN CARLOS GOMEZ MOZQUERA

Supervisor

Empecaldas



EMPOCALDAS A.S. E.S.P.
 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
 SECCIONAL FILADELFA - CALDAS

CONTRATO No.: Acto de Emergencia 045 de 2023
 ACTA No.: 1 Y FINAL
 FECHA CORTE: 11 DE DICIEMBRE DE 2021

REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN CHAMBERY SECTOR ALTO MAIBA EN EL MUNICIPIO DE FILADELFA CALDAS.
 FECHA VENCIMIENTO: DICIEMBRE 13 DE 2023

MUNICIPIOS: Filadelfia, Caldas
 VALOR CONTRATO: \$ 12.064.450


REPRESENTANTE LEGAL:
 VALOR OBRA 1:
 SUPERVISIÓN: JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA


FECHA INICIO: NOVIEMBRE 23 DE 2023

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EFECTUADO	
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	CANTIDAD	VR.PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	%EJECUC.	CANTIDAD		VR. TOTAL
1	PRELIMINARES	Gl	1,00	\$ 150.000,00			1,00	\$ 150.000,00	100%	1,00	\$ 150.000,00	100%
3	EXCAVACIONES	m³	28,00	\$ 37.000,00			28,00	\$ 1.036.000,00	100%	28,00	\$ 1.036.000,00	100%
4	Excavaciones en zanja- material común de 0 a 2m excavación.	m³	24,00	\$ 22.000,00			24,00	\$ 528.000,00	100%	24,00	\$ 528.000,00	100%
5	Dispersion de sobrantes	m³	4,00	\$ 18.000,00			4,00	\$ 72.000,00	100%	4,00	\$ 72.000,00	100%
7	ACUEDUCTO											
8	Empalmes a la red existente	Un	2,00	\$ 1.000.000,00			2,00	\$ 2.000.000,00	100%	2,00	\$ 2.000.000,00	100%
9	Sobre acarreos de tubería al sitio de instalación	ml	56,00	\$ 11.500,00			56,00	\$ 644.000,00	100%	56,00	\$ 644.000,00	100%
10	Instalación de tubería 6" polietileno por termo fusión	ml	56,00	\$ 60.000,00			56,00	\$ 3.360.000,00	100%	56,00	\$ 3.360.000,00	100%
11	Termo fusión de portaflanche de 6"	Un	2,00	\$ 400.000,00			2,00	\$ 800.000,00	100%	2,00	\$ 800.000,00	100%
12	Anclajes y tubería galv. De longitud 2m de 2". Debidamente con tornos de alambre galv. Cal. 13	Un	2,00	\$ 742.225,00			2,00	\$ 1.484.450,00	100%	2,00	\$ 1.484.450,00	100%
13	Transporte de accesorios desde chinchiná al sitio de transbordo a otro vehículo en Aranzazu	Viaje	1,00	\$ 800.000,00			1,00	\$ 800.000,00	100%	1,00	\$ 800.000,00	100%
14	Sobre acarreos de tubería desde Aranzazu al sitio de la obra	Viaje	1,00	\$ 350.000,00			1,00	\$ 350.000,00	100%	1,00	\$ 350.000,00	100%
15	Transporte de personal	Día	3,00	\$ 280.000,00			3,00	\$ 840.000,00	100%	3,00	\$ 840.000,00	100%
COSTO TOTAL				12.064.450,00				\$ 12.064.450,00			\$ 12.064.450,00	
ADMINISTRACION %				9.003.321				\$ 9.003.321,00			\$ 9.003.321,00	
IMPREVISTOS %				2.610.963				\$ 2.610.963,00			\$ 2.610.963,00	
UTILIDADES %				450.166				\$ 450.166,00			\$ 450.166,00	
SUMA ANTES IVA %				12.064.450				\$ 12.064.450,00			\$ 12.064.450,00	
I.V.A.								\$ -			\$ -	
VALOR TOTAL OBRA 1				12.064.450				\$ 12.064.450,00			\$ 12.064.450,00	

TOTAL A PAGAR AE 045 DE 2023 ACTA FINAL
\$ 12.064.450,00

TOTAL A PAGAR OBRA 1
\$ 12.064.450,00

FIRMA CONTRATISTA:

 EUSEBIO JOSÉ DE LEÓN BRUNO
 Contratista

FIRMA SUPERVISOR

 JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA
 Supervisor Obra

CONTRATO No.	ACTO DE EMERGENCIA 045 DE 2023	ACTA PARCIAL : DICIEMBRE 11 DE 2023
CONTRATISTA:	EDGARDO JOSÉ DE LEÓN BRUNO	FECHA INICIACIÓN: NOVIEMBRE 23 DE 2023
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA	FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 13 DE 2023

ITEMS	DESCRIPCIÓN										UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2	Localización y replanteo										Gl		1,00	1,00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES				
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)				
25	11	k0+000	k0+056	56,00	1,00			1,00	1,00					
											CANTIDAD DE PAGO		1,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN										UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4	Excavaciones en zanja- material común de 0 a 2m										m ³		28,00	28,00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES				
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)				
27	11	k0+000	k0+056	56,00	0,60	0,83	27,999	1,00	28,00					
											CANTIDAD DE PAGO		28,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN										UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5	Rellenos compactos con material seleccionado de excavación.										m ³		24,00	24,00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES				
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)				
1	12	k0+000	k0+056	56,00	0,60	0,71	24,004	1,00	24,00					
											CANTIDAD DE PAGO		24,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN										UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
6	Dispersión de sobrantes										m ³		4,00	4,00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES				
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)				
3	12	k0+000	k0+056	56,00	0,60	0,12	3,995	1,00	4,00					
											CANTIDAD DE PAGO		4,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN										UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
8	Empalmes a la red existente										Un		2,00	2,00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES				
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)				
4	12	k0+000	k0+000	1,00				1,00	1,00					
4	12	k0+056	k0+056	1,00				1,00	1,00					
											CANTIDAD DE PAGO		2,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN										UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
9	Sobre acerreo de tubería al sitio de instalación										ml		56,00	56,00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES				
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)				
3	12	k0+000	k0+056	56,00	0,60	0,12	3,995	1,00	56,00					
											CANTIDAD DE PAGO		1,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN										UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA

10	Instalación de tubería 6" polietileno por termo fusión									mi	56,00	56,00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)		
3	12	k0+000	k0+056	56,00	0,60	0,00	0,000	1,00	56,00	excavación tubería		
										CANTIDAD DE PAGO		56,00

11	Termo fusión de portaflanche de 6"									Un	2,00	2,00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)		
4	12	k0+000	k0+000	1,00				1,00	1,00			
4	12	k0+056	k0+056	1,00				1,00	1,00			
										CANTIDAD DE PAGO		2,00

12	Anclajes y tubería galv. De longitud 2m de 2". Debidamente con tortones de alambre galv. Cal. 13									Un	2,00	2,00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)		
4	12	k0+000	k0+000	1,00				1,00	1,00			
4	12	k0+056	k0+056	1,00				1,00	1,00			
										CANTIDAD DE PAGO		2,00

13	Transporte de accesorios desde chinchiná al sitio de transbordo a otro vehículo en Aranzazu									Viaje	1,00	1,00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)		
3	12	k0+000	k0+056	56,00	0,60	0,00	0,000	1,00	1,00			
										CANTIDAD DE PAGO		1,00

14	Sobre acarreo de tubería desde Aranzazu al sitio de la obra									Viaje	1,00	1,00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)		
3	12	k0+000	k0+056	56,00	0,60	0,00	0,000	1,00	1,00			
										CANTIDAD DE PAGO		1,00

15	Transporte de personal									Día	3,00	3,00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)		
3	12	k0+000	k0+056	56,00	0,60	0,00	0,000	3,00	3,00			
										CANTIDAD DE PAGO		3,00

FIRMA CONTRATISTA

EDGARDO JOSÉ DE LEÓN BRUNO
Contratista

FIRMA SUPERVISOR

JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA
Supervisor Obra

Buen día, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.
Este documento le sirve como certificado de existencia

14-12-2023 13-12-2023 E/JLB E/JLB4 Factura electrónica 106-9982002 EDGARDO JOSE DE L... 890803239 EMPRESA DE OBRAS ... Aprobado con notificación Factura Electrónica \$12,064,450

# CONTRATO Y AÑO	E 045 DE 2023	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	12.064.450
				2. VALOR ADICION	0
CONTRATISTA	EDGARDO JOSÉ DE LEÓN BRUNO			3. VALOR TOTAL (1+2)	12.064.450
NIT O CC:	1.064.992.002			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	20230898 DE NOVIEMBRE 24 DE 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	12.064.450
RP (#, rubro y fecha)	001138 DE NOVIEMBRE 24 DE 2023			6. VALOR POR EJECUTAR (3-4-5)	0

OBJETO DEL CONTRATO: REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN CHAMBERY SECTOR ALTO MAIBA EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA CALDAS.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	N/A	
3- Pagos al FIC	X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Informe de actividades o Bitácora.	X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
8- Ensayos de densidad.	N/A	
9- Diseño de Mezclas.	N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	X	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	N/A	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	X	
15- Acta parcial o final del contrato.	X	
16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


Andrés Felipe Giraldo R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Andrés G.
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		
Factura original o Documento equivalente	X	✓
Acta parcial o final del contrato.	X	✓
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	✓
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X	✓
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X	✓
Copia del registro presupuestal	X	✓

Fecha de presentación

22/12/23

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN CARLOS GOMEZ MOZQUERA	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
18600036986	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

22-12-23
9:30 AM
