

MEMORANDO

OM-2018-II-00008919

Manizales, 26 de octubre de 2018

PARA:  
CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

DE:  
DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ASUNTO:  
SOLICITUD DECLARACION EMERGENCIA MARQUETALIA


Se recibido oficio e informe de la señora administradora de la seccional de Marquetalia, donde manifiesta que existe un deslizamiento que se presentó en un tramo de la conducción San Juan, sector la Quebra ocasionando ruptura de la tubería, la cual se encuentra en asbesto cemento, generando esto que la planta quede fuera de servicio y sea suspendido el servicio de agua potable a la comunidad del municipio.

Se hace urgente reponer 60m por tubería de Polietileno, para mitigar el riesgo de un futuro deslizamiento que pueda afectar la vía ( Manzanares- Marquetalia) y la integridad de las personas que transitan por allí.

La empresa no cuenta con el equipo para realizar la termo fusión de la tubería de polietileno.

Es por lo anterior que solicito se declare la situación de emergencia en el municipio de Marquetalia.


Atentamente,

  
~~SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS~~  
Jefe Depto Operación y Mantenimiento

Proyectó: Sergio Humberto Lopera Proaños

EMPOCALDAS A.S. E.SP.					
Reparación por emergencia Vereda la Quebra finca del Sacerdote Alberto Arisatizabal en el municipio de Marquetalia Caldas					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES				
2	Localización y replanteo	ml	60,00	4.843	290.580
3	EXCAVACION				
4	En material común de 0 a 2m	m³	40,00	24.440	977.600
5	Dispersión de sobrantes	m³	10,00	30.415	304.150
6	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO				
7	Instalación y temo fusión de tubería de polietileno de 6" incluye sobre acarreo al hombro y en bestia	ml	60,00	42.000	2.520.000
8	Temo fusión de portaflanche de 6"	Un	2,00	200.000	400.000
9	Empalmes a tubería existente incluye empaque y tornillería	Un	2,00	390.000	780.000
10	Anclajes de tubería incluye tubería galvanizada de 1" 1/2" y alambre galvanizado	Un	2,00	390.000	780.000
11	LLENOS				
12	Lleno compactado con material de la obra	m³	30,00	20.553	616.590
13	Transporte de tubería de polietileno y sus accesorios de Chinchina a Marquetalia sitio de la obra	Viaje	1,00	790.000	790.000
Costo Total					7.458.920
Costo directo					5.737.631
Administración					20% 1.147.526
Imprevistos					5% 286.882
Utilidad					5% 286.882
Costo Total					7.458.920

Sergio Humberto Lopera Proaño  
 Jefe Dept. de Operación y Mantenimiento

 <p>F-AC-46 Versión 2 Enero 2018</p>	<p>EMPOCALDAS S.A E.S.P SERVICIO DE ACUEDUCTO</p>
	<p>INFORME DE EMERGENCIAS</p>

Seccional: Marquetalia Fecha del informe: 26 de Octubre de 2018

EVENTO: Ruptura tubería asbesto cemento de 6", por deslizamiento

FECHA: 26 de Octubre de 2018 HORA: 05:00 Am

COMPONENTE AFECTADO: Conducción San Juan, Sector La Quebra

DESCRIPCION DEL DAÑO: debido a un deslizamiento que se presentó en un tramo de la conducción San Juan, sector La Quebra, ocasiona ruptura de la tubería, tubería que se encuentra en asbesto cemento

IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO: Dicho daño deja fuera de servicio la planta de tratamiento y se suspende el suministro de agua potable a toda la comunidad del Municipio.

REQUERIMIENTOS PARA REPARACION PARCIAL, O TEMPORAL O DEFINITIVA:

REPARACION PARCIAL:

Personal: \_\_\_\_\_

Recursos Técnicos: \_\_\_\_\_

Recursos económicos: \_\_\_\_\_

REPARACION DEFINITIVA:


Personal: \_\_\_\_\_

Recursos Técnicos: \_\_\_\_\_


Recursos económicos: Recursos Propios \$ 7 458 920

TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION / REHABILITACION: 8 días

CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO: el tiempo de la reparación puede variar dependiendo de la consecución de los repuestos para realizar la reparación.

 <p>F-AC-46 Versión 2 Enero 2018</p>	<p>EMPOCALDAS S.A. E.S.P. SERVICIO DE ACUEDUCTO</p>
	<p>INFORME DE EMERGENCIAS</p>

REGISTRÓ FOTOGRÁFICO Y/O GRAFICO DE LA SITUACION EVALUADA:


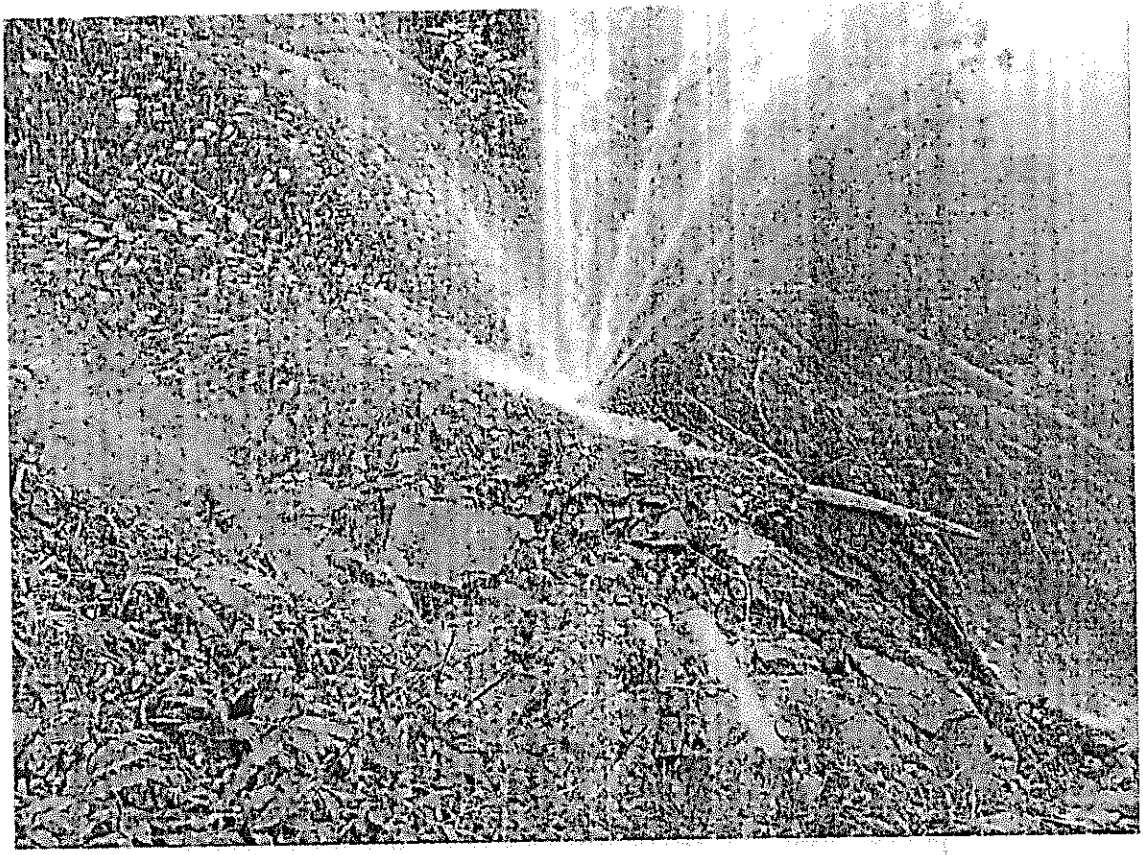





F-AC-46  
Versión 2  
Enero 2018

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

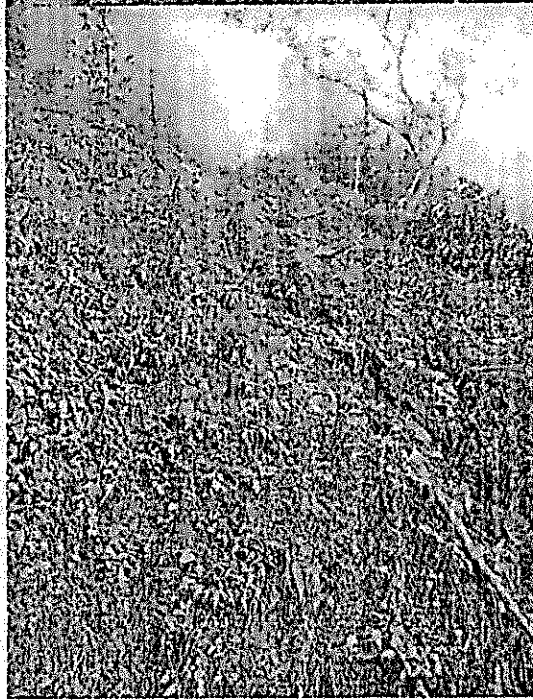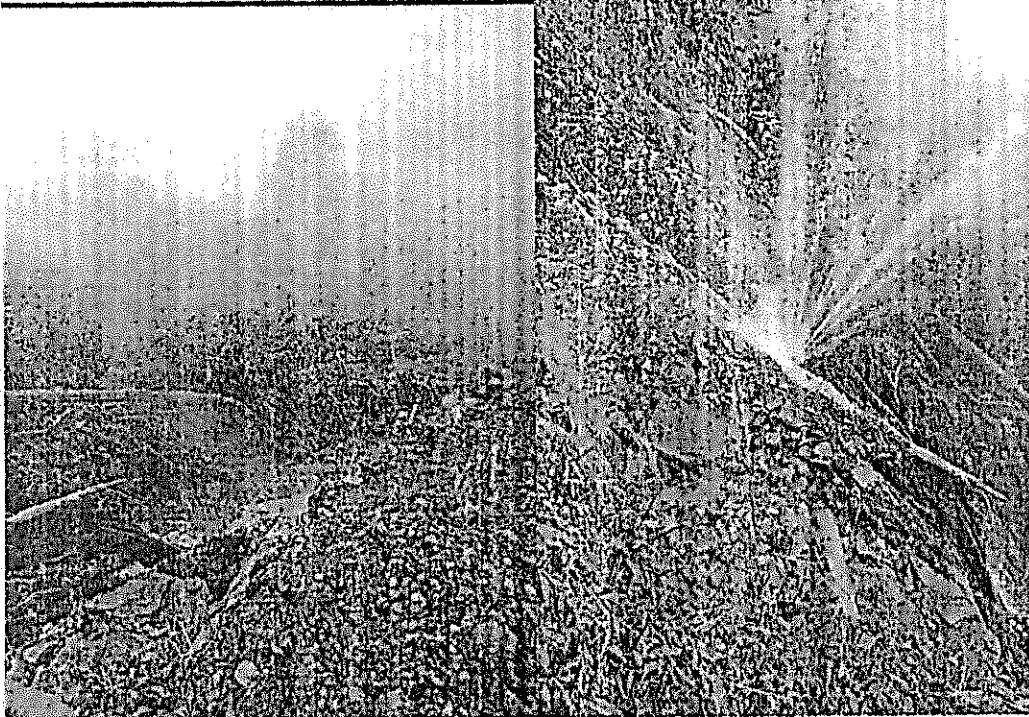

Adriana Carolina Gómez H  
Nombre del Administrador

  
Firma

Marquetalia, Caldas Octubre 26 de 2018

PARA: SERGIO LOPERA  
Jefe Operación y Mantenimiento

DE: ADRIANA CAROLINA GÓMEZ H.  
Administradora Seccional Marquetalia

ASUNTO: REPORTE DE EMERGENCIA

Por medio del presente oficio pongo en conocimiento de ustedes, la emergencia presentada el día de hoy en la seccional de Marquetalia, debido a un deslizamiento que se presentó en un tramo de la conducción San Juan, sector La Quebra, ocasiona ruptura de la tubería, tubería que se encuentra en asbesto cemento, generando esto que la planta quede fuera de servicio, y sea suspende el suministro de agua potable a toda la comunidad del Municipio.

Esperamos contar con su valiosa colaboración.

Atentamente,

ADRIANA CAROLINA GÓMEZ  
Administradora seccional Marquetalia









