

MEMORANDO

MZ-2018-II-00007926

Manzanares, 24 de Septiembre de 2018


PARA: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA, SERGIO HUBERTO LOPERA PROAÑOS

DE: MANZANARES

ASUNTO: Solicitud declaración de emergencia Tanque de Almacenamiento.

Por medio de la presente solicito se declare emergencia en el municipio de Manzanares, por fisuramiento en tanque de almacenamiento de agua potable. Con lo cual se afecta la continuidad del servicio a la población urbana y así poder atender de manera inmediata el suceso y garantizar la continuidad, seguridad y eficiencia en el servicio.

Atentamente,



WEIMAR MUÑOZ LOPEZ  
Administrador

Anexo:  
Copia:

Proyectó: Weimar Muñoz Lopez



F-AC-46  
Versión 2  
Enero 2018

EMPOCALDAS S.A E.S.P  
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: MANZANARES Fecha del informe: 22-09-2018

EVENTO: Fisuramiento del tanque de almacenamiento de agua potable por asentamiento del terreno.

FECHA: 22-09-2018 HORA: 09:00

COMPONENTE AFECTADO: TANQUE DE ALAMCENAMIENTO DE AGUA POTABLE

DESCRIPCION DEL DAÑO: En el tanque de almacenamiento de agua potable localizado en el sector San Luis Cra 1 entre Cl 4 y 5, se presentó asentamiento en el terreno ocasionando fisuramiento en las paredes del tanque, generando fugas de agua con afloramiento de estas en la parte baja del sitio de ladera sobre la cual está localizado el tanque, los días dieciocho y diecinueve de septiembre se presentaron fuertes precipitaciones en el municipio lo cual pudo haber influido, por ser una área tributaria con altas pendientes que pueden ceder por la saturación del subsuelo.

Estas fisuras están ocasionando inestabilidad en la ladera además de poner en situación de alto riesgo las viviendas ubicadas más abajo por posible deslizamiento, por lo cual solicitamos intervenir lo más pronto posible el daño y garantizar de esta manera la continuidad del servicio.

IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO: Riesgo por deslizamiento y afectación de viviendas y vidas humanas.

REQUERIMIENTOS PARA REPARACION PARCIAL, O TEMPORAL O DEFINITIVA:

REPARACION PARCIAL:

Personal: \_\_\_\_\_

Recursos Técnicos: \_\_\_\_\_

Recursos económicos: \_\_\_\_\_

REPARACION DEFINITIVA:

Personal: \_\_\_\_\_

Recursos Técnicos: \_\_\_\_\_

Recursos económicos: \_\_\_\_\_

TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION / REHABILITACION: Treinta días

CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO: Vía Pavimentada.



REGISTRÓ FOTOGRAFICO Y/O GRAFICO DE LA SITUACION EVALUADA:



F-AC-46  
Versión 2  
Enero 2018


EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

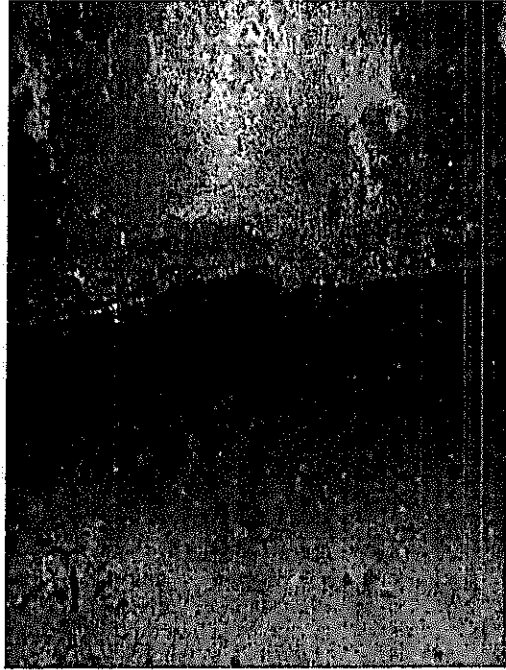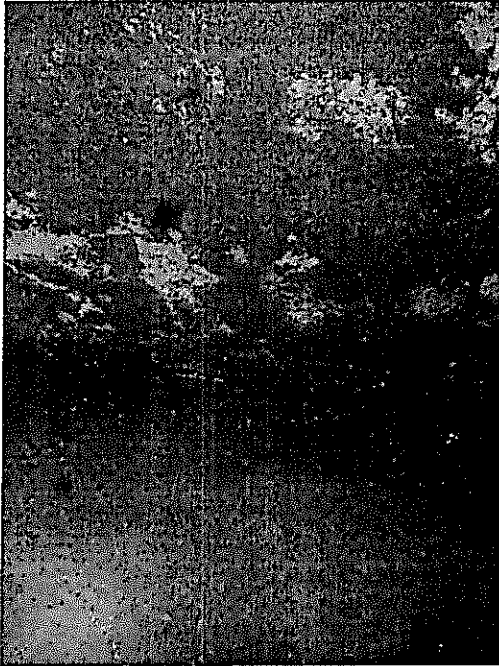


WEIMAR MUÑOZ LOPEZ

Nombre del Administrador

  
Firma



EMPOCALDAS A.S. E.SP.					
suministros Emergencia en el municipio de Manzanares Caldas Modificaciones redes de conexión planta a tanques					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
	<b>GRUPO I</b>				
1	Tee 8 x 3" HD JH	un	1	322.050	322.050
2	Tee 10 x 6" HD JH	un	2	912.000	1.824.000
3	Codo de 6 x 90 HD JH	un	2	188.100	376.200
4	Codo de 3 x 90 HD JH	un	1	54.720	54.720
5	Valvula de compuerta elastica JH diámetro 6"	un	2	512.500	1.025.000
6	Valvula de compuerta elastica JH diámetro 10"	un	1	1.470.000	1.470.000
7	Uniones universales R1 R1 Diámetro 10"	un	6	243.000	1.458.000
8	Uniones universales R1 R1 Diámetro 6"	un	2	96.000	192.000
9	Uniones universales R1 R1 Diámetro 8"	un	2	141.000	282.000
10	Uniones universales R1 R1 Diámetro 3"	un	1	51.000	51.000
11	Adaptador Brida de Diámetro 10"	un	1	345.000	345.000
12	Adaptador Brida de Diámetro 8"	un	3	141.000	423.000
13	Bridas locas metalicas diámetro 10"	un	1	96.000	96.000
14	Bridas locas metalicas diámetro 8"	un	3	51.000	153.000
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>8.071.970</b>
	<b>IVA 19%</b>				<b>1.533.674</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>9.605.644</b>


  
 Sergio Humberto Lopera Proaños
   
 Jefe Depto. de Operación y Mantenimiento
