

BELALCAZAR CALDAS, 19 FEBRERO 2.018

DOCTOR:

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

GERENTE GENERAL


EMPOCALDAS S.A. E.S.P

MANIZALES.


ASUNTO: DECLARATORIA EMERGENCIA ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE.

Muy respetuosamente me dirijo a usted con el fin de solicitarle la declaratoria de emergencia por daño en el acueducto REGIONAL DE OCCIDENTE, sector el crucero y parte baja de la Vereda la habana por colapso de tubería PF DE 6 PGD DEBIDO AL ACENTAMIENTO DEL TERRENO EN DICHS SECTORES, afectando el suministro de agua potable a toda la población del MUNICIPIO DE BELALCAZAR CALDAS Y LAS VEREDAS LA HABANA - SAN ISIDRO Y LOS SECTORES DEL CRUCERO Y EL MAPA.

Cordial Saludo:



JOSE FABIO ALARCON SALAZAR
ADMINISTRADOR BELALCAZAR CDS.

 F-AC-46 Versión 2 Enero 2017	EMPOCALDAS S.A.E.S.P SERVICIO DE ACUEDUCTO
	INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: BELALCAZAR CALDAS Fecha del Informe: 19-FEBRERO 2.018

EVENTO: TUBERIA COLAPSADA POR ACENTAMIENTO DEL TERRENO

FECHA: 18-02-2.018 HORA: 4+30 PM

COMPONENTE AFECTADO: TUBERIA PN DE 6 PGD -SECTOR EL CRUCERO ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE.

DESCRIPCION DEL DAÑO: TUBERIA PF DE 6 PGD-PN 12.5 EXPLOTADA POR ACENTAMIENTO DEL TERRENO

IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO: DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A TODA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE BELALCAZAR CALDAS .

REQUERIMIENTOS PARA REPARACION PARCIAL, O TEMPORAL O DEFINITIVA:

REPARACION PARCIAL:

Personal: 3 TRABAJADORES

Recursos Técnicos: SOLDADURA ADAPTADOR BRIDA PARA MEJOR AGARRE-ANCLAJES-TERMO FUSION

Recursos económicos: \$1.400.000 PESOS MONEDA LEGAL Y CORRIENTE

REPARACION DEFINITIVA:

Personal: CONTRATISTA

Recursos Técnicos: ANEXO PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE

Recursos económicos: \$107.090.667 PESOS MONEDA LEGAL Y CORRIENTE


TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION / REHABILITACION: 15 DIAS

CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO:


REGISTRÓ FOTOGRAFICO Y/O GRAFICO DE LA SITUACION EVALUADA:

JOSE FABIO ALARCON SUAREZ

Nombre del Administrador


 Firma

FOTOS BELALCAZAR

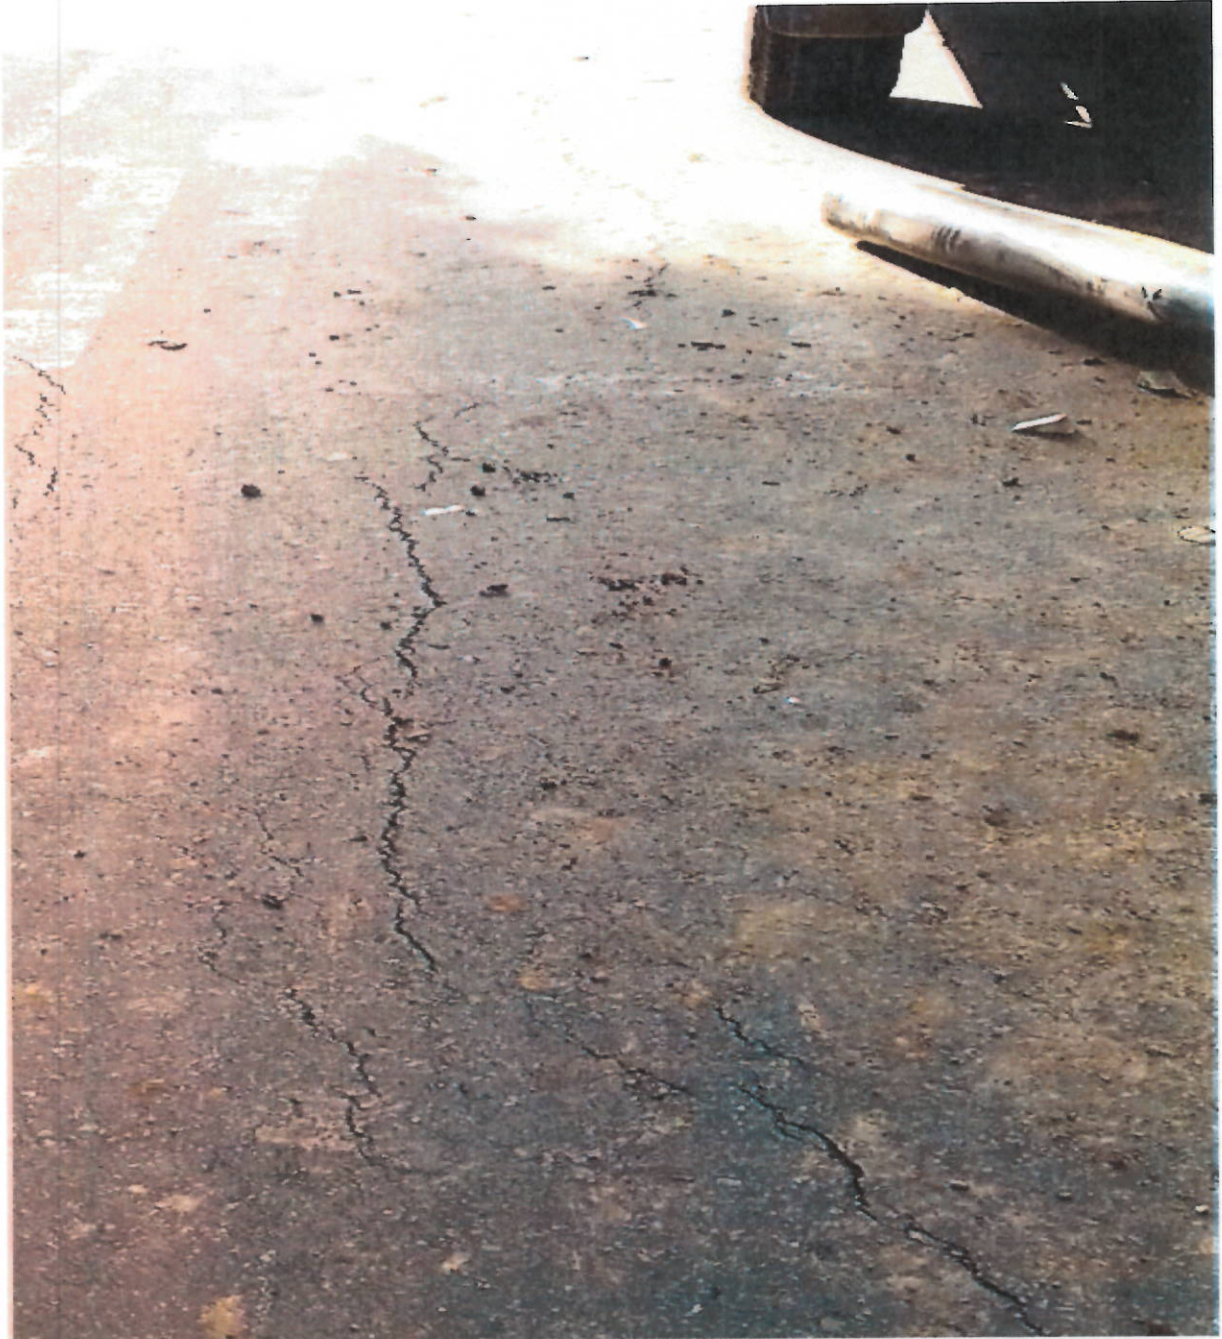











EMPOCALDAS A.S. E.SP.					
Cambio red acueducto por emergencia sector la yee frente a la escuela en el municipio de Belalcazar Caldas					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES				
2	Localización y replanteo (Incluye plano record)	Gl	1,00	25.000	25.000
3	EXCAVACION				
4	Termino fusión de tubería de 8" incluye transporte de maquinaria desde Chichnina ida y regreso	Un	1,00	425.000	425.000
5	Empalme atubería existente	Un	1,00	300.000	300.000
6	Aclaje de tubería	Un	1,00	250.000	250.000
7	Alargamiento de adaptador brida con soldadura para mejor agarre	un	1,00	400.000	400.000
COSTO TOTAL					1.400.000
					1.400.000
Costo unitario					1.076.923
Administración					20% 215.385
Imprevistos					5% 53.846
Utilidad					5% 53.846
Costo Total					1.400.000

SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
JEFE DEPTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
